

"十三五"职业教育规划教材

高职高专土建专业"互联网+"创新规划教材




第二版


建筑工程资料管理

孙 刚 刘志麟◎主编

- 运用"互联网+"思维,助力教学改革。
- 依据最新工程资料管理标准,接轨资料管理岗位职能●









第二版

建筑工程资料管理

主 编◎孙 刚 刘志麟副主编◎姜爱玲 邵 慧参 编◎王玉梅 张 怡 丁元余 刘丰贤主 审◎张卫东 申永俊



内容简介

本书主要根据《建筑工程资料管理规程》(JGJ/T 185—2009),并参考《建筑工程监理规范》(GB/T 50319—2013)、《建设工程项目管理规范》(GB/T 50326—2013)、《建设工程文件归档整理规范》(GB/T 50328—2014)等系列规范、标准编写,力求生动系统地反映工程资料管理的相关理论知识,特别适合从事工程资料管理的人员使用。全书共分6章、分别为建筑工程资料管理人门、工程准备阶段文件编制与整理、工程监理资料编制与整理、施工资料编制与整理,工程被工验效资料编制与整理、工程资料管理现代化。

本书提供了工程建筑全寿命周期形成的工程资料统览,为继续进行工程管理、工程监理、工程监价、 工程施工等方向课程的高职高专学生打下坚实基础,本书也可供建设单位、施工单位、监理单位的专业技 术人员参考使用.

图书在版编目(CIP)数据

建筑工程资料管理/孙刚, 刘志麟主编. — 2 版. —北京;北京大学出版社, 2018. 3 (高职高专土建专业"互联网+"创新规划教材) ISBN 978-7-301-29210-5

I. ①建… Ⅱ. ①孙… ②刘… Ⅲ. ①建筑工程—技术档案—档案管理—高等职业教育—教材 Ⅳ. ①G275.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 026290 号

书 名 建筑工程资料管理(第二版)

JIANZHU GONGCHENG ZILIAO GUANLI

著作责任者 孙 刚 刘志麟 主编

策划编辑 杨星璐

责任编辑 商武瑞 杨星璐

数字编辑 刘 蓉

标准书号 ISBN 978-7-301-29210-5

出版发行 北京大学出版社

地 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址 http://www.pup.cn 新浪微博;@北京大学出版社

电子信箱 pup_6@163.com

印刷者

经 销 者 新华书店

787 毫米×1092 毫米 16 开本 20.75 印张 498 千字

2012年1月第1版

2018年3月第2版 2018年3月第1次印刷

定 价 47.00元

未经许可。不得以任何方式复制或抄费本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup. pku. edu. cn 图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话: 010-62756370 《建筑工程资料管理》第一版自发行以来,深受广大读者的好评,随着新规范、新标准《建筑工程文件归档整理规范》(GB/T 50328—2014)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2013)、《建筑工程监理规范》(GB/T 50319—2013)等一系列文件的发布和实施,教材修订势在必行。本次修订,保留了以下的优势。

- 1. 以工程项目为背景,引导学习者模拟资料员进行资料管理。
- 2. 虚拟工作任务,将应知和应会的知识要点有机地融合在 工程实例中,使读者深入地了解资料的分类、整理、使用、归 档及移交等全过程。明确工程资料管理是工程项目建造质量的 佐证。
- 3. 推荐阅读资料和思考题训练学习者运用信息服务工程实际的能力,提高分析问题、解决问题的能力。

第二版在前版的基础上进行了全新修订,并在内容和展现 形式上做到了创新,具体体现在以下几方面。

- 新增二维码扫描功能,使大量信息隐藏于后台,既减少 了书本厚度又拓展了知识内容,使学习不再枯燥。
- 2. 规范或标准中的规定表格、空白表格与填写示例交叉出现, 使读者明确工程资料管理的要点。
- 3. 增设建筑工程各阶段形成的工程资料管理导图(网络图)使工作任务更明确,利于读者更快地建立工程资料管理理设体系。
- 4. 将节能技术、设备工程、绿色建筑、智慧建造等建筑新 技术有机地渗透在工程资料管理中。
- 本书由日照职业技术学院孙刚、刘志麟担任主编,济南工程职业技术学院张卫东教授、日照市建设工程标准定额管理站高级工程师申永俊担任主审,日照职业技术学院姜爱玲、山东水利职业学院邵慧担任副主编,聊城高级工程职业学校王玉梅、黑龙江建筑职业技术学院张怡、日照市建设工程质量监督站丁元余、日照市河山中心学校刘丰贤参编。







本书具体编写分工如下:第1、2章由孙刚编写,第3.1、 3.2 节由张怡编写, 第 3.3、3.4 节由王玉梅编写, 第 3.5、3.6 节 由邵慧编写,第4、5章由刘志麟编写,第6.1、6.2节由丁元余 编写,第63节由姜爱珍编写,书中图表绘制和编写由刘丰贤 完成。全书由孙刚统稿并定稿。

本书在修订过程中参考了大量文献,在此向相关作者表示 衷心的感谢。修订过程中尽管力求精细,但书中依然会有疏漏 不当之处, 恳请广大读者批评指正。 进版港地域

编 者 2017年8月




目 录

第	1章	建筑工程资料管理入门	1
	1.1	建筑工程资料及分类	3
	1.2	建筑工程资料管理及质量要求	18
	1.3	资料员岗位工作要求	22
	1.4	工程资料整理与组卷	27
	1.5	建筑工程资料验收、移交与归档	39
第2		工程准备阶段文件编制与整理	47
	2.1	立项文件	50
	2.2	建设用地文件	
	2.3	勘察设计文件	
	2.4	招标投标文件	
	2.5	开工审批文件	
	2.6	工程造价文件	
	2.7		
		LIEREPIO	
第:	3 章		
	3.1	监理管理文件	70
	3.2	进度控制文件	79
	3.3	质量控制文件	82
	3.4	造价控制文件	94
	3.5		
		监理验收文件	

建筑工程资料管理 (第二版)

第4章	施工资料编制与整理	118
4.1	施工管理资料	119
4.2	施工技术资料	128
4.3	施工测量资料	137
4.4	施工物资资料	148
4.5	施工记录	158
4.6	施工试验及检测报告	180
4.7	施工质量验收资料	192
4.8	竣工验收资料	204
小幺	å	217
第5章	工程竣工验收资料编制与整理	219
5.1	竣工图	221
5.2	竣工验收与备案文件	225
5.3	竣工决算文件	241
5.4	工程影音资料	251
小幺	t	251
第6章		253
6.1	信息化与工程资料管理	256
6.2		274
6.3	智能建筑与资料管理	293
小组	t 37 Y)	
	₩	
少 传又 [<u> </u>	





学习要求

资料员应知	资料员应会	职业素养
1. 工程资料分类方法 2. 工程资料整理技术规则 3. 工程资料管理职责与要求 4. 工程资料管理职责与要求 5. 工程资料验收条件和移交要求 6. 工程资料管理的质量要求 7. 工程资料管理负的工作职责	1. 能及时收集工程资料并科学分类 2. 能按照规范对工程资料组卷 3. 能按标准装订工程资料案卷 4. 能画出工程资料案卷结构图	培养严谨、条理、求真、 务实的工作态度



学习性工作任务

工程背景

日照职业技术学院 10 号教工住宅楼工程,位于日照职业技术学院生活区院内。由日照市建筑规划设计院设计,日照市南湖建筑工程有限公司施工,天元建设监理有限公司监理。

10 号教工住宅楼工程为 6 层框架结构,底层设有高 2.2m 的车库,标准层层高 3.0m,总建筑面积 400m²,建筑总高 17m,每单元 12 户。该工程采用轻质加气混凝土隔墙、外保温,除卧室地面做结构找平外,其余房间铺贴地面砖,内外墙水泥抹灰、剔涂料,工厂定做铝合金双层玻璃平开窗、实木内门和入户防溶门,水、电、碳、卫蓉基本设施配套齐全、电视、网络、电话蒸物能建筑系统宗善。

工作准备

在教师的帮助下,每人准备 A4 活页纸张 20 份,各类工程资料管理空白表格 20 份,其中包括一般住字接建设常用的,各不相同的 B,C 两类表格。图纸 1 套,统一的档案装具 1 个。

工作任务

依据现行的工程资料管理行业标准,结合以上工程背景提供的信息,模拟该建筑工程各建设阶段资料 管理工作内容, 宗成以下任务。

- (1) 制订该工程资料搜集编制整理总体计划。
- (2)按照工程准备阶段文件整理要求、在8张A4纸张的相应位置、分别书写出该工程7类工程准备 阶段文件中的一份文件名称和已知的建设信息。
 - (3) 在 A4 纸张和表格上填写该工程资料的名称。
 - (4) 以小组为单位、对每名学生模拟填写的资料进行分类、编目、组卷和整理、形成一套模拟工程档案。

教学建议

该任务是本课程学习的活动导向,教师在进行课程整体设计和单元设计时要灵活处理,根据本校教学时间安排,灵活布置单元学习任务。建议学生分组学习,贯彻学生为主体,教师为主导,工作任务为导向,可自为载体、理论与实践相结合、学中敲和敞中学的职业教育教学理念,按照资讯、决策、计划、实施、评估,反馈的教学专题,组织教学实施活动。

🔯 引例

教师提供近期在本地区城建档案馆备案的、典型的建筑工程档案实物资料一套。作为学生学习的范本、 供学生观摩、分析、讨论、学习。

建筑工程资料是建设工程合法身份与合格质量的证明文件,是工程竣工交付使用的必备文件,也是对工程进行检查,验收、维修、改建和扩建的原始依据。

息 思考

1.分析该建筑工程的档案资料由哪几部分组成?主要的分部及分項工程有哪些?有无工程分包?分包单位是谁?工程准备阶段文件审批单位有哪些?该工程的主要参建单位有哪些?监理资料有哪些?归树的验收咨辩有哪些?

- 2. 尽可能详细地分析出该工程的工程模况、主要的施工物资材料信息,以及对哪些材料做了检测? 该工程施工段是如何划分的?主要的施工试验项目有哪些?见证取样的项目有哪些?主要的分部工程质量验收的时间等信息。
- 3.分析该工程资料内容,有没有出现质量事故?有没有返工重做或加固问题?有没有停工现象?监理审故有哪些部份或工序?
 - 4. 分析该工程资料的归档管理由几卷组成?案卷题名是什么?该工程单独组卷的项目有哪些?
- 5.分析该工程档案验收与移交、档案移交备案的时间是什么?履行了哪些手续?该工程有没有哪些手续违反政策要求?
 - 6. 系统地梳理该工程档案的编码及组卷方法,画出案卷结构图,用文字评价该案卷的质量。

1.1 建筑工程资料及分类

1.1.1 建筑工程资料与工程档案

1. 建筑工程资料

建筑工程资料是指建筑工程建设过程中形成的各种形式信息记录的统称,分为工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图及工程竣工验收文件5大类,简称工程资料。

- (1) 工程准备阶段文件。是指建设单位在工程建设管理过程中形成的文件。
- (2) 监理文件。是指监理单位在工程设计、施工等监理过程中形成的资料。
- (3) 施工文件。是指施工单位在工程施工管理过程中形成的资料。
- (4)竣工图。是指工程竣工验收后,真实反映建筑工程施工结果的图纸。各项新建、 改建、扩建的工程均须编制竣工图。
- (5) 工程竣工验收文件。是指竣工验收与备案文件、竣工决算文件、工程声像资料等、 其他工程文件 4 类。

2. 建筑工程档案

建筑工程档案是指工程建设过程中直接形成的,具有归档保存价值的工程资料。工程 档案是贯彻执行国家法律法规、国家标准,按照行业标准要求,以及落实地方规章、标准 等前提下,对工程资料进行归类、整理、组卷、归档后的结果。

3. 建筑工程资料与档案的载体形式

建筑工程建设过程中,各种工程建设信息以不同的形式存在,主要有4种载体。

- (1) 纸质载体。以纸张为基础的载体形式。
- (2) 光盘载体。以光盘为基础,利用计算机技术对工程资料进行存储的载体形式。
- (3) 缩微品载体。以胶片为基础,利用缩微技术对工程资料进行保存的载体形式。
- (4) 磁性载体。以磁性记录材料(磁带、磁盘等)为基础,对工程资料的电子文件、声音、图像进行存储的方式。



根据工程资料和档案管理工作需要,工程资料主要采用纸质载体、光盘载体和磁性载体3种形式。工程档案则采用包括缩微品载体在内的上述4种形式。3种形式的工程资料都要在工程建设过程中形成、收集和整理。采用缩微品载体的工程档案,要在纸质载体档案经域建档案馆和有关部门验收合格的前提下,凭城建档案馆发给的"准可微缩证明书"进行微缩制作。

1.1.2 建筑工程资料分类

为便于对建筑工程资料进行管理,一般按照工程文件资料的来源、类别、形成的先后 顺序以及收集和整理单位的不同进行分类。《建设工程文件·J·//持规范》(GB/T 50328—2014) 中,将工程资料分为工程准备阶段文件、能理文件、施工文件、竣工图和竣工验收文件,也称为工程文件;《建筑工程资料管理规程》(JGJ/T 185—2009)将其分为工程准备阶段文件、选理资料、施工资料、竣工图和竣工验收文件。5大类。尽管名称略有差别、实质是一致的、依据《建设工程文件》时期增范》,为便于学习,本书将各类建筑工程密料的分类如下。

1. A 类工程准备阶段文件

工程准备阶段文件分类见表 1-1。

表 1-1 T程准备阶段文件(A 类)

	次 1-1 工程/EB	MINK X IT	/					
	17/1/	保存单位						
3	归档 文章	章设 单(((X	公安计 单位	施工 单位	监理 单位	档案馆		
Al	立项文件							
l	项目建议书批复文件及项目建议书	A				•		
2	可行性研究报告批复文件及可行性研究报告	•				A		
3	专家论证意见、项目评估文件	A				•		
4	有关立项的会议纪要、领导批示	A				•		
A2	建设用地、拆迁文件							
1	选址申请及选址规划意见通知书	A				•		
2	建设用地批准书	A				A		
3	拆迁安置意见、协议、方案等	A				Δ		
4	建设用地规划许可证及其附件	A				•		
5	上地使用证明文件及其附件	A				A		
6	建设用地钉桩通知单	A				A		
A3	勘察、设计文件							
1	工程地质勘察报告	A	•			A		
2	水文地质勘察报告	A	A			A		
3	初步设计文件(说明书)	A	A					

续表

	-		保存单位				
3	HHAN	単位	単位	単位	単位	档案馆	
4	设计方案审查意见	A	•			A	
5	人防、环保、消防等有关主管部 门(对设计方案)审查意见	A	A			•	
6	设计计算书	A	A			Δ	
7	施工图设计文件审查意见	A	A			A	
8	节能设计备案文件	A				A	
A4	招投标文件						
1	勘察、设计招投标文件	A	A				
2	勘察、设计合同	A	1 1			A	
3	施 1.招投标文件	A	100	•	Δ		
4	施工合同	A		A	Δ	A	
5	工程监理招投标文件	A			A		
6	监理合同	A			A	A	
A5	开工审批文件						
1	建设工程规划许可证及其附件	A		Δ	Δ	A	
2	建设工程施工许可证	A		A	A	A	
A6	工程造价文件						
1	T.程投资估算材料	No. N. M.					
2	工程设计概算材料	A					
3	招标控制价格文件	A					
4	合同价格文件	A		A		Δ	
5	结算价格文件	A		A		Δ	
A7	工程建设基本信息						
1	L程概况信息表	A		Δ		A	
2	建设单位工程项目负责人及现场 管理人员名册	•				•	
3	监理单位工程项目总监及监理人 员名册	•			•	•	
4	施工单位 L程项目经理及质量管 理人员名册	A		•		•	

注:表中符号"▲"表示必须归档保存:"△"表示选择性归档保存。

2. B 类监理文件

监理文件分类见表 1-2。



表 1-2 监理文件(B 类)

		保存单位					
No.	归档文件	建设单位	设计 单位	施工 单位	监理 单位	城建 档案第	
B1	监理管理文件						
1	监理规划	A			A	A	
2	监理实施细则	A		Δ	A	•	
3	监理月报	Δ			A		
4	监理会议纪要	A		Δ	A		
5	监理工作日志				A		
6	监理工作总结				A	•	
7	工作联系单	A	-		Δ		
8	监理工程师通知	A		Δ	Δ	Δ	
9	监理工程师通知回复单	A		Δ	Δ	Δ	
10	工程暂停令	A		Δ	Δ	A	
11	工程复工报审表	A		A	A	A	
B2	进度控制文件						
1	1.程开工报审表	A		A	A	•	
2	施工进度计划报审表	A		Δ	Δ		
В3	质量控制文件						
1	质量事故报告及处理资料	A		A	A	A	
2	旁站监理记录	Δ		Δ	A		
3	见证取样和送检人员备案表	A		A	A		
4	见证记录	A		A	A		
5	L程技术文件报审表			Δ			
B4	造价控制文件						
1	工程款支付	A		Δ	Δ		
2	工程款支付证书	A		Δ	Δ		
3	L程变更费用报审表	A		Δ	Δ		
4	费用家赔申请表	A		Δ	Δ		
5	费用索赔审批表	A		Δ	Δ		
B5	工期管理文件						
1	L程延期申请表	A		A	A	•	
2	L程延期审批表	A			A	•	
B6	监理验收文件						
1	竣工移交证书	A		A	A	A	
2	监理资料移交书	A			A		

注:表中符号"▲"表示必须归档保存;"△"表示选择性归档保存。

3. C 类施工文件

施工文件分类见表 1-3。

表 1-3 施工文件(C 类)

_	表 1-3 施工文件(C 类)								
(t)	7 (* t)	单位	単位	保存单位 単位	- 単位	档案			
C1	施工管理文件								
1	工程概况表	A		A	A				
2	施工现场质量管理检查记录			Δ	Δ				
3	企业资质证书及相关专业人员岗位 证书	Δ		14.	Δ	Δ			
4	分包单位资质报审表	A		A	•				
5	建设单位质量事故勘查记录		11	A	A				
6	建设工程质量事故报告书	A	NE	A	•				
7	施工检测计划	Δ		Δ	Δ				
8	见证试验检测汇总表	A		A	A				
9	施工日志。\ 、、 、		.5%	A					
C2	施工技术文件								
1	工程技术文件报审表 "	Δ	14 -	Δ	Δ				
2	施工组织设计及施工方案	- 1	1	Δ	Δ				
3	危险性较大分部分项工程施工方案			Δ	Δ				
4	技术父底记录	Δ		Δ					
5	图纸会审记录	•	A	A	•	•			
6	设计变更通知单	A	A	A	•				
7	工程洽商记录(技术核定单)	A	A	A	•	A			
C3	进度造价文件								
1	工程开工报审表	•	A	A	A				
2	工程复工报审表	A	A	A	•	•			
3	施工进度计划报审表			Δ	Δ				
4	施工进度计划			Δ	Δ				
5	人、机、料动态表			Δ	Δ				
6	工程延期申请表	•		A	A	A			
7	□程款支付申请表	•		Δ	Δ				
8	工程变更费用报审表	•		Δ	Δ				
9	费用索赔申请表	_		Δ	Δ				



结表

	1	Y)			
	N 1	単位	単位	单位	单位	档案
C4	施工物资出厂质量证明及进场检测					
-	文件					
	出厂质量证明文件及检测报告			_		
1	砂、石、砖、水泥、钢筋、隔热保温、 防腐材料、轻骨料出厂证明文件	•		A	•	Δ
2	其他物资出厂合格证、质量保证书、 检测报告和报关单或商检证等	Δ		. *	Δ	
3	材料、设备的相关检验报告、型式检测报告、3C强制认证合格证书或3C标志	Δ	11	3 · A	Δ	
4	主要设备、器具的安装使用说明书	•		A	Δ	
5	进口的主要材料设备的商检证明文件	10,0	1	A		
6	涉及消防、安全、卫生、环保、节能 的材料、设备的检测报告或法定机构 出具的有效证明文件	A		•	•	Δ
7	其他施工物资产品合格证、出厂检验 报告					
	进场检验通用表格	200				
1	材料、构配件进场检验记录			Δ	Δ	
2	设备开箱检验记录			Δ	Δ	
3	设备及管道附件试验记录	A		A	Δ	
	进场复试报告					
1	钢材试验报告	A		A	A	A
2	水泥试验报告	A		A	A	A
3	砂试验报告	A		A	A	•
4	碎(卵)石试验报告	A		A	A	A
5	外加剂试验报告	Δ		A	A	A
6	防水涂料试验报告	A		A	Δ	
7	防水卷材试验报告	A		A	Δ	
8	砖(砌块)试验报告	A		A	A	A
9	预应力筋复试报告	A		A	A	•
10	预应力锚具、夹具和连接器复试报告	A		A	A	•
11	装饰装修用门窗复试报告	A		A	Δ	
12	装饰装修用人造木板复试报告	A		A	Δ	

						失化	
-			保存基础				
	1	单位	単位	单位	单位	档案馆	
13	装饰装修用花岗石复试报告	A .		A	Δ		
14	装饰装修用安全玻璃复试报告	A		A	Δ		
15	装饰装修用外墙面砖复试报告	A		A	Δ		
16	钢结构用钢材复试报告	A		A	A	A	
17	钢结构用防火涂料复试报告	A		A	A	A	
18	钢结构用焊接材料复试报告	A		A	A	A	
19	钢结构用高强度大六角头螺栓连 接副复试报告	A	_/	. (4)	A	A	
20	钢结构用扭剪型高强螺栓连接副复 试报告	A		A	A	•	
21	幕墙用铝塑板、石材、玻璃、结构胶 复试报告	A		•	A	A	
22	散热器、供暖系统保温材料、通风与 空调工程绝热材料、风机盘管机组、 低压配电系统电缆的见证取样复试 报告	•		•	•	•	
23	节能工程材料复试报告	A .		A		A	
24	其他物资进场复试报告	200					
C5	施工记录文件						
1	隐蔽工程验收记录			A		A	
2	施工检查记录			Δ			
3	交接检查记录			Δ			
4	工程定位测量记录	A		A	_	A	
5	基槽验线记录	A		A	A	A	
6	楼层平面放线记录			Δ	Δ	Δ	
7	楼层标高抄测记录			Δ	Δ	Δ	
8	建筑物垂直度、标高观测记录	A		A	Δ	Δ	
9	沉降观测记录	A		A	Δ	A	
10	基坑支护水平位移监测记录			Δ	Δ		
11	桩基、支护测量放线记录			Δ	Δ		
12	地基验槽记录	A	A	A	A	A	
13	地基钎探记录	A		Δ	Δ	A	
14	混凝土浇灌申请书			Δ	Δ		
15	预拌混凝 土运输单			Δ			

At to

						续表		
	1	保存单位						
		単位	单位	单位	单位	档案馆		
16	混凝土开盘鉴定			Δ	Δ			
17	混凝 上拆模申请单			Δ	Δ			
18	混凝土预拌测温记录			Δ				
19	混凝上养护测温记录			Δ				
20	大体积混凝土养护测温记录			Δ				
21	大型构件吊装记录	•		Δ	Δ	A		
22	焊接材料烘焰记录			Δ				
23	地下工程防水效果检查记录	A	/	· 70	Δ			
24	防水工程试水检查记录	A	1/1	Δ	Δ			
25	通风(烟)道、垃圾道检查记录	A		Δ	Δ			
26	预应力筋张拉记录	A `	1	A	Δ	•		
27	有黏结预应力结构灌浆记录	•		A	Δ	A		
28	钢结构施工记录	· •		A	Δ			
29	网架(索膜)施工记录	•		•	Δ	A		
30	木结构施 I 记录	A	1.1	. 🛦	Δ			
31	幕墙注股检查记录	A :	1 17		Δ			
32	自动扶梯、自动人行道的相邻区域检 查记录	A		•	Δ			
33	电梯电气装置安装检查记录	A		A	Δ			
34	自动扶梯、自动人行道电气装置检查 记录	•		•	Δ			
35	自动扶梯、自动人行道整机安装质量 检查记录	•		•	Δ			
36	其他施工记录文件							
C6	施工试验记录及检测文件							
	通用表格							
1	设备单机试运转记录	A		A	Δ	Δ		
2	系统试运转调试记录	A		A	Δ	Δ		
3	接地电阻测试记录	A		A	Δ	Δ		
4	绝缘电阻测试记录	A		A	Δ	Δ		
	建筑与结构工程							
1	错杆试验报告	A		A	Δ	Δ		
2	地基承载力检验报告	•		A	Δ	A		
3	桩基检测报告			A	Δ	A		

续表

		保存单位						
-		Y						
**		单位	单位 单位	单位	档案馆			
4	上工击实试验报告	A	A	Δ	A			
5	回填土试验报告(应附图)	A	A	Δ	A			
6	钢筋机械连接试验报告	A	A	Δ	Δ			
7	钢筋焊接连接试验报告	A	A	Δ	Δ			
8	砂浆配合比申请书、通知单		Δ	Δ	Δ			
9	砂浆抗压强度试验报告	A	A	Δ	A			
10	砌筑砂浆试块强度统计、评定记录	A	A		Δ			
- 11	混凝土配合比申请书、通知单	A	Δ	Δ	Δ			
12	混凝上抗压强度试验报告	A	A	Δ	A			
13	混凝 1.试块强度统计、评定记录	A	A	Δ	Δ			
14	混凝 1.抗渗试验报告	A	A	Δ	Δ			
15	砂、石、水泥放射性指标报告	A	A	Δ	Δ			
16	混凝土碱总量计算书	A	A .	Δ	Δ			
17	外墙饰面砖样板黏结强度试验报告	A	A	Δ	Δ			
18	后置埋件抗拔试验报告	A	A	Δ	Δ			
19	超声波探伤报告、探伤记录	A	A	Δ	Δ			
20	钢构件射线探伤报告	A .	A	Δ	Δ			
21	磁粉探伤报告	A	A	Δ	Δ			
22	高强度螺栓抗滑移系数检测报告	A	A	Δ	Δ			
23	钢结构焊接工艺评定		Δ	Δ	Δ			
24	网架节点承载力试验报告	A	A	Δ	Δ			
25	钢结构防腐、防火涂料厚度检测报告	A	A	Δ	Δ			
26	木结构胶缝试验报告	A	A	Δ				
27	木结构构件力学性能试验报告	A	A	Δ	Δ			
28	木结构防护剂试验报告	A	A	Δ	Δ			
29	幕墙双组分硅酮结构胶混匀性及拉	A		Δ	Δ			
	斯试验报告							
30	幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、 雨水渗透性能及平面内变形性能检 测报告	•	•	Δ	Δ			
31	外门窗的抗风压性能、空气渗透性能 和雨水渗透性能检测报告	•	A	Δ	Δ			
32	墙体节能工程保温板材与基层黏结 强度现场拉拔试验	•	•	Δ	Δ			

						续表
pun-	1					
8.0	-T T	单位	単位	単位	单位	档案馆
	外墙保温浆料。可条件养护试件试验	±177	丰地	±177	+17	739816
33	报告	A		•	Δ	Δ
34	结构实体混凝土强度验收记录	A	-	A	Δ	Δ
35	结构实体钢筋保护层厚度验收记录	A		A	Δ	Δ
36	围护结构现场实体检验	A		A	Δ	Δ
37	室内环境检测报告	A		A	Δ	Δ
38	节能性能检测报告	A		A	Δ	A
39	其他建筑与结构施工试验记录与检 测文件					
	给水排水及供暖工程					
1	灌(满)水试验记录	A		Δ	Δ	
2	强度严密性试验记录	A		A	Δ	Δ
3	通水试验记录	A		Δ	Δ	
4	冲(吹)洗试验记录	A		A	Δ	
5	通球试验记录	A		Δ	Δ	
6	补偿器安装记录			Δ	Δ	
7	消火栓试射记录	A		A	Δ	
8	安全附件安装检查记录			A	Δ	
9	锅炉烘炉试验记录			A	Δ	
10	锅炉煮炉试验记录			A	Δ	
11	锅炉试运行记录	A		A	Δ	
12	安全阀定压合格证书	A		A	Δ	
13	自动喷水灭火系统联动试验记录	A		A	Δ	Δ
14	其他给水排水及供暖施工试验记录 与检测文件					
	建筑电气工程					
1	电气接地装置平面示意图表	A		A	Δ	Δ
2	电气器具通电安全检查记录	A		Δ	Δ	
3	电气设备空载试运行记录	A		A	Δ	Δ
4	建筑物照明通电试运行记录	A		•	Δ	Δ
5	大型照明灯具承载试验记录	A		A	Δ	
6	漏电开关模拟试验记录	A		A	Δ	
7	大容量电气线路结点测温记录	A		A	Δ	
8	低压配电电源质量测试记录	A		A	Δ	

维表

		保存单位					
	2.4.6	単位	単位	单位	单位	档案馆	
9	建筑物照明系统照度测试记录			Δ	Δ		
10	其他建筑电气施工试验记录与检测 文件						
	智能建筑工程						
1	综合布线测试记录	A		A	Δ	Δ	
2	光纤损耗测试记录	•		A	Δ	Δ	
3	视频系统未端测试记录	•		A	Δ	Δ	
4	子系统检测记录	A		· A	Δ	Δ	
5	系统试运行记录	A	1/1	A	Δ	Δ	
6	其他智能建筑施工试验记录与检测 文件						
	通风与空调工程						
1	风管漏光检测记录 /	A ,		Δ	Δ		
2	风管漏风检测记录			A	Δ		
3	现场组装除尘器、空调机漏风检测 记录			Δ	Δ		
4	各房间室内风量测量记录	A		Δ	Δ		
5	管网风量平衡记录			Δ	Δ		
6	空调系统试运转调试记录	A		A	Δ	Δ	
7	空调水系统试运转调试记录	A		A	Δ	Δ	
8	制冷系统气密性试验记录	A		A	Δ	Δ	
9	净化空调系统检测记录	A		A	Δ	Δ	
10	防排烟系统联合试运行记录	A		A	Δ	Δ	
11	其他通风与空调施工试验记录与 检测文件						
	电梯工程						
1	轿厢平层准确度测量记录	A		Δ	Δ		
2	电梯层门安全装置检测记录	A		A	Δ		
3	电梯电气安全装置检测记录	A		A	Δ		
4	电梯整机功能检测记录	A		A	Δ		
5	电梯主要功能检测记录	•		A	Δ		
6	电梯负荷运行试验记录	A		A	Δ	Δ	
7	电梯负荷运行试验曲线图表	A		A	Δ		
8	电梯噪声测试记录	Δ		Δ	Δ	1	

At to

						续表		
	保存单位							
	1 4 4	単位	単位	单位	单位	档案的		
9	自动扶梯、自动人行道安全装置检测 记录	A			Δ			
10	自动扶梯、自动人行道整机性能、运 行试验记录	A		A	Δ	Δ		
11	其他电梯施工试验记录与检测文件							
C7	施工质量验收文件							
1	检验批质量验收记录	•		. 4	Δ			
2	分项工程质量验收记录	A		A	A			
3	分部(子分部)工程质量验收记录	A		A	A	•		
4	建筑节能分部工程质量验收记录	•		A	A	•		
5	自动喷水系统验收缺陷项目划分记录	•		Δ	Δ			
6	程控电话交换系统分项工程质量验 收记录	A		A	Δ			
7	会议电视系统分项工程质量验收记录	- 🔺		A	Δ			
8	卫星数字电视系统分项工程 质量验收记录	A			Δ			
9	有线电视系统分项工程质量验收记录	•	M.I.T.	A	Δ			
10	公共广播与紧急广播系统分项工程 质星验收记录			•	Δ			
11	计算机网络系统分项工程质量验收 记录	A		A	Δ			
12	应用软件系统分项工程质量验收记录	•		A	Δ			
13	网络安全系统分项工程质量验收记录	A		A	Δ			
14	空调与通风系统分项工程质量验收 记录	A		A	Δ			
15	变配电系统分项工程质量验收记录	A		A	Δ			
16	公共照明系统分项工程质量验收记录	A		A	Δ			
17	给水排水系统分项工程质量验收记录	A		A	Δ			
18	热源和热交换系统分项 L程质量验 收记录	A		•	Δ			
19	冷冻和冷却水系统分项工程质量验 收记录	•		A	Δ			
20	电梯和自动扶梯系统分项 L程质量 验收记录	•		A	Δ			
21	数据通信接口分项工程质量验收记录	•		A	Δ			

	A	续表 保 存 单 位						
All		单位	単位	* 计 辛 15 单位	单位	档案馆		
22	中央管理工作站及操作分站分项工 程质量验收记录	A		A	Δ			
23	系统实时性、可维护性、可靠性分项 工程质量验收记录	A		•	Δ			
24	现场设备安装及检测分项工程质量 验收记录	•		•	Δ			
25	火灾自动报警及消防联动系统分项 工程质量验收记录	A			Δ			
26	综合防范功能分项工程质量验收记录	A	111	A	Δ			
27	视频安防监控系统分项工程质量验 收记录	•		A	Δ			
28	入侵报警系统分项工程质量验收记录	A		•	Δ			
29	出入口控制(门禁)系统分项工程质。 量验收记录	A		•	Δ			
30	巡史管理系统分项工程质量验收记录	A	il.	A	Δ			
31	停车场(库)管理系统分项工程质量 验收记录	•		•	Δ			
32	安全防范综合管理系统分项工程质 量验收记录	•		•	Δ			
33	综合布线系统安装分项工程质量验 收记录	12		•	Δ			
34	综合布线系统性能检测分项工程质 量验收记录	A		•	Δ			
35	系统集成网络连接分项工程质量验 收记录	•		A	Δ			
36	系统数据集成分项工程质量验收记录	A		A				
37	系统集成整体协调分项工程质量验 收记录							
38	系统集成综合管理及冗余功能分项 工程质量验收记录	•		•	Δ			
39	系统集成可维护性和安全性分项 [程质量验收记录	A		A	Δ			
40	电源系统分项上程质量验收记录	A		•	Δ			
41	其他施工质量验收文件							

645 45

_				保存单位	Ì	失化
All	归档文件	単位	単位	单位	单位	档案馆
C8	施工验收文件					
1	单位(子单位)工程竣工预验收报验表	A		A		A
2	单位(子单位)工程质量竣工验收记录	A	Δ	A		A
3	单位(子单位)工程质量控制资料核查记录	A		•		A
4	单位(子单位) L程安全和功能检验 资料核查及主要功能抽查记录	A		•		•
5	单位(子单位)工程观感质量检查记录	A		A		A
6	施工资料移交书	•		A		
7	其他施工验收文件					

注:表中符号"▲"表示必须归档保存:"△"表示选择性归档保存。

4. D 类竣工图

竣工图分类见表 1-4。

表 1-4 竣工图分类(D 类)

3070	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	建设人	美什 单位	施工 单位	监理 单位	城建 档案馆
1	建筑竣工图			A		
2	结构竣工图	A		A		A
3	钢结构或工图	A		A		A
4	幕墙线工图	A		A		A
5	室内装饰竣工图	A		A		
6	建筑给水排水及供暖竣工图	A		A		A
7	建筑电气竣工图	A		A		A
8	智能建筑竣工图	A		A		•
9	通风与空调竣工图	A		A		•
10	室外工程竣工图	A		A		•
11	规划红线内的室外给水、排水、供热、供 电、照明管线等竣 L图	•		•		•
12	规划红线内的道路、园林绿化、喷灌设施 等竣工图	A		K		

注:表中符号"▲"表示必须归档保存:"△"表示选择性归档保存。

5. E 类工程竣工验收文件

工程竣工验收文件分类见表 1-5。

表 1-5 工程竣工验收文件(E 类)

类加	归 档 文 件	建设单位	设计 单位	施工单位	重理 単位	城建 档案馆	
EI	竣工验收与备案文件	本瓜 本瓜 本瓜 三瓜					
1	勘察单位工程质量检查报告	A			Δ	A	
2	设计单位工程质量检查报告	A	•	Δ	Δ	A	
3	施工单位工程竣工报告	A		A	Δ	A	
4	点理单位 □程质量评估报告	A		Δ	A	A	
5	工程竣工验收报告	A	A	A	A	A	
6	工程竣工验收会议纪要	A	A	A	A	A	
7	专家组竣工验收意见	A	A	A	A	A	
8	L 程竣 L 验收证 书	•	A	A	A	A	
9	规划、消防、环保、民防、防雷等部门出具 的认可文件或准许使用文件	_	A	A	•		
10	房屋建筑工程质量保修书	A				A	
11	住宅质量保证书、住宅使用说明书	A		A		A	
12	建设工种竣工验收备案表	A	A	A	A	A	
13	建设工程档案预验收意见			Δ		A	
14	城市建设档案移交书	A				A	
E2	竣工决算文件						
1	施工决算文件	A		A		Δ	
2	 直理决算文件				A	Δ	
E3	工程声像资料等						
1	开工前原貌、施工阶段、竣工新貌照片	A		Δ	Δ	A	
2	L程建设过程的录音、录像资料(重大 L程)	A		Δ	Δ	A	
E4	其他工程文件						

注:表中符号"▲"表示必须归档保存:"△"表示选择性归档保存。

知识链接

1. 工程资料分类及保存表

《建设工程文件归档规范》(GB/T 50328—2014)中、附录 A 中: 不但明确了各类工程资料的分类,而且还对资料的来源、归档保存单位以及保存期限进行了界定,是工程资料分类保存的主要依据。

2. 建筑工程分部(子分部)工程划分

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2013)中,規定了建筑工程分部(子分部) 工程划分方法,将单位工程分为分部工程、子分部工程、分项工程,明确了各分部工程、 子分部工程和分项工程的名称,是施工资料分类管理的主要依据。

1.2 建筑工程资料管理及质量要求

1.2.1 建筑工程资料管理

1. 建筑工程资料管理的目的及意义

建筑工程资料管理是对建筑工程资料形成过程中各个管理环节的统称,包括工程资料的填写、编制、审核、审批、收集、整理、验收、组卷、移交等环节的管理,简称工程资料管理。建筑工程作为一个工程实体,在建设过程中涉及规划、勘察、设计、施工、监理等各项技术工作,这些在不同阶段形成的工程资料或文件,经过规划、勘察、设计、施工、监理等不同单位相关人员积累、收集、整理,形成具有归档保存价值的工程档案。

建筑工程资料管理是项目管理的一项重要工作,是建筑工程施工管理程序化、规范化和制度化的具体体现,做好建筑工程资料管理工作具有重要意义。首先,建筑工程资料管理是保证工程质量与安全的重要环节。其次、完整、真实、具体、随工程建设进展同步积累完成的工程资料,是竣工验收交付使用的必备条件;一个质量优良或合格的建筑工程必须具有一份内容齐全、文字记载真实可靠的工程资料。最后,建筑工程资料管理工作是工程安全使用和维修维护的保证,工程资料为工程的检查、管理、使用、维护、改造、扩建提供可靠的依据。

2. 建筑工程资料管理的依据

建筑工程资料管理要执行现行的国家法律法规,依据国家、行业标准来进行规范管理,同时还要适应地方法规和标准的要求。在我国,国家立法和验收标准都对工程资料提出了明确的要求,《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《城市建设档案管理规定》等法律法规,《建设工程监理规范》《建筑工程施工质量验收统一标准》《建设工程文件归档规范》等国家标准,均把工程资料与档案管理放在重要位置。

近几年行业管理部门加大了政策指导力度,住房和城乡建设部在总结近年来我国建筑工程档案管理的实践经验,借鉴国际先进科研成果和标准规范的基础上,先后修改和发布了《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》《建筑工程资料管理规程》等部门规章和行业标准,增加、更新了工程资料与档案管理的内容和方法。尤其是随着电子信息技术的发展,建设领域的电子文件与电子档案大量产生并广泛应用,保证信息时代域乡建设活动的真实历史记录长期保存和随时利用,已成为各地建设部门,特别是城建档案管理部门、建设系统各业务管理部门,以及工程建设、施工、勘察设计、监理等单位所面临的。项重要任务,为此,原建设部于 2007 年将电子档案管理纳入了工程资料管理的范围,发布了《建设电子文件与电子档案管理规范》,工程资料管理的着更加科学、更加规范的方向发展。

1.2.2 建筑工程资料管理的质量要求

1. 进行过程控制和同步整理

工程资料管理应建立岗位责任制,进行过程控制。工程资料具有分散性和复杂性等特点,建立不同参建单位的工程资料管理岗位责任制,针对资料形成过程进行控制管理,能有效保证不同建设阶段形成的工程资料收集完整齐全。

工程资料应随工程进度同步收集、整理、组卷,并按规定移交。建筑工程资料产生于建设工程的整个过程,部分文件资料的产生具有规律性,但相当多的文件资料是由具体工程事件引发的,存在很大的随机性;同时,工程建设周期长,资料管理跨度大,对工程资料管理的时效性要求也就非常高,只有随工程进度同步收集、整理、组卷,才能保证工程资料的真实性和有效性。

2. 保证资料真实有效和符合相关要求

- (1)工程资料应保证真实有效,完整齐全,严禁随意修改。全面性和真实性是建筑工程资料的重要特征,工程资料只有全面反映项目的各类信息,真实反映工程情况,包括发生的事故和存在的隐患,才更有实用价值。工程资料的有效性主要是指资料是否经过责任单位及责任人员的签字及盖章确认,包括责任单位及人员要对确认材料的真实性甄别承担责任。
- (2) 工程资料应保证字迹清楚, 图样清晰, 图表整洁。工程资料签字必须使用档案规定用笔, 字迹清晰, 签字、盖章手续要齐全; 计算机形成的工程资料应采用内容打印、手工签名的方式; 所有竣工图均应加盖竣工图章。
- (3) 工程资料应利于长期保存。采用耐久性强的书写材料,如碳素墨水、蓝黑墨水、 不得使用易褪色的书写材料,如红色墨水、纯蓝墨水、则珠笔、复写纸、铅笔等。工程资料用纸应采用能够长期保存的初力大、耐久性强的纸张。图纸 ·般采用蓝陋图,竣工图应 是新蓝图。计算机出图必须清晰,不得使用计算机出图的复印件。
- (4) 工程资料的内容及其深度必须符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程。

3. 原则上使用原件

工程资料应使用原件,当使用复印件时应保证工程资料的可追溯性。因各种原因不能使 用原件时,应在复印件上加盖原件存放单位公章、注明原件存放处,并有经办人签字及时间。

4. 明确资料编者的责任主体

工程物资质量证明文件由采购单位负责,应保证其内容真实有效,完整齐全。

需多方签认的资料应由主要责任单位负责,内容应真实有效,签字盖章应齐全。 5. 进行档案预验收并办理移交手续

工程档案应按法律法规规定进行档案预验收并办理移交手续。备案机关发现建设单位 在竣上验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的,应当在收讫竣工验收备 案文件 15 日內、書令條止使用、重新组织竣工验收。

制作缩微品载体档案需要城建档案管理部门批准并取得准可缩微证明书,证明书包括 案卷目录、验收签章、城建档案馆的档号、胶片代数、质量要求等,并将证书缩拍在胶片 "片头"上。报送微缩制品载体工程竣工档案的种类和数量,一般要求报送二代片。

建筑工程资料管理(第二版)

- (1) 第一代(母片)卷片一套,作长期保存使用。
- (2) 第二代(拷贝片)卷片一套,作复制工作用。
- (3) 第三代(拷贝片)卷片或者开窗卡片、封套片、平片,作提供日常利用(阅读或复原) 使用。

向城建档案馆移交的缩微卷片、开窗卡片、封套片、平片,以及电子工程档案的封套、 格式必须按城建档案馆的要求进行标注。

6. 逐步实行计算机管理

工程资料宜逐步实行计算机管理。宜采用配套软件形成、整理,并逐步过渡到以电子 媒介为基础的存放形式。对于参与各类规范化施工管理及参加政府、社会评优的工程宜采 用光盘、缩微品载体。

采用光盘载体的电子工程档案,首先需要城建档案馆和有关部门对纸质载体的工程档案进行验收;验收合格后,再对电子工程档案进行核查;核查无误后,才能进行电子工程档案的光盘刻制。

知识链接

- 【标准规范】
- (1)《建筑工程資料管理規程》(JGJ/T 185—2009). 住房和城乡建设部于 2009 年 10 月 30 日,以第 419 号公告正式发布《建筑工程资料管理规程》为行业标准,编号为 JGJ/T 185—2009,自 2010 年 7 月 1 日起实施 该规程实施后已成为规范建筑工程资料管理的重要依据
- (2)《建设电子文件与电子档案管理规范》(CJJ/T 117—2017) 住房和城乡建设部第 1519 号公告正式发布《建设电子文件与电子档案管理规范》(以下简称《规范》)为行业标准,编号为 CJJ/T 117—2017, 自 2017 年 10 月 1 日起施行 该《规范》是各单位收集、积累、整理、鉴定、验收、移交电子文件和加强电子档案管理的依据 对于保证建设电子文件与电子档案的真实性、完整性和有效性、保障建设电子文件和电子档案的实金保管与有效开发利用。具有重要的意义

1.2.3 建筑工程资料管理职责

1. 建筑工程资料形成单位的管理职责

建筑工程资料应实行分级管理,由建设、监理、施工等单位项目负责人负责全过程的管理工作,具体职责见表 1-6。

表 1-6 建筑工程资料管理职责划分

责 任 方	序号	建筑工程资料管理职责				
	1	负责收集和汇总勘察、设计、监理、施工等单位组卷归档的工程资料				
建设单位	2	建立工程资料管理制度,并督促工程各参建单位建立资料管理制度,将资料管理纳入工程建设管理的各个环节和各级人员的职责范围				

续表

		续表
责 任 方	序号	建筑工程资料管理职责
		负责基建文件管理,基建文件管理实行建设单位项目负责人负责制,建设单位
	3	应建立基建文件管理制度
		在工程招标及与勘察、设计、施工、监理等单位签订协议、合同时,应对工程
	4	资料的套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求
	5	按《建设工程质量管理条例》规定向有关的勘察、设计、施工、监理等单位抵
	3	供与工程有关的原始资料
v4s 2/L AA 42v	6	对需签认的工程资料及时签署意见
建设单位	7	负责督促检查各参建单位工程资料管理工作, 也可委托监理单位
	8	负责组织竣工图的绘制工作,亦可委托设计单位、监理单位或施工单位
	9	列入城建档案馆接收,在组织工程竣工验收前,提请城建档案馆对工程档案进
	9	行预验收
	01	单位工程验收合格后, 按规定进行竣工备案
	11	组织勘察、设计、监理、施工等有关单位进行工程竣工验收,形成竣工验收支
	11	件,并按规定进行工程档案移交
	1	勘察、设计单位分别负责勘察、设计文件管理、勘察、设计文件管理实行项目
	,	负责人负责制
	2	勘察、设计单位要建立勘察、设计文件管理制度
勘察、设计单位	3	勘察单位要提供工程地质、水文地质勘察报告,进行工程勘察交底,出具竣工
		质量检查报告并参与工程验收
	4	设计单位要提供工程设计文件,进行工程设计交底,参与图纸会审,提出设计
		变更市核工程洽商文件,出具竣工质量检查报告并参与工程验收
	1	负责益理资料管理,实行总监理工程师负责制
	2	要建立监理资料管理制度
监理单位	3	依据合同约定,在施工阶段对施工技术资料的形成、积累、组卷和归档进行出
		督、检查,使施工资料的真实性、完整性和准确性符合有关要求
	4	在 工程竣工验收前,负责提供合格、完整的监理资料,并提供工程质量评估报
		告
	1	负责施工资料管理,实行项目经理负责制
	2	建立施工资料管理制度
11 12.41		建筑工程实行总承包的,施工总承包单位对施工资料总体负责,专业承包单位
施工单位	3	对承包范围内的施工资料负责。专业承包单位将承包范围内的施工资料收集
		整理、组卷后移交施工总承包单位,由施工总承包单位汇总后移交建设单位
	4	在工程竣工验收前,将工程的施工技术资料整理、汇总、组卷、并按合同约员
		数量编制成一套完整的施工技术资料,移交建设单位,自行保存一套
Left with and with facts	1	城建档案馆负责全市城建档案的管理,对建设系统列入城建档案业务范围的单位和部门的城建档案工作进行业务指导、监督和检查
城建档案馆		
	2	协调和组织全市地下管线普查,接收和编制地下管网图并进行动态管理工作

责 任 方	序号	建筑工程资料管理职责
	3	负责工程项目竣工档案的验收
	4	负责统筹规划建设信息系统的建设、业务指导及运行管理工作
	5	接收和保管应当永久和长期保管的各种载体的城建档案、资料
城建档案馆	6	对接收进馆的城建档案、资料实行科学管理、安全保护和为社会提供利用服务
规建作来的	7	广泛征集城市建设、管理中形成的各种载体的历史档案、资料, 开展城建年鉴、 史志编辑、档案专题编研
	8	拍摄编辑反映城市建设历史及城市建设新貌的声像专题片,宣传城市建设成就 和建设战线精神文明风貌

2. 资料员的管理职责

资料管理工作主要包括工程资料的收集、积累、整理、立卷、验收与移交,各单位有资料员负责,其中施工资料员管理职责见表 1-7。

表 1-7 施丁资料品的管理职表

		A I-I WELLTHAM I BEING
分 类	序号	主要管理职责
Mr And A Loui Art with	1	协助制定施工资料言理证划
资料计划管理	2	协助建立施工资料管理规章制度
2 for shot ald a 480 mile will	1	负责建立施工资料收集台账,进行施工资料交底
资料收集整理	2	负责施工资料的收集、审查及整理
	1	负责施工资料的往来传递、追溯及借阅管理
资料使用保管	2	负责提供管理数据、信息资料
	1	负责施工资料的立卷、归档
资料归档移交	2	负责施工资料的封存和安全保密工作
	3	负责施工资料的验收与移交
资料信息系统	1	参与建立施上信息管理系统
管理	2	负责施工信息管理系统的运用、服务和管理

1.3 资料员岗位工作要求

1.3.1 资料员的基本要求

资料员是施工企业八大员(施工员、质量员、标准员、机械员、劳务员、安全员、材料

员、资料员)之 · 。 · 个建设工程的质量具体反映在建筑物的实体质量,即硬件;此外是该项工程技术资料质量,即软件。 L程资料的形成主要靠资料员的收集、整理、编制成册,因此资料员在施工过程中担负着十分重要的责任。

要当好资料员除了要有认真、负责的工作态度外,还必须了解建设工程项目的工程概况,熟悉本工程的施工图、施工基础知识、施工技术规范、施工质量验收规范、建筑材料的技术性能、质量要求及使用方法,以及有关政策、法规和地方性法规、条文等;要了解施工管理的全过程,掌握每项资料在什么时候产生。

知识链接

施工资料员应具备的理论知识见表 1-8

表 1-8 施工资料员的理论知识

分 类	序号	理论知识
	1	熟悉﹐考家工程建设相关法律法规
	2	了解工程材料的基本知识
通用知识	3	熟悉施工图绘制、识读的基本知识
	4	了解工程的施工工艺和方法
	5	熟悉工程项目管理的基本知识
	1	了解建筑构造、建筑设备及工程预算的基本知识
基础知识	2	掌握计算机和相关资料管理软件的应用知识
	3	掌握文秘、公文写作基本知识
	1	熟悉与本岗位相关的标准和管理规定
MI AL LIN HE	2	熟悉工程竣工备案的管理知识
岗位知识	3	掌握城建档案管理、施工资料管理及建筑业统计的基础知识
	4	掌握资料安全管理知识
水平雪 自己的 实际产 识:		将专业知识的认知目标分为"了解""熟悉""掌握"3 梓层次。"掌握"是最高 求、包括:方面含义: 是能记忆,即能陈述所列知识; 是能转换,即能用 语言对所列知识加以叙述和概括: 是能运用,即能应用所列知识分析和解决 题。"熟悉"是次高水平要求,包括两方面含义: 是能记忆,即能陈述所列知 是能转换,即能用自己的语言对所列知识加以叙述和概括。"了解"是最低水平 其內涵是对所列知识有一定的认识和记忆

1.3.2 资料员的工作职责

资料员负责工程项目的资料档案管理、计划、统计管理及内业管理工作。

- 1. 负责工程项目资料、图纸等档案的收集、管理
- (1) 负责工程项目所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理的工作,在收到



工程图纸并进行登记以后,按规定向有关单位和人员签发,由收件方签字确认。负责收存全部工程项目图纸,且每一项目应收存不少于两套正式图纸,其中至少一套图纸有设计单位图纸专用章。竣工图采用散装方式折叠,按资料目录的顺序,对建筑平面图、立面图、剖面图、建筑详图、结构施工图等建筑工程图纸进行分类管理。

(2) 收集整理施工过程中所有技术变更、治商记录、会议纪要等资料并归档。负责对每日收到的管理文件、技术文件进行分类、登录、归档。负责项目文件资料的登记、受控、分办、催办、签收、用印、传递、立卷、归档和销毁等工作。负责做好各类资料积累、整理、处理、保管和归档立卷等工作,注意保密的原则。来往文件资料收发应及时登记台账,视文件资料的内容和性质准确及时递交项目经理批阅,并及时送有关部门办理。确保设计变更、治商的完整性,要求各方严格执行接收手续,所接收到的设计变更、治商,须经各方签字确认,并加盖公章。设计变更(包括图纸会审纪要)原件存档。所收存的技术资料须为原件、无法取得原件的,应详细备注,并加盖公章。做好信息收集、汇编工作,确保管理目标的个前实现。

2. 参加分部分项工程的验收工作

- (1)负责备案资料的填写、会签、整理、报送、归档,负责工程备案管理,实现对竣工验收相关指标(包括质量资料审查记录、单位工程综合验收记录)做备案处理。对桩基工程、基础工程、主体工程、结构工程备案资料核查。严格遵守资料整编要求,符合分类方案、编码规则,资料份数应满足资料存档的需要。
 - (2) 监督检查施工单位施工资料的编制、管理,做到完整、及时,要与工程进度同步。 对施工单位形成的管理资料、技术资料、物资资料及验收资料,按施工顺序进行全程督查, 保证施工资料的真实性、完整性、有效性。
 - (3) 按时向建设单位档案室移交有关资料。在工程竣工后,负责将文件资料、工程资料立卷移交建设单位。文件材料移交与归档时,应有"归档文件材料交接表",交接双方必须根据移交日录清点核对,履行签字手续。移交日录一式两份,双方各样一份。
 - (4)负责向市城建档案馆的档案移交工作,提请城建档案馆对列入城建档案馆接收范围的工程档案进行预验收,取得"建设工程竣工档案预验收意见",在竣工验收后将工程档案移交城建档案馆。
 - (5) 指导工程技术人员对施工技术资料(包括设备进场开箱资料)的保管,指导工程技术人员对施工组织设计及施工方案、技术交底记录、图纸会审记录、设计变更通知单、工程治商记录等技术资料分类保管交资料室。指导工程技术人员对工作活动中形成的,经过办理完毕的,具有保存价值的文件材料交资料室;一项基建工程进行鉴定验收时归档的科技文件材料交资料室;已竣工验收的工程项目的工程资料分级保管交资料室。

3. 负责计划、统计的管理工作

(1) 负责对施工部位、产值完成情况的汇总、申报、按月编制施工统计报表,在平时统计资料基础上,编制整个项目当月进度统计报表和其他信息统计资料。编报的统计报表 要按现场实际完成情况严格审查核对,不得多报、早报、重报、漏报。

- (2)负责与项目有关的各类合同的档案管理,负责对签订完成的合同进行收编归档, 并开列编制目录。做好借阅登记,不得擅自抽取、复制、涂改,不得遗失,不得在案卷上 随意画线、抽括。
- (3) 负责向销售策划提供工程主要形象进度信息,向各专业工程师了解工程进度,随时关注工程进展情况,为销售签划提供准确。可靠的工程信息。

4. 负责工程项目的内业管理工作

- (1) 协助项目经理做好对外协调、接待工作,协助项目经理做好对内协调施工单位部门1之间、对外协调施工单位之间的工作。做好与有关部门及外来人员的联络接待工作,树立企业形象。
- (2)负责工程项目的内业管理工作,汇总各种内业资料,及时准确统计,登记台账,报表按要求上报。通过实时跟踪、反馈监督、信息查询、经验积累等多种方式,保证汇总的内业资料反映施工过程中的各种状态和责任,能够真实地再现施工时的情况,从而找到施工过程中的问题所在。对产生的资料进行及时收集和整理,确保工程项目的顺利进行。有效地利用内业资料记录、参考、积累、为企业发挥它们的潜在作用。
- (3)负责工程项目的后勤保障工作,负责做好文件收发、则档工作。负责部门成员考 勤管理和日常行政管理等经费报销工作。负责对竣工工程档案整理、归档、保管,便于有 关部门查阅调用。负责公司文字及有关表格等打印。保管工程印章,对工程盖章登记,并 留在各案。
 - 5. 完成工程部经理交办的其他任务

知识链接

施工资料员应具备的岗位技能见表 1-9。

表 1-9 施工资料员的岗位技能

分 类	序号	岗 位 技 能			
资料计划管理	1	能够参与编制施工资料管理计划			
资料收集整理	1	能够建立施工资料台账			
	2	能够进行施工资料交底			
	3	能够收集、审查、整理施工资料			
资料使用保管	1	能够检索、处理、存储、传递、追溯、应用工程资料			
	2	能够安全保管施工资料			
资料归档移交	1	能够对施工资料立卷、归档、验收、移交			
资料信息系统 管理	1	能够参与建立施工资料计算机辅助管理平台			
	2	能够应用专业软件进行施工资料的处理			
备注	等于上建施工、建筑设备安装等不同分部工作差异较为明显,资料员的岗位 <u>扩</u> 断培训学习				

1.3.3 资料员的工作内容

资料员的工作内容按不同阶段划分,可分为施工前期阶段、施工阶段、竣工验收阶段,见表 1-10。

表 1-10 资料员工作内容

工程修工阶段 序号		序号	资料员工作内容		
施工前期阶段		1	熟悉建设项目的有关资料和施工图		
		2	协助編制施工技术组织设计(施工技术方案), 并填写施工组织设计(方案)报母表给现场监理机构要求审批		
		3	报开工报告,填报工程开工报审表,填写开工通知单		
		4	协助编制各工种的技术交底材料		
		5	协助制定各种规章制度		
		1	及时搜集整理进场的工程材料、构配件、成品、半成品和设备的质量控制贷 (出厂质量证明书、生产许可证、准用证、交易证), 填报工程材料、构配件 设备报审表,由监理工程师审批		
		2	与施工进度同步,做好隐蔽工程验收记录及检验批质量验收记录的报审工作		
		3	及时整理施工试验记录和测试记录		
		4	阶段性地协助整理施工目记		
		1	单位(子单位)。已程质量验收资料		
	100 000	2	单位(子单位)工程质量控制资料核查记录		
	组卷	3	单位(子单位)工程安全与功能检验资料核查及上要功能抽查资料		
		4	单位(子单位) 口程施工技术管理资料		
竣工验收阶段		1	施工技术准备文件,包括图纸会审记录、控制网设置资料、工程定位测量资料基槽开控线测量资料		
		2	工程图纸变更记录,包括设计会议会审记录、设计变更记录、工程洽谈记录等		
		3	地基处理记录,包括地基钎探记录、钎探平面布置点、验槽记录、地基处理记录、 录、桩基施工记录、试桩记录等		
		4	施工材料预制构件质量证明文件及复试试验报告		
	归档	5	施工试验记录,包括土壤试验记录、砂浆混凝土抗压强度试验报告、商品混赛 土出厂合格证和复试报告、钢筋接头焊接报告等		
		6	施丁记录,包括工程定位测量记录、沉降观测记录、现场施工预应力记录、1 程竣工测量、新型建筑材料、施工新技术等		
		7	隐蔽 L程检查记录,包括基础与主体结构钢筋 L程、钢结构 L程、防水 L程、高程测量记录等		
		8	工程质量事故处理记录		

1.4.1 工程资料编号

(1) 通常工程资料编号采用7位制,形式如图1.1所示。




图 1.1 工程资料编号

(2) 单独组卷的子分部工程资料编号采用 9 位制,形式如图 1.2 所示。



图 1.2 单独组卷的子分部工程资料编号



1.4.2 工程资料组卷

- (I) 组卷是指按照一定的原则和方法,将有保存价值的工程资料分类整理成案卷的过程。
- (2) 工程准备阶段文件可按 · 个建设项目或 · 个单位工程按文件分类原则的具体内容 进行组卷,组卷范围如图 1.3 所示。




图 1.3 工程准备阶段文件组卷图

(3) 监理文件可按单位工程资料分类原则具体内容进行组卷,组卷范围如图 1.4 所示。



图 1.4 监理文件组卷图

(4) 施工文件应按照单位工程施工资料分类原则的具体内容进行组卷,组卷范围如图 1.5 所示。




图 1.5 单位工程施工资料组卷图

知识链接

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2013)附录 B 建筑工程的 分部、分项工程划分可指导工程资料编号和组卷,表 B 中未明确的分部(子分部)工程代号可依据相关标准自行确定



【标准规范】

	表 B 万印(丁万印) 土柱刈ガ衣								
序号	分部工程	子分部工程	分项工程						
1	地基与基础	地基	素土、灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、 强劣地基、注浆地基、预压地基、砂石矿复合地基。高压旋鸣注浆 地基、水泥、进排柱地基、土和灰上挤密桩复合地基、水泥粉煤灰 碎石桩复合地基、夯实水泥上桩复合地基。						
		基础	无筋扩展基础。钢筋混凝土扩展基础。筏形与箱形基础。钢结构 基础。钢管混凝土结构基础,到钢混凝土结构基础。钢筋混凝上 货制桩基础。泥浆护壁成孔灌注桩基础。干作业成孔桩基础,长 螺旋钻孔压灌柱基础。沉等灌注柱基础。钢柱基础,镇杆静压桩 基础。岩石锚杆基础。沉井与沉箱基础						
		基坑支护	灌注桩排桩围护墙,板桩围护墙,咬合桩围护墙,型钢水泥上搅拌墙,土钉墙,地下连续墙,水泥土重力式挡墙,内支撑,锚杆,与主体结构相结合的基坑支护						
		地下水控制	降水与排水,回灌						
		上方	上方开挖, 上方回填, 场地平整						
		边坡	喷锚支护,挡土墙,边坡开挖						
		地下防水	主体结构防水,细部构造防水,特殊施工法,结构防水,排水,注浆						

44.4

序号	分部工程	子分部工程	分项工程
		混凝土结构	模板、钢筋、混凝土,预应力,现浇结构、装配式结构
		砌体结构	砖砌体, 混凝土小型空心砌块砌体, 石砌体, 配筋砌体, 填充墙砌体
		钢结构	钢结构焊接,紧固件连接,钢零部件加工,钢构件组装及预拼装, 单层钢结构安装,多层及高层钢结构安装,钢管结构安装,预应 力钢索和膜结构,压型金属板,防腐涂料涂装,防火涂料涂装
2	主体结构	钢管混凝土 结构	构件现场拼装,构件安装,钢管焊接,构件连接,钢管内钢筋骨架,混凝土
		型钠混凝土 结构	型钠焊接,紧固件连接,型钢与钢筋连接,型钢构件组装及预拍装,型钢安装,模板,混凝土
		铝合金结构	铝合金焊接,紧固件连接,铝合金零部件加工,铝合金构件组装 铝合金构件预排装,铝合金框架结构安装,铝合金空间网格结构 安装,铝合金面板,铝合金卷端结构安装,防腐处理
		木结构	方木与原木结构,胶合木结构,轻型木结构,木结构的防护
	建筑装饰装棒	建筑地面	基层铺设,整体面层铺设,板块面层铺设,木、竹面层铺设
		抹灰	一般抹灰,保温层薄抹灰,装饰抹灰,清水砌体勾缝
		外墙防水	外墙砂浆防水,涂膜防水,透气膜防水
		门窗	木门窗安装,金属门窗安装,塑料门窗安装,特种门安装,门窗玻璃安装
		吊顶	整体面层吊顶,板块面层吊顶,格栅吊顶
		轻质隔墙	板材隔端,骨架隔墙,活动隔墙,玻璃隔墙
3		饰面板	石板安装, 陶瓷板安装, 木板安装, 金属板安装, 塑料板安装
		饰面砖	外墙饰面砖粘贴,内墙饰面砖粘贴
		幕墙	玻璃幕墙安装,金属幕墙安装,石材幕墙安装,陶板幕墙安装
		涂饰	水性涂料涂饰,溶剂型涂料涂饰,美术涂饰
		裱糊与软包	裱糊,软包
		细部	橱柜制作与安装,窗帘盒和窗台板制作与安装,门窗套制作与安装,护栏和挟手制作与安装,花饰制作与安装
		基层与保护	找坡层和找平层,隔汽层,隔离层,保护层
	u.e	保温与隔热	板状材料保温层,纤维材料保温层,喷涂硬泡聚氨酯保温层,现 浇泡沫混凝上保温层,种植隔热层,架空隔热层,蓄水隔热层
4	屋面	防水与密封	卷材防水层,涂膜防水层,复合防水层,接缝密封防水
		瓦面与板面	烧结瓦和混凝 L 瓦铺装,沥青瓦铺装,金属板铺装,玻璃采光顶铺装

续表

序号	分部工程	子分部工程	
4	屋面	细部构造	橋口, 橋沟和天沟, 女儿墙和山墙, 水落口, 变形缝, 伸出屋面 管道, 屋面出入口, 反梁过水孔, 设施基座, 屋脊, 屋顶窗
		室内给水 系统	给水管道及配件安装,给水设备安装,室内消火栓系统安装,消 防喷淋系统安装,防腐,绝热,管道冲洗、消毒,试验与调试
		室内排水 系统	排水管道及配件安装,雨水管道及配件安装,防腐,试验与调试
		室内热水 系统	管道及配件安装,辅助设备安装,防腐,绝热,试验与调试
		卫生器具	足生器具安装,卫生器具给水配件安装,卫生器具排水管道安装, 试验与调试
	建筑给排水及供暖	室内供暖系统	管道及配件安装,辅助设备安装,散热器安装,低温热水地板辐射供暖系统安装。电加热供暖系统安装,燃气红外辐射供暖系统安装,热气红外辐射供暖系统安装,热计量及调控装置安装,试验与调试、防腐、绝热
		室外给 水管网	给水管道安装,室外消火栓系统安装,试验与调试
5		室外排水管阀	排水管道安装,排水管沟与井池,试验与调试
		室外供热 管网	管道及配件安装,系统水压试验,土建结构,防腐,绝热,试验 与调试
		建筑饮用水 供应系统	管道及配件安装, 水处理设备及控制设施安装, 防腐, 绝热, 试验与调试
		建筑中水系 统及雨水利 用系统	建筑中水系统、南水利用系统管道及配件安装, 水处理设备及控制设施安装, 防腐, 绝热, 试验与调试
		游泳池及公 共浴池水 系统	管道及配件系统安装, 水处理设备及控制设施安装, 防腐, 绝热, 试验与调试
		水景喷泉 系统	管道系统及配件安装, 防腐, 绝热, 试验与调试
	15 H H # 10 M	送风系统	风管与配件制作,部件制作,风管系统安装,风机与空气处理设备安装,风管与设备防腐,旋流风口、岗位送风口、织物(布)风管安装,系统调试
6	通风与空调	排风系统	风管与配件制作,部件制作,风管系统安装,风机与空气处理设备安装,风管与设备防腐,吸风罩及其他空气处理设备安装,厨房、P生间排风系统安装,系统调试

			续表
序号	分部工程	子分部工程	分项工程
		防排烟系统	风管与配件制作,部件制作,风管系统安装,风机与空气处理设备安装,风管与设备防腐,排烟风阀(口)、常闭正压风口、防火风管安装,系统调试
		除尘系统	风管与配件制作,部件制作,风管系统安装,风机与空气处理设备安装,风管与设备防腐,除尘器与排污设备安装,吸尘罩安装,高温风管绝热,系统调试
		舒适性空调 系统	风管与配件制作,部件制作,风管系统安装,风机与空气处理设备安装。风管与设备防腐,组合式空调机组安装。消声器、静电除尘器、换热器、紫外线灭南器等设备安装,风机盘管、变风量与定风量送风装置、射流喷口等末端设备安装,风管与设备绝热,系统调试
	通风与空调	恒温恒湿 空调系统	风管与配件制作,部件制作,风管系统安装,风机与空气处理设备安装,风管与设备防腐,组合式空调机组安装,电加热器,加滤器等设备安装,精密空调机组安装,风管与设备绝热,系统调试
6		净化空调系统 原产人防通风系统 真空吸尘 系统 空调(冷、热) 水系统	风管与配件制作,部件制作,风管系统安装,风机与空气处理设备安装,风管与设备防腐,净化空调机组安装,消声器、静电除尘器、换热器、紫外线火腐器等设备安装,中、高效过滤器及风机过滤器单元等末端设备清洗与安装,洁净度测试,风管与设备绝热,系统调试
			风管与配件制作、部件制作、风管系统安装、风机与空气处理设备安装,风管与设备防腐,过滤吸收器、防爆波活门、防爆超压排气活门等专用设备安装,系统调试
			风管与配件制作,部件制作,风管系统安装,风机与空气处理设备安装,风管与设备防腐,管道安装,快速接口安堤,风机与滤尘设备安装,系统压力试验及调试
			管道系统及部件安装,水泵及附属设备安装,管道冲洗,管道、设备防腐,板式热交换器,辐射板及辐射供热、供冷地埋管、热泵机组设备安装,管道、设备绝热,系统压力试验及调试
			管道系统及部件安装, 水泵及附属设备安装, 管道冲洗, 管道、设备防腐, 冷却塔与水处理设备安装, 防冻件热设备安装, 管道、设备绝热, 系统压力试验及调试
		冷却水系统	管道系统及部件安装, 水泵及附属设备安装, 管道冲洗, 管道、设备防腐, 系统灌水渗漏及排放试验, 管道、设备绝热
		土壤源热泵 换热系统	管道系统及部件安装, 水泵及附属设备安装, 管道冲洗, 管道、设备防腐, 理地换热系统与管阿安装, 管道、设备绝热, 系统压力试验及调试

续表

序号	分部工程	子分部工程	グル上社	
		水源热泵 换热系统	管道系统及配件安装, 水泵及附属设备安装, 管道,中洗, 管道、设备防腐, 地表水源换热管及管网安装, 除垢设备安装, 管道、设备绝热, 系统压力试验及调试	
		蓄能系统	管道系统及部件安装,水泵及附属设备安装,管道冲洗,管道、设备防腐、蓄水罐与蓄冰槽、罐安装,管道、设备绝热,系统压力试验及调试	
		压缩式制冷 (热)设备系统	制冷机组及附属设备安装,管道、设备防腐,制冷剂管道及部件安装,制冷剂灌注,管道、设备绝热,系统压力试验及调试	
6	通风与空调	吸收式制冷设备系统	制冷机组及附属设备安装,管道、设备防腐,系统真空试验,溴 化锂溶液加滞、蒸汽管道系统安装,燃气或燃油设备安装,管道、 设备绝热,试验及调试	
		多联机 (热泵) 空调系统	室外机组安装,室内机组安装,制冷剂管路连接及控制开关安装,风管安装,冷凝水管道安装,制冷剂灌注,系统压力试验及调试	
		太阳能供暖空调系统	太阳能集热器安装,其他辅助能源、换热设备安装,蓄能水箱、 管道及配件 安装,防腐,绝热,低温热水地板辐射采暖系统安装, 系统压力试验及调试	
		设备自控 系统	温度、压力与流量传感器安装, 执行机构安装调试, 防排观系统 功能测试, 自动控制及系统智能控制软件调试	
	建筑电气	室外电气	变压器、箱式变电所安装,成套配电枢、控制柜(屏、台)和动力、 膜则配电箱(盘)及控制制定装、棒架、支架、托盘和槽盒安装,导 管敷设、电缆敷设、管内穿线和槽盒内敷线,电缆头制作、导线 连接和线路绝缘测试,普通灯具安装,专用灯具安装,建筑照明 通电试运行,接地装置安装	
		变配电室	变压器。箱式变电所安装,成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、 照明配电箱(盘)安装,母线槽安装,棒架、女架、托盘和槽盒安装, 电缆敷设,电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试,接地装置安 装,接地下线散设	
7		建筑电气	供电干线	电气设备试验和试运行, 母线槽安装, 榜架、支架、托盘和槽盒 安装, 导管敷设, 电缆敷设, 管内穿线和槽盒内敷线, 电缆头制 作、导线连接和线路绝缘测试, 接地干线敷设
		电气动力	成舊配电柜、控制柜(屏、台)和动力配电箱(盘)安装,电动机、电 加热器及电动执力机构检查接线,电气设备试验和试运行,梯架、 支架、托盘和槽盒安装,导管敷设,电缆敷设,管内穿线和槽盒 内敷线,电缆头削作、导线连接和线路绝缘测试	
		-	电气照明	成套配电柜、控制柜(屏、台)和照明配电箱(盘)安装,梯架、支架、 托盘和槽盒安装,导管敷设,管内穿线和槽盒内敷线,塑料护套 线自敷布线,钢索配线,电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试, 普通灯具安装,专用灯具安装,开关、插座、风扇安装,建筑照 明通电试运行

结束

_			续表
序号	分部工程	子分部工程	分项工程
7	建筑电气	备用和不间 断电源	成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盖)安装、柴油 发电机组安装,不问断电源装置及减急电源装置安装, 拇线槽安 装, 导管敷设, 电缆敷设, 管内穿线和槽盒内敷线, 电缆头制作、 导线连接和线路绝缘测试, 接地装置安装
		防雷及接地	接地装置安装,防雷引下线及接闪器安装,建筑物等电位连接, 浪涌保护器安装
		智能化 集成系统	设备安装,软件安装,接口及系统调试,试运行
		信息接入 系统	安装场地检查
		用户电话 交换系统	线缆敷设,设备安装,软件安装,接口及系统调试,试运行
		信息网络 系统	计算机网络设备安装, 计算机网络软件安装, 网络安全设备安装, 网络安全软件安装, 系统调试, 试运行
	· 智能建筑	综合布线 系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装、线缆敷设, 机桩、机架、配线架 安装, 信息插座安装, 链路或信道测试, 软件安装, 系统调试, 试运行
		移动通信室 内信号覆盖 系统	安装场地检查
		P.星通信 系统	安裝场地检查
8		有线电视及 卫星电视接 收系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装,线缆敷设,设备安装,软件安装,系统调试,试运行
		公共广播 系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装,线缆敷设,设备安装,软件安装,系统调试,试运行
		会议系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装,线缆敷设,设备安装,软件安装,系统调试,试运行
		信息导引及 发布系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装,线缆敷设,显示设备安装,机房 设备安装,软件安装,系统调试,试运行
		时钟系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装,线缆敷设,设备安装,软件安装,系统调试,试运行
		信息化应用 系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装,线缆敷设,设备安装,软件安装,系统调试,试运行
		建筑设备 监控系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装,线缆敷设,传感器安装,执行器 安装,控制器、箱安装,中央管理工作站和操作分站设备安装, 软件安装,系统调试,试运行

续表

			茨 农			
序号	分部工程	子分部工程	分项工程			
		火灾自动 报警系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装,线缆敷设,探测器类设备安装, 控制器类设备安装,其他设备安装,软件安装,系统调试,试运 行			
		安全技术 防范系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装,线缆敷设,设备安装,软件安装, 系统调试,试运行			
8	智能建筑	应急响应 系统	设备安装、软件安装、系统调试、试运行			
		机房	供配电系统,防雷与接地系统,空气调节系统,给水排水系统,综合布线系统,监控与安全防范系统,消防系统,室内装饰装修, 电磁屏蔽、系统调试,试运行			
		防雷与接地	接地装置,接地线,等电位联接,屏蔽设施,电涌保护器,线缆 敷设,系统调试,试运行			
	建筑节能	围护系统 节能	墙体节能, 幕墙节能, 门窗节能, 屋面节能, 地面节能			
		建筑节能			供暖空调 设备及管网 节能	供暖节能, 通风与空调设备节能, 空调与供暖系统冷热源节能, 空调与供暖系统管网节能
9			电气动力,节能	配电节能,照明节能		
		监控系统 节能	监测系统节能,控制系统节能			
		可再生能源	地源热泵系统节能, 太阳能光热系统节能, 太阳能光伏节能			
			电力驱动的 曳引式或 强制式电梯	设备进场验收, 土建交接检验, 驱动上机, 导轨, 门系统, 轿厢, 对重, 安全部件, 悬挂装置, 随行电缆, 补偿装置, 电气装置, 整机安装验收		
10	电梯	液压电梯	设备进场验收, 土建交接检验, 液压系统, 导轨, 门系统, 轿厢, 对重, 安全部件, 悬挂装置, 随行电缆, 电气装置, 整机安装验 收			
		自动扶梯、自动人行道	设备进场验收、士建交接检验、整机安装验收			

1.4.3 工程资料组卷要求

1. 卷内文件的排列

(1) 文字材料按事项、专业顺序排列。同一事项的请示和批复,同一文件的印本与定稿、文件与附件不能分开,并按批复在前、请示在后,印本在前、定稿在后,主件在前、附件在后的顺序排列。

- (2) 图纸按专业排列,同专业图纸按图号顺序排列。
- (3) 既有文件材料又有图纸的案卷,如果文字是针对整个工程或某个专业进行的说明 或指示,文字材料排前,图纸排后;如果文字是针对某一图幅或某一问题或局部的一般说 明,图纸排前,文字材料排后。

2. 卷内目录

卷内目录格式见表 1-11。

表 1-11 卷内目录格式

(¥ €	大學論句	委任者	义件复名	日明	英次	静注
		-53				
			100			
			- 8			

特别提示

- (1) 序号: 以一份文件为单位,按文件的排列用阿拉伯数字从"1" 依次标注。
- (2) 文件編号: 填写工程文件原有的文号或图号
- (3) 责任者:填写文件的直接形成单位和个人 由多个责任者时,选择两个主要责任者,其余用"等"代替。
 - (4) 文件题名: 填写文件标题的全称
 - (5) 日期: 填写文件形成的日期
 - (6) 页次: 填写文件在卷内所排的起始页号, 最后一份文件填写起止页号。
 - (7) 备注: 填写需要说明的问题。

3. 案卷备考表的编制

案卷备考表排列在卷内文件的尾页之后,格式如图 1.6 所示。



图 1.6 卷内备考表样式(单位: mm)

4. 案卷封面的编制

案卷封面印刷在卷盒、卷夹的正表面也可采用内封面形式,常见格式如图 1.7 所示。



卷盒、卷夹封面A×B=310mm×220mm 案卷封面A×B=297mm·210mm

图 1.7 案卷封面样式(单位: mm)

建筑工程资料管理(第二版)

特别提示

- 1 業卷备考表页數填写主要包括:卷內文件材料的总页數、各类文件页數(照片张數),以及立案单位对當案情况的说明。
 - 2. 时间: 填写完成立卷时间, 年代编写 4 位数。
 - 3. 档号:应由分类号、项目号和档案号组成、由档案保管单位填写。
 - 4. 档案馆代号应填写国家给定的本档案馆的编号。由档案馆填写
- 5. 業卷題名: 简明准确地揭示卷内文件的内容,包括工程名称、专业名称、卷内文件的内容。
 - 6 编制单位, 应埴写零器内文件的形成单位或主要责任者, 即立器单位,
 - 7. 编制日期: 应填写档案整编日期。
- 8. 保管期限:分为永久、长期、短期3种期限 永久是指工程档業需永久保存 长期是指工程档案的保存期限等于该工程的使用寿命 短期是指工程档案保存20年以下,同一案卷有不同保管期限的文件,該案案保管期限应属于长期。
- 9. 密级:分为绝密、机密、秘密3种 同一接卷内有不同密级的文件,应以高密级为本卷密级
 - (1) 案卷不宜过厚, 一般不超过 40mm
 - (2) 窒 内不应有重份文件,不同数体的文件一般应分别组卷、

1.4.4 案卷的装订

1. 客卷的装订形式

案卷可采用装订和散装两种形式。文字材料必须装订,既有文字材料又有图样的案卷 应装订。采用线绳三孔左侧装订法,要整齐、牢固,便于保管和利用。装订时必须易除金 属物。

2. 案卷的装具

案卷装具一般采用卷盒、卷夹两种形式。卷盒、卷夹应采用无酸纸制作。卷盒的外表 尺寸为310mm×220mm, 厚度分别为20mm、30mm、40mm和50mm。卷夹的外表尺寸为 310mm×220mm, 厚度一般为20~30mm。

3、案卷脊背

案券資貨的内容包括档号和案券题名。

案卷由互有联系的若干文件组合而成,并放入卷夹、卷皮送往档案保管单位,案卷也 是全宗内档案系统排列、编日和统计的基本单位。案卷是根据文件的来源、时间、内容和 外形上的异同点和联系组成的,包括案卷封面、卷内文件目录、卷内文件、卷内备考表等 几部分。

案卷封面项目包括: 全宗名称、类目名称、案卷题名、卷内文件起止日期、保管期限、 件(页)数、档案馆代号、档号。有些国家对案卷的规格有统一的规定。

卷内文件目录是案卷内登录文件题名及其他特征并固定文件排列次序的表格,通常排

列在卷内文件之前。卷内文件目录项目包括:顺序号、文号、责任者、题名、日期、页号。 卷内备考表是案卷内文件状况的记录,通常排列在卷内文件之后。主要项目有:本卷 情况说明、立卷人、检查人、立卷时间等。

建筑工程资料验收、移交与归档

1.5.1 建筑工程资料验收

建筑厂程竣工验收前,参建各方单位的主管(技术)负责人,应对本单位形成的厂程资 料讲行竣工审查、建设单位应按照国家验收规范和相关规定的要求。对参建各方汇总的资 料进行验收,使其完整、准确。

列入城建档案馆(室)档案接收范围的工程,建设单位在组织工程竣工验收前,应提请 城建档案管理机构对工程档案讲行预验收。建设单位未取得城建档案管理机构出具的认可 文件不得组织工程竣工验收。

验收主要包括以下内容。

- (1) 工程资料是否齐全、系统、完整。
- (2) 工程资料的内容是否真实、准确地反映工程建设活动和工程实际状况。
- (3) [程资料是否已整理立卷,并符合相关标准的规定。
- (4) 竣工图绘制方法、图式及规格等是否符合专业技术要求,图面整洁,加盖竣工图 章等情况。
 - (5) 文件的形成、来源县否符合实际、单位或个人的签章、手续县否完备等。
 - (6) 文件材质、幅面、其写、绘图、用墨、扦裱等是否符合要求。

知识链接

纸张的加固方式之一——托裱法

托.裱是我国传统的技艺,是行之有效的加固方法,一般可分单而托裱和双面托裱 单 面托裱、就是在有文字的背面进行裱托。双面托裱、则适用于两面有文字的纸张。托裱工 艺两者基本相同。所不同的是使用的托纸要求不同。

托裱目前应用较为广泛,操作方法是:把需托裱的纸张用湿毛巾覆盖在上,或以清水 喷湿, 使之润湿, 舒展平整 施以浆水、再把托纸盖在上面, 用糊帚把它刷平, 在上刷托 纸时, 左手拿着纸张另一头, 时时将托纸和纸张书页轻轻揿松, 并要与右手动作配合, 既 不能刷得太紧. 又不能刷得太松, 以不刷出夹皱为度, 待全部刷好后, 再翻转放到一张干 纸上,用糊帚排刷,使之粘接牢固 托裱又分湿托和干托 其操作方法基本上相同,主要 区别在干干托是把糨糊刷在托纸上。而湿托却是把糨糊刷在文件上。使用时应根据字迹的 耐水程度来决定。

1.5.2 建筑工程资料移交

施工、监理等工程参建单位应将工程资料按合同或协议在约定的时间按规定的套数移 交给建设单位,并填写移交目录,双方签字、盖章后按规定办理移交手续。

列入城建档案馆接收范围的工程,建设单位在工程竣工验收后3个月内必须向城建档案馆移交一套符合规定的工程档案资料,并按规定办理移交手续。若推迟报送日期,应在规定报送时间内向城建档案馆申请延期报送,并说明延期报送的原因,经同意后方可办理延期报送手续。停建、缓建工程的档案,暂由建设单位保管。改建、扩建和维修工程,建设单位应当组织设计、施工单位根据实际情况修改、补充和完善原工程资料。对改变的部场,应当重新编制工程档案,并在工程验收后3个月内向城建档案馆移交。建设单位内的城建档案馆移交工程档案时,应办理移交手续,填写移交目录,双方签字、盖章后交接。

1.5.3 建筑工程资料归档

1. 归档

建筑工程资料的归档是指建筑工程资料形成单位完成其工作任务后,将形成的资料整理立卷,按规定移交档案管理机构。

归档包括两方面含义: 一是建设、勘察、设计、施工、监理等单位将本单位在建筑工程建设过程中形成的资料向本单位档案管理机构移交; 二是勘察、设计、施工、监理等单位将本单位在工程建设过程中形成的资料向建设单位档案管理机构移交。

归档应符合下列规定。

- (1) 归档资料必须完整、准确、系统,能够反映建筑工程建设的全过程。归档的资料必须经过分类整理,并应组成符合要求的案誊。
- (2) 根据工程建设的程序和特点,归档可以分阶段进行,也可以在单位或分部工程通过竣工验收后进行。一般规定勘察、设计单位应当在任务完成时,施工、监理单位应当在 工程竣工验收前,将各自形成的有关工程档案向建设单位归档。
- (3) 勘察、设计、施工单位在收齐工程文件并整理立卷后,建设单位、监理单位应根据城建管理机构的要求对档案文件的完整、准确、系统情况和案卷质量进行审查,审查合格后向建设单位移交。
 - (4) 工程档案一般不少于两套,一套由建设单位保管,一套(原件)移交当地城建档案馆。
- (5) 勘察、设计、施工、监理等单位向建设单位移交档案时,应编制移交清单,双方签字、盖章后方可交接。
- (6) 凡设计、施工及监理单位需要向本单位归档的文件,应按国家有关规定的要求单独立卷归档。

2. 建设单位办理工程竣工验收备案

建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件。

- (1) 工程竣工验收备案表。
- (2) 工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括工程报建日期,施工许可证号,施工 图设计文件审查意见,勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验

收人员签署的竣工验收原始文件,市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备 案机关认为需要提供的有关资料。

- (3) 法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件。
- (4) 法律规定应当由公安消防部门出其的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件。
 - (5) 施工单位签署的工程质量保修书。
 - (6) 法规、规章规定必须提供的其他文件。

3. 竣工图章

竣工图章的基本内容应包括:"竣工图"字样、施工单位、编制人、审核人、技术负责 人、编制日期、监理单位、现场监理、总监。

4. 竣工图

利用施工图改绘竣工图,必须标明变更修改依据;凡施工图结构、工艺、平面布置等 有重大改变,或变更部分超过图面 1/3 的,应当重新绘制竣工图。

5. 工程图纸

知识链接

不同幅面的工程图纸应按《技术制图 复制图的折叠方法》(GB/T 10609.3—2009)统 · 折叠成 A4 幅面(297mm×210mm),图标栏露在外面。

技术制图折叠方法示例,如图 1.8~图 1.16 所示 [标准规范]

图 1.8 竣工图(单位: mm)




图 1.9 A1 图纸的折叠方法(1)(单位: mm)




图 1.10 A1 图纸的折叠方法(2)(单位: mm)



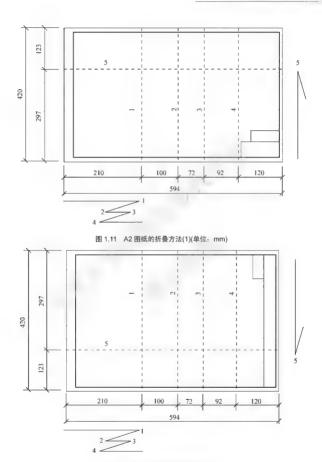


图 1.12 A2 图纸的折叠方法(2)(单位: mm)



210 119 120 185 185 185 185 8

图 1.14 A0 图纸的折叠方法(2)(单位: mm)







图 1.15 A3 图纸的折叠方法(1)(单位: mm)

图 1.16 A3 图纸的折叠方法(2)(单位: mm)



能力拓展

- 参照《技术制图 复制图的折叠方法》将不同幅面的一套工程图纸统一折叠成 A4幅面(297mm×210mm), 图标栏露在外面。
 - 2 以章前引例为范本模拟资料员,画出另一套工程资料宗卷的结构图,并准备相应的

档案盒及案券备考表等资料为后续章节的学习打下基础。

- 3. 到工地现场访问工程资料员,了解他们真实工作过程中的困难及经验,写出访问报告,字数不少于2000字,访问报告要求真实有效,具有可追溯性。
 - 4. 对应章前学习要求、填写学习效果自我检测记录表。

学习效果自我检测记录表

	1		4			
页域	1	3 6		-	A	
理论认知	.7解	延用		综合		
岗位技能	模仿	应用		创造		
职业情感	激情	心境		热情		

5. 学习过程中,不仅要注重沟通表达能力训练,团队合作学习,更要加强个人工程实践经验的积累 伴随着理论知识学习,自觉及时记录课后实践将促进职业能力的提升

课后实践记录表

实践分项	时 间 段	A 美食要点	见证人及联络方式
□地考察		工程名称、工程所在地	
沟通能力训练		沟通对象、沟通内容、沟通效果	
内业资料管理		收集、分类、整理、立卷、归档	
小组合作学习		分工负责情况及合作成效	
实践中遭遇的问题		视具体情况填写,着眼于发现问题、 分析问题及解决问题	
其他			

第2章 工程准备阶段 文件编制与整理

学习要求

资料员应知	资料员内会	职业素养
1. 工程准备阶段文件的主要内容 2. 工程准备阶段文件的编制要求 3. 让程准备阶段文件的财形成程序 4. 正程准备阶段文件的财产备案 5. 工程准备阶段文件的政工备案 6. 工程准备阶段文件的安全管理	1. 会进行上程准备阶段文件可料 2. 会整理竣工图 3. 会建立工程准备阶段资料台账 4. 能够检索、应用工程准备阶段文件 5. 能够安全防护和管理工程准备阶段文件 6. 能够规范移交工程准备阶段文件	具备良好的工作态度;增强与人交流、沟通及协作的能力

学习性工作任务

工程背景

日照职业技术学院新校区坐落在日照大学科技图北部、占地 82.8 万平方木, 其中单体建筑 20 余幢。 涉及施工单位 13 个、监理单位 8 个、勘察设计单位 7 个、还有若干货物供应商

工作准备

每小理准备统一的档案盒 8 个, 工程准备阶段文件管理相应表档若干, A4 活动页纸张若干, 竣工图纸 1 套, 工程资料管理软件一套

工作任务

结合工程背景提供的信息。模拟波建设单位工程准备阶段文件管理人员、完成以下任务

- (1) 依据现行的工程资料管理行业标准,对工程准备阶段文件进行分类整理
- (2) 以小组为单位,分工合作完成单位工程工程准备阶段文件归档和移交

教学建议

🔯 引例

日照职业技术学院新校区建设指挥部作为甲万代表,全权负责工程建筑及工程准备阶段文件的编制与整理。其中四期工程模况见表 2-1

表 2-1	日照职业技术学院新校区概况

	Ī		111	总投资 /元	111	监 理 单 位
期	海润槽	e c	8 724m²	870万	日照市东港西湖建筑工程 有限公司	山东省工程建设监理公司
	和润槽	K	10 747m²	1 000 万	日照市石臼建筑工程有限 公司	山东省工程建设监理公司
4		Α区	19 257m ²	1 900 万	山东锦华建设集团有限公司	山东监协建设监理中心
期	地滋楼 47 570m ²	B∣⊠	11 029m ²	1 100 万	日照市东港西湖建筑工程 有限公司	山东监协建设监理中心
		C区	17 284m ²	1700万	山东日建集团有限公司	山东监协建设监理中心
濉	格物楼 46 305m ²	ΑX	12 495m ²	1 250 万	日照市东港西湖建筑工程 有限公司	山东监协建设监理中心

			建筑	. 总投资 /元	h ± 1111	1111
	格物楼 F		13 990m²	1 400 万	日照市东港区兴安建筑有 限公司	山东省工程建设监理公司
	46 305m ²	CK	19 820m ²	2 000 万	山东锦华建设集团有限公司	日照日星建设监理有限公司
NH.	德润机	ć	10 265m ²	620 万	日照方圆建设集团有限公司	山东众成 L程建设服务有 限公司
利力	山涧楼		11 165m²	1 100 万	日照市鲁艺建筑工程有限 责任公司	山东省中鲁监理公司
	体育看台		5 909m ²	590万	日照市恒 □筑 □程有限公司	日照市天衡 L程监理有限 公司
		Α区	9 559m ²	950 万	口照市山海天建筑有限公司	山东省工程建设监理公司
	图文信息与 行政办公楼 46 914m² 四期 国际交流中 心 22 499m²	В区	23 199m²	2 300 万	日照港建筑安装有限公司	山东众成工程建设服务有 限公司
四		C 🗵	14 156m²	1 400 万	日照市石白建筑工程有限 公司	山东恒信建设监理有限公司
期		AΧ	5 684m ²	560万	日照市秦楼建筑工程有限 公司	山东省建设监理服务中心
		B⊠	13 789m ²	1 300 万	山东西湖建设有限公司	口照口星建设监理有限公司
		€⊠	3 026m ²	302 万	日照山鲁艺建筑工程有限 责任公司	山东省建设监理服务中心

息 思考

- 1. 工程准备阶段文件形成的流程是什么?
- 2. 工程准备阶段文件包括哪些内容?
- 3. 工程准备阶段文件中涉及的相关方有哪些?
- 4. 工程竣工验收及备案资料涉及的相关方有哪些?
- 5、 工程影音资料包括哪些载体?
- 6. 工程准备阶段文件组卷与施工资料、监理资料组卷有何联系与区别?
- 7. 工程准备阶段文件审批单位有哪些?

推荐阅读资料

- 1. 《建设工程文件归档整理规范》(GB/T 50328-2014)
- 2. 《技术制图 复制图的折叠方法》(GB/T 10609.3-2009)
- 3. 《建筑工程资料管理规程》(JGJ/T 185-2009)

2.1 立 项 文 件

2.1.1 项目建议书及批复文件

1. 项目建议书

项目建议书是由建设单位自行编制或委托其他有相应资质的咨询单位编制并申报的文 件。项目录议书主要内容须包括如下内容。

- (1) 工程概况。
- (2) 项目建设的必要性。
- (3) 项目建设的意义。
- (4) 项目建设的规模。
- (5) 项目投资估算及资金筹措。
- (6) 项目社会效益、经济效益、环境效益分析。
- (7) 结论及建议。

知识链接

项目建议书应有的主要附件如下

- (1) 项目初步可行性研究报告。
- (2) 项目选择初步方案报告。
- (3) 資金籌措方案初步意向性文件。
- (4) 有关部门对选址或征用土地的初步意义。
- (5) 建设项目可行性研究工作计划。

2. 项目建议书批复文件

项目建议书批复文件是建设单位的上级主管单位或国家有关主管部门(一般是发展改革部门)对该项目建议书的批复文件。

- (1) 建设项目名称。
- (2) 建设规模及主要建设内容。
- (3) 总投资及资金来源。
- (4) 建设年限。
- (5) 批复意见说明批复单位及时间。

2.1.2 可行性研究报告及批复文件

1. 可行性研究报告

可行性研究报告是由建设单位自行编制或委托具有相应资质的工程咨询、设计单位编 制的文件。

可行性研究报告主要内容包括如下方面。

- (1) 项目概要。
- (2) 项目建设背景及必要性。
- (3) 项目承建单位的基本情况。
- (4) 项目选址。
- (5) 项目主要技术指标分析。
- (6) 项目工程建设方案。
- (7) 投资估算和资金筹措。
- (8) 建设期限和实施进度安排。
- (9) 环保与节能。
- (10) 项目组织管理与运行。
- (11) 招标方案。
- (12) 效益分析。
- (13) 结论与建议。

知识链接

可行性研究报告主要附件如下

- (1) 单位法人证书
- (2) 建设单位对建设地点的土地使用权证明或协议、房产证
- (3) 项目建设规划总平面图、建设方案平面布置图
- (4) 项目建设内容投资一览表。
- (5) 项目选址和建设条件表
- (6) 项目招标投标事项申请

2. 可行性研究报告批算文件

大中型项目由国家发展与改革委员会或由国家发展与改革委员会委托的有关单位审批; 小型项目分别由行业或国家有关主管部门审批; 建设资金白筹的企业大中型项目由城市发展与改革委员会审批, 报国家及有关部门备案; 地方投资的文教、卫生事业的大中型项目由城市发展与改革委员会审批。

批复文件主要内容如下。

建筑工程资料管理(第二版)

- (1) 建设项目名称。
- (2) 建设单位名称。
- (3) 项目建设的必要性。
- (4) 项目选址和建设条件。
- (5) 功能定位。
- (6) 建设内容和规模。
- (7) 项目总平面布置。
- (8) 市政公用及配套。
- (9) 总投资与资金来源。
- (10) 批复意见说明、批复单位及时间。

4 特别提示

立项文件还包括的资料如下

1. 项目建议书

它是由建设单位自行编制或委托其他有相应资质的咨询或设计单位编制并申报的文件

2. 项目建议书批复文件

它是建设单位的上级主管单位或国家有关主管部门(一般是发展改革部门)对该项目建议书的批复文件。

3. 可行性研究报告

它是由建设单位自行编制或委托具有相应资质的工程咨询、设计单位编制可行性研究 报告。

4. 可行性研究报告批复文件

大中型项目由国家发展与改革委员会或由国家发展与改革委员会委托的有关单位审批; 小型项目分别由行业或国家有关主管部门审批; 建设资金自筹的企业大中型项目由城市发展与改革委员会审批, 报国家及有关部门备案; 地方投资的文教、卫生事业的大中型项目由城市发展与改革委员会审批。

5. 关于立项的会议纪要、领导批示

关于立项的会议纪要是由建设单位或其上级主管部门召开研究会议后形成的文件、并 由相关领导做出的批示。

6. 专家对项目的有关建议文件

它是由建设单位或有关部门组织专家会议后所形成的有关建议性方面的文件

7. 项目评估研究资料

它是由建设单位或主管部门(一般是发展改革部门)组织会议,对该项目的可行性研究 报告进行评估论证之后,所形成的资料。

建设用地文件 2.2

2.2.1 建设项目选址意见书

新建设项目报建应具备"一书三证",即《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可 证》《建设工程规划许可证》《建设工程施工许可证》。

城市规划区内的建设工程选址和布局必须符合城市规划。设计任务书报请批准时,必 须附有城市规划行政主管部门的选址意见书。

- 1. 申请《建设项目选址意见书》需报送资料
- (1)《建设项目选址意见书》申请表1份。
- (2) 土地权证明文件。
- (3) 扩建项目需提供产权证复印件1份。
- (4) 联建项目需提交联建协议1份。
- (5) 1:500 地形图 6 份,其中 1 份用蓝笔标注拟建用地范围示意图,并由供地单位或 自有用地单位加盖公章。
 - (6) 其他需要说明的图纸、文件等。
 - 2. 办理国有土地使用权证应当提供的材料
 - (1) 土地登记申请书。
 - (2) 土地登记审批表。
 - (3) 征用土地批准材料和红线图。
 - (4) 地籍图或地形图。
 - (5) 出让金收据、契税(复印件)。
 - (6) 法人资格证明(或个人身份证明)。
- (7) 需提供的其他证明材料(包括国有土地使用权出让合同、建设项目批文、营业执照 等复印件)。
 - 3. 办理建设项目选址意见书应当提供的材料
- (1) 立项主管部门出具的建设项目可行性相关说明材料(非国有投资的建设项目出具申 请说明书)。
 - (2)《建设项目选址申请书》。
 - (3) 建设项目用地协议书或者用地证明文件或者用地说明。
 - (4) 符合规划审批要求的城市现状地形图。
 - (5) 建设资金法定证明(金额应在建设项目总投资的30%以上)。

2.2.2 规划用地审批

《中华人民共和国城市规划法》规定以下建设工程需要申请《建设用地规划许可证》。

- (1) 凡新建、改建、扩建工程项目需要新征用地的。
- (2) 用地性质或面积发生变化的建设项目。
- (3) 土地权发生变化的建设项目。
- (4) 在城市规划区内需要办理拆迁手续的。

▲ 特别提示

申请《建设用地规划许可证》需报送的资料如下。

- (1)《建设用地规划许可证》申请表1份。
- (2) 计划批准文件(限政府投资项目)1份。
- (3) 勘测单位出具的勘测放线成果 1 套。
- (4) 涉及规划地铁控制线的建设项目,出具市地铁管理部门的意见
- (5) 涉及规划黄线范围内的建设项目, 出具文化部门的意见。
- (6) 涉及土地整合的建设用地、出具国土部门整合土地的意见。
- (7) 涉及航空限高的建设项目,出具规划部门的航空限高要求或空军对航空限高的要求
 - (8) 其他需要说明的图纸、文件。

2.3 勘察设计文件

2.3.1 工程地质勘察报告

工程地质勘察报告由建设单位委托的勘察单位勘察工程地质后形成,勘察报告一般包括文字和图表。

文字部分包括: 工程概况、勘察目的和任务、勘察方法及完成工作量、依据的规范标准、工程地质和水文条件、岩土特征及参数、场地地震效应等,最后对地基做出一个综合的评价、提供承载力数据等。

图表部分包括: 平面图、剖面图、钻孔柱状图、土工试验成果表、物理力学指标统计 表、分层土工试验报告表等。

2.3.2 工程测量与规划设计审批

1. 工程定位测量、放线、水准点引测记录

工程定位测量放线是指单位工程开工前,施工单位根据建设单位提供的测绘部门的放线成果、红线桩及场地控制网(或建筑物控制网)、设计总平面图及水准点,对工程进行的准确测量定位。资料表格形式见表 2-2 和表 2-3。

表 2-2 工程定位测量、放线、水准点引测记录

工程名称			施工	单位				
依据			仪器	型号				
设计标高			水准	5.位置				
定位测量示意图 (1) 定位测量经过 (2) 水准点引测经				-				
(2) 水准从5.例经 结论:	21.							_
		V.						
水准点引测示意图:			-500					
结论:								_
>11 164								
建设单位:	施工单位:		监理单位:		测量人:			_
建设单位:	施工单位:		监理单位:		测量人:			
	施 工单位: 项目专业负责	人:	监理单位: 总监理工程》	i;	测量人: 复测人:			
建设单位: 项目负责 人 : 年 月		人:		i: 月 日	复测人:	年	月	

表 2-3 工程定位测量、放线、水准点引测经过记录

工程名称	施工单位	
工程地点	·	
记录内容:		
项目负责人:		
AII 2227	记录人:	
	年 月 日	年 月 日
	年 月 日	

特别提示

工程测量相关规定及要求

工程定位测量主要有建筑物位置线、现场标准水准点、坐标点(包括场地控制网或建筑物控制网、标准轴线桩等) 测绘部门根据《建筑工程规划许可证》(含附件、附图)批准的建筑工程位置及标高依据、测定出建筑物红线桩

- (1)建筑物位置线 施工测量单位(指专业测量单位)应根据测绘部门提供的放线成果、 红线桩及场地控制网(或建筑物控制网),测定建筑物位置、主控轴线及尺寸,做出平面控 制网并绘制成图。
- (2) 标准水准点 标准水准点由规划部门提供,用来作为引入拟建建筑物标高的水准 点、一般为 2~3 点,在使用前必须进行校核,测定建筑物+0.000 绝对高程。
 - (3) 工程定位测量检查内容包括如下。
 - ① 校核标准轴线桩点、平面控制网。
 - ② 校核引进现场施工用的水准点.
 - ③ 检查计算资料及成果、依据材料、标准轴线桩及平面控制网示意图
- (4)工程定位测量完成(经建设、监理单位校核)后,应由建设单位报请具有相应资质的 测绘部门验线。

2. 建设单位申请办理《规划设计条件通知书》须提供的申办材料

- (1) 规划部门核发的《选址规划意见通知书》及其附图、和《选址规划意见通知书》 当中所要求的其他部门意见。
 - (2) 计划行政主管部门的批准文件 1 份。
- (3) 申请办理《规划设计条件通知书》的"拟建项目情况说明书"1份,其内容包括。 建设理由,建设工程的规模、性质、占地面积,对道路使用、环境、市政基础配套设施方 面的要求等。
 - (4) 经规划部门核准的拟建项目总体方案图(加盖规划管理章)1份。

▲ 特别提示

勘察、设计文件

- (1) 工程地质勘察报告,由建设单位委托的勘察单位勘察工程地质后形成
- (2) 水文地质勘察报告,由建设单位委托的勘察单位勘察工程水文地质情况后形成
- (3) 建筑用地钉桩通知单,由城市规划部门审批形成
- (4) 验线通知单:由城市规划部门审批形成
- (5) 规划设计条件通知书及附图:由城市规划部门审批形成
- (6) 审定设计方案通知书及附图:由城市规划部门审批形成。
- (7) 有关部门对审定设计方案通知书的审查意见和要求取得的有关协议:分别由人防、 环保、消防、交通、园林、市政、文物、通信、保密、河湖、教育等部门审批形成

2.3.3 设计文件

设计文件由建设单位委托设计单位完成。根据工程建设项目在审批、施工等方面对设 计文件深度要求的变化,产生以下设计文件。

- (1) 初步设计图及说明,由设计单位形成。
- (2) 施工图设计及说明:由设计单位形成。
- (3) 设计计算书:由设计单位形成。
- (4) 人防、环保、消防、设计等主管部门审核意见:由人防、消防、环保等单位审批 形成。
 - (5) 施工图设计文件审查通知书及施工图审查报告:由审查机构审查形成。
 - (6) 节能设计备案文件:由设计单位形成。

2.4 招标投标文件

2.4.1 勘察、设计、施工、监理等各种招标投标文件

招标文件由建设单位自行编制或委托具有相应资质的招标代理机构编制,投标文件分别由勘察、设计、施工、监理单位编制,中标通知书由建设单位或招标代理机构编制而成,监管部门备案。

- 1. 施工招标文件主要内容
- (1) 投标须知。
- (2) 合同通用条款和专用条款。
- (3) 技术规范与要求。
- (4) 投标文件格式。
- (5) 施工图纸。
- (6) 工程量清单。
- 2. 施工投标书(技术标部分)内容
- (1) 编制依据。
- (2) 管理目标。
- (3) 工程概况。
- (4) 施工安排。
- (5) 施工准备。
- (6) 本工程关键部位施工技术方案。
- (7) 质量保证措施。
- (8) 安全保证措施。
- (9) 文明施工、环保措施。
- (10) 工期保证措施。
- (11) 技术管理措施。
- (12) 合理化建议。
- (13) 附件。

2.4.2 勘察、设计、施工、监理等各种合同文件

合同文件由建设单位分别与勘察、设计、施工、监理单位协商签订而成,并到建设主 管部门备案。

知识链接

施工合同文件应能相互解释, 互为说明, 除专用条款另有约定外, 组成合同文件及优 先解释顺序如下。

- (1) 本合同协议书。
- (2) 中标通知书。
- (3) 投标书及其附件
- (4) 本合同专用条款。
- (5) 本合同通用条款。
- (6) 标准、规范及有关技术文件
- (7) 图纸。
- (8) 工程量清单
- (9) 工程报价单或预算书

合同履行中,发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的 组成部分

2.5 开工审批文件

2.5.1 建设工程规划许可文件

办理建设工程规划许可证(图 2.1 和图 2.2)应当提供下列材料。

- (1) 《建设工程规划申请书》。
- (2) 已核发的《建设用地规划许可证》及附图复印件。
- (3) 国上主管部门出具的《土地使用权证》或者土地使用意见。
- (4) 符合规划审批要求的地质勘测报告、建筑(市政)测量图、建筑(市政)设计方案(建筑 平面、立面、剖面及效果图)及设计单位的资质证书复印件。
 - (5) 其他相关部门出具的书面审查意见。
 - (6) 其他有关申报材料。
 - ① 非国有投资的建设项目,还应当提供建设项目资金法定证明。
 - ② 个人自用建设项目还应当提供申请人身份证和户口簿原件及复印件。
 - ③ 市政管线工程还应当提供符合规划审批要求的管线施工图。



中华人民共和国

××集团开发有限公司

建設单位

建设工程规划许可证

第4 ×××一部減少一0008

根据《中华人民共和国城市规划法》第三十二条规定, 经审

定,本建设工程符合城市规划要求,准予建设。

特发此证



遵守事项:

- 、本证是城市规划区内, 经城市规划行政主管部门中运, 许可建设各类 1 程的法律凭证。
- 二、凡未取得本而成不放本市规定进行建设。均属违法建设。二、本经及市机关户可,本面的各项规定均不得和高变更。四、建设、程施、明问、根据城市规划行攻上管部门的要
- 来,建设单位有义务厕时将本证规交准验。 近,本证所清解图与附件由发证机次依法确定,与本证从有 等法律效力。

发证机关 日 期



××-规律字-0008

1	造价/元	备注
×× L程 25 598 20 3 69.8 1 框剪	50 000 00	

抄送单位: XXXX

建设单位: ××集团开发有限公司

承建单位: ××××

说明:

- 1. 本附件与《建设工程规划许可证》具有同等效力。
- 2. 遵守事项见《建设工程规划许可证》。

图 2.2 建筑工程规划许可证(附件)

特别提示

建设工程规划许可证及附件注意事项如下。

- (1) 本工程放线完毕、请通知测绘、规划部门验线无误后方可施工
- (2) 有关消防、绿化、交通、环保、市政、文物等未尽事宜。应由建设单位负责与有 关主管部门联系, 妥善解决
- (3) 设计责任由设计单位负责。按规定允许非正式设计单位工程,其设计责任由建设 单位负责。
- (4) 本《建设工程规划许可证》及附件发出后 因年度建设计划变更或因故未建满两 年者,《建设工程规划许可证》及附件自行失效,需建设时,应向审批机关重新申报,经审 核批准后方可拖工。
- (5) 按规定应编制竣工图的工程必须按照国家编制竣工图的有关规定编制竣工图。送 城市建设档案馆。

2.5.2 建设工程施工许可证

申领建筑工程施工许可证应当提供下列材料。

- (1) 规划建设用地许可证和经上地管理部门车审的上地证(复印件)。
- (2) 建设工程规划许可证(复印件)。
- (3) 需要拆迁的, 其拆迁进度符合施工要求。
- (4) 建设工程质量注册登记表和建设工程质量监督书(原件)。
- (5) 施工安全生产监督申报书(原件)。
- (6) 经过建设主管部门备案的施工合同(原件)。
- (7) 监理合同(原件)。
- (8) 中标通知书和招标备案表(原件)。
- (9) 施工企业安全生产许可证(复印件)。
- (10) 施工图设计文件审查合格书和施工图审查备案表(原件)。
- (11) 八大员及项目经理证书,项目经理和安全员安全考核证书(原件并压证上岗,如果 外聘还须原单位的解聘书和现单位的聘书。项目经理应与施工企业投标书一致)。
- (12) 资金审计证明(建设工期不足一年的到位资金,不得少于工程合同价的 50%,建设 工期超过一年的到位资金,不得少于工程合同价的 30%),房地产开发企业项目资本金需达 到 35%。
 - (13) 工程建设合同担保。
 - (14) 施工组织设计。
 - (15) 经施工图审查机构审核的施工图。
 - (16) 安全防护、文明施工措施费用支付合同。
 - (17) 流动人口计划生育合同书,外省、外地建筑施工企业须提供流动人口婚育证明。
 - (18) 工程建设项目廉政责任书、工程监理廉政责任书。
 - (19) 建设工程内部运行表。
 - (20) 建筑施工许可证申请表。

特别提示

- 1 工程投資額在30万元以下或建筑面积在300m²以下的建筑工程可不申领建筑工程 施工许可证。
- 2. 所有提供材料的复印件须提供原件审核、复印件须加盖建设单位公章,注明"与原件一程"。

《建设工程施工许可证》范例如图 2.3 所示。

中华人民共和国

建设工程施工许可证

缩毕 指×××××××

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定,经审 本建设工程符合施工条件, 准予施工。 何,

合同升工川期

K.

4 500万元

合国分降

21 000m² XX KIN

> 建设规模 设计单位

施工单位 仍当極別

XX中XXXXXXXXXX ××建筑设计院有限公司 ××建筑工程有限公司 ××市作理公司

××朱国公司

建设单位 7 程名縣 建设地址

注意事项:

特发此证

- 一、本证放置施1.现场,作为准予施1.的凭证。
- 二、未经发证机关许可, 本证的各项内容不得变更 建设行政上管部门可以对本证进行存验。
- 本证自核发之目起1个月内应予施工,逾期应办理延期 手续, 不办理延划或延划次数、时间超过法定时间的, 本证自行废止。 É
- 凡未取得本证擅自施!的属违法建设,将按《中华人民 具和国建筑法》的规定子以处罚。

发证机关

年 月 華田

图 2.3 建设工程施工许可证(范例)

建筑工程资料管理(第二版)

特别提示

办理建设工程规划许可证应当提供下列材料

- (1)《建设工程规划申请书》。
- (2) 已核发的《建设用地规划许可证》及附图复印件。
- (3) 国土主管部门出具的《土地使用权证》或者土地使用意见。
- (4)符合规划审批要求的地质勘测报告、建筑(市政)测量图、建筑(市政)设计方案(建筑平面、立面、剖面及效果图)及设计单位的资质证书算印件
 - (5) 其他相关部门出具的书面审查意见。
 - (6) 其他有关申报材料
 - ① 非国有投资的建设项目,还应当提供建设项目资金法定证明
 - ② 个人自用建设项目还应当提供申请人身份证和户口簿原件及复印件
 - ③ 市政管线工程还应当提供符合规划审批要求的管线施工图。

2.6 工程造价文件


工程准备阶段文件中的工程造价文件是由工程投资估算材料、工程设计概算材料、招标控制价格文件、合同价格文件、结算价格文件等组成的。特别说明文件的形成责任单位如下。

- (1) 工程投资估算材料,由建设单位委托工程告价咨询单位形成。
- (2) 丁程设计概算材料,由建设单位委托工程造价咨询单位形成。
- (3) 招标控制价格文件:由建设单位委托工程造价咨询单位形成。
- (4) 合同价格文件:由合同双方形成。
- (5) 结箕价格文件,由合同双方形成。

2.7 工程建设基本信息

工程建设基本信息主要包括: 工程概括信息表、建设单位工程项目负责人及现场管理 人员名册、监理单位工程项目总监及监理人员名册、施工单位工程项目经理及质量管理人 员名册。

(小 结)

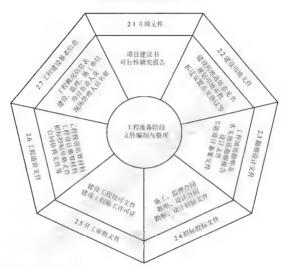

能力拓展

- 1. 依据章前学习要求。画出工程准备阶段文件的组成结构图。
- 2. 依据资料员的岗位职责要求,进行工程准备阶段文件的收集、整理并按规范移交
- 3. 依据工程准备阶段文件形成流程图,复制并添画出工程前期和竣工期间建设单位应归档的文件名称。
 - 4. 对应章前学习要求,填写学习效果自我检测记录表。

学习效果自我检测记录表

层次 领域		#-#		* *		
理论认知	了解		这川		综合	-
岗位技能	模仿		应用		创造	
职业情感	激情		心境		热情	

5. 学习过程中,不仅要注重沟通表达能力训练,强化团队合作意识,更要加强个人工程实践经验的积累 伴随着理论知识学习,自觉记录课后实践将促进职业能力提升

课后实践记录表

ALIA SERGIOGENIA				
实 践 分 项	时 间 段	实践要点	见证人及联络方式	
E地考察		1.程名称、 E程所在地		
沟通能力训练		沟通对象、沟通内容、沟通效果		
内业资料管理		收集、分类、整理、立卷、归档		
小组合作学习		分工负责情况及合作成效		
实践中遇到的问题		视具体填写, 着眼于发现问题、分析 问题及解决问题		
其他				

第3章 工程监理资料编制与整理

学习要求

资料员应知	资料员应会	职业素养
	1. 会进行监理资料分类、归档 2. 依据事实, 规范填写监理通用表 3. 及时传网、收发、登录监理资料 4. 能设计并填写监理资料检索目录 5. 能够检查监理资料的止误 6. 规范办理监理资料移交	具备认真负责、一丝不苟的3 作态度, 具备有效沟通的能力 具备团结协作的能力

学习性工作任务

工程背景

日岡职业技术学院实验实成榜、位于日岡职业技术学院校园西北区、由日照市建筑规划设计院设计、分为A、B、C 三个功能区、其中A 区由日照市西湖建筑工程有限责任公司施工、山东省监理协会建设监理中心实施监理

谈工程 A 区为 4 层框架结构,由于大型实验设备的需要、钢筋混凝土柱框架具有间距大、接层高、独立基础承载力大等特点,再加上室内外装修标准高,水、电、暖、卫等基本设施配套齐全,电视、网络、申诉签架修建维系统索等。无论对于施工单位还是监理单位都提出了较高要求

工作准备

每小相准备统一的档案盒 6 个、分别的档管理、监理文件 B1~B6、监理工程资料管理相应表格若干、A4 活动页纸张若干、图纸 1 套。

工作任务

- 结合工程背景提供的信息、模拟该建筑工程在各栋工阶段监理资料管理内容。完成从下任务
- (1) 依据现行的工程资料管理行业标准、制定资料管理制度、明确责任
- (2) 以小组为单位、分工合作完成某一分部工程监理资料、形成一套模拟资料立卷展示

教学建议

教而根据周边建筑实际情况及已有完整工程证料状态、灵活布置各小组学习任务、以"不富同、又能 完整域学习工程业理请科管理"为准则、采用"在数中学"的职业教育理念,充分调动学生的学习主动性、 提高榜误的有效性。

🕰 引例

工程监理資料管理是指監理单位受建设单位的委托,在其进行益理工作期间,对工程建设实施过程中 所形成的与益理相关的资料进行收集积累、加工整理、组卷归精和检索利用等一系列工作 通常总益理工程序是益理资料的主要负责人、并安排专门资料员具体管理监理资料

建设工程监理资料的主要内容包括: 监理资料的收发与登录、监理资料的传阅及发文、监理资料的分类存放、管理资料的债例,更改与作废。

本章提供一套工程监理通用表, 資料填写来原于日照职业技术学院实验实训楼工程实际状况, 资料供 学生观摩、分析、讨论

○ 思考

- 1. 设计监理资料收发与登录表时应注意哪些信息?
- 2. 如何保障益理资料的及时传阅与存放?
- 3. 监理资料发文的依据有哪些?
- 4. 监理资料组券与施工资料组券有何联系与区别?
- 5. 为方便监理资料的使用、应建立怎样的检索目录?
- 6. 监理资料的更改与作废有何规定?

知识链接

太童按照施工阶段工程监理的任务和主要控制环节将工程监理资料划分为监理管理文 件, 讲摩控制文件, 质量控制文件, 造价控制文件, 工期管理文件及监理验收文件 6 个方 面 为了更好地理解各种监理资料的概念、资料表格样式及相应资料填写要求等,建议学 习《建设工程监理规范》(GB 50319-2013)和《建筑工程文件归档规范》(GB/T 50328-2014)。

\$ 特别提示





【标准规范】

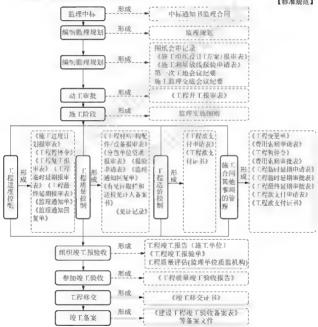


图 3.1 工程监理资料形成流程图

3.1 监理管理文件

监理管理文件主要有: 监理规划、监理实施细则、监理月报、监理会议纪要、监理 工作日志、工作联系单、监理通知单、监理通知回复单、工程暂停令、工程复工报审表 等内容。

3.1.1 监理规划

监理规划是监理单位接受业主委托监理合同之后,在总监理工程师的主持下,根据委托监理合同,在监理大纳的基础上,结合工程的具体情况,广泛收集工程信息和资料的情况下编制,经监理单位技术负责人批准,用来指导整个项目监理机构全面开展工作的指导性文件。

- (1) 监理规划的编制应针对工程的实际情况,明确项目监理机构的工作目标,确定具体的监理工作制度、内容、程序、方法和措施,并应具有可操作性。
 - (2) 监理规划应包括以下主要内容。
 - ① 工程概况。
 - ② 监理工作范围、内容、目标。
 - ③ 监理工作依据。
 - ④ 项目监理机构的组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责。
 - ⑤ 监理工作制度。
 - ⑥ 工程质量控制。
 - ⑦ 工程造价控制。
 - ⑧ 工程讲度控制。
 - ⑨ 安全生产管理的监理工作。
 - (ii) 合同与信息管理。
 - ① 组织协调。
 - ② 监理工作设施。

3.1.2 监理实施细则

监理实施细则是根据监理规划由专业监理工程师编写,并经项目总监理工程师审批, 针对工程项目中的某一专业或某一方面指理工作的可操作性文件。

监理实施细则应包括下列主要内容。

- (1) 专业工程特点。
- (2) 监理工作流程。

- (3) 监理工作要点。
 - (4) 监理工作方法及措施。

3.1.3 监理月报

监理月报是指项目监理机构就工程实施情况和监理工作定期向建设单位和本监理单位 所做的报告。

监理月报由项目总监理工程师组织各专业监理工程师编写, 监理月报包括内容见 表 3-1(范例)。

表 3-1 ××学院实验实训大楼 A 区监理月报(范例)

	编号: C4-00
01 期	
××年×月×日一××年×月×日	
内容提要:	
监理公司就该工程质量控制、进度控制、造价控制及合同信息管理简要报告	
一、工程形象进度完成情况	
1. 本月实际完成情况与计划进度比较	
2. 对进度完成情况及采取措施效果的分析	
二、工程签证情况	
1. 工程进度签证	
2. 工程质量签证	
3. 工程造价签证	
三、本月工程情况评述	
1. 工程质量情况分析	
2. 工程计量与工程款支付	
3. 合同变更及工程延期	
四、本月监理工作小结	
1. 对本月进度、质量、工程数支付等方面情况的综合评价	
2. 本月监理工作情况	
3. 有关本工程的意见和建议	
五、下月监理 工作打 算	
为保证工程质量、进度、造价所采取的措施计划	
其他:	
详细信息见附件	
项目监理机构(章): ××监理协会建设监理中心	
总监理工程师: ×××(手签)	

3.1.4 监理会议纪要

监理会议纪要指由项目监理机构主持的会议纪要,它包括 E地例会纪要和专题会议纪要。

- ① 检查上次例会议定事项的落实情况,分析未完事项原因。
- ② 检查分析工程项目进度计划完成情况,提出下一阶段进度目标及落实措施。
- ③ 检查分析工程项目质量状况,针对存在的质量问题提出改进措施。
- ④ 检查工程量核定及工程款支付情况。
- ⑤ 解决需要协调的有关的事项。
- ⑥ 其他有关事官。
- (2) 专题会议是为解决施工过程中的某一问题而召开的不定期会议,会议应有主要议题。
- ① 主要议题应简明扼要地写清楚会议的主要内容及中心议题(即与会各方提出的主要事项和意见)。
- ② 解决或议定事项应写清楚会议达成的一致意见、下步工作安排和对未解决问题的处理意见。
 - (3) 会议纪要由项目监理机构起草,与会各方代表签字。
 - (4) 监理会议纪要常见格式见表 3-2。

表 3-2 监理会议纪要

各与会单位:				
现将	 会议纪要印		:议纪要正文 目监理机构(章): 监 理 工 程 师: 期:	
会议地点		会议时间		
组织单位		主持人		
会议议题				
各与会单位及人 员签到栏	与会单位		与会人员	

3.1.5 监理工作日志

监理工作日志是项目监理机构在监理工程施工期间每日记录气象、施工记录、监理工作及有关事项的日志。



- (1) 施工记录: 指施工人数、作业内容及部位, 使用的主要施工设备、材料等: 对主 要的分部、分项工程开工、完工做出标记。
 - (2) 主要事项记载, 指记载当日的下列监理工作内容和有关事项。
 - ① 施工过程巡视检查和旁站监理、见证取样送检。
 - ② 施工测量放线、工程报验情况及验收结果。
 - ③ 材料、设备、构配件和主要施工机械设备进场情况及进场验收结果。
 - ④ 施厂单位资料报审及审查结果。
 - ⑤ 施工图交接、工程变更的有关事项。
 - ⑥ 所发监理通知单(书面或口头)的主要内容及签发、接收人。
 - ⑦ 建设单位、施工单位提出的有关事官及处理意见。
 - 图 工地会议议定的有关事项及协调确定的有关问题。
 - ⑨ 工程质量事故(缺陷)及处理方案。
 - ⑩ 异常事件(可能引发索赔的事件)及对施工的影响情况。
 - ① 设计人员到工地及处理、交代的有关事宜。
 - ② 质量监督人员、有关领导来工地检查、指导工作情况及有关指示。
 - (3) 其他重要事项。
- (3) 监理工作目志应使用统一制式的《监理工作目志》,每册封面应标明工程名称、册 号、记录时间段及建设单位、设计单位、施工单位、监理单位名称、并由总监理工程师签 字。常见格式见表 3-3(范例)。

表 3-3 监理工作日志(范例)

编号: D1-001

上午(曜、阴、雨、雪) ××年10月7日,星期一,气温最高25℃ 与磁 下午(晴、陽、雨、雪)

工程名称 入入 点理人员动态.

- - (1) 上午总监理工程师×××来工地巡视检查
 - (2) 7:30 至 11:30 由×××进行委站监理
 - (3) 11:30 至 19:00 由×××进行旁站监理

施工情况及存在问题:

- 基础混凝土进行浇捣(上午7:30~晚上19:00)。采用商品C40S8 混凝土。4 模摄动棒摄捣。现场 有施工员 1 名、质量员 1 名、班长 1 名 施工作业人员 15 名。完成的混凝土数量共有 395m3、施工情况 正常, 留置试块 4 组, 抗渗试块两组, 同条件养护试块一组
 - (2) 因晚上预报小雨, 为防止混凝土表面的外观质量受影响, 与施工人员沟通做好防雨措施

高理工作内容及问题处理情况:

- (1) 在基础混凝土浇捣过程中实行旁站监理、具体详见旁站记录
- (2) 因晚上预报小雨、督促施工单位做好防雨措施

其他:

对施工现场进行了巡视检查,一机一闸一保到位。施工作业人员安全帽配戴齐全

×××、×××、×××(手签) 松理人员

特别提示

监理工作日志可分为专业监理工程师的监理工作日志和监理员的监理工作日志,专业监理工程师的监理工作日志主要记录当日主要的施工和监理情况,而监理员的监理工作日志则记录当日的检查情况和发现的问题 监理人员应及时填写监理工作日志并签字、不得补记、不得隔页或址页。以保持其原始记录。

3.1.6 工作联系单

工作联系单是指在施工过程中,与监理有关的各方工作联系用表。即与监理有关的某一方需向另一方或几方告知某一事项,或督促某项工作,或提出某项建议等,对方执行情况不需要书面回复时均用此表。

- (1) 监理联系事项主要包括如下内容。
- ① 工地会议时间、地点安排。
- ② 建设单位向监理机构提供的设施、物品及监理机构在监理工作完成后向建设单位移 变设施及剩余物品。
 - ③ 建设单位及施工单位就本工程及本合同需要向监理机构提出保密要求的有关事项。
- ④ 建设单位向监理机构提供与本工程合作的原材料、构配件、机械设备生产厂家名录, 以及与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。
 - (5) 按《建设单位委托监理会同》监理单位权利中需向委托人书面报告的事项。
 - ⑥ 监理单位调整监理人员;建设单位要求监理单位更换监理人员。
 - ⑦ 监理费用支付通知。
 - ⑧ 监理机构提出的合理化建议。
 - ⑨ 建设单位派驻及变更施工场地履行合同的代表姓名、职务、职权。
- ⑩ 紧急情况下无法与专业监理工程师联系时,项目经理可采取保证人员生命和财产安全的紧急措施, 在采取措施后 48 小时内向专业监理工程师提空的报告。
 - ① 对不能按时开工提出延期开工理由和要求的报告。
- ② 实施爆破作业、在放射毒害环境中施工及使用毒害性、腐蚀性物品施 L, 施工单位 在施工前 14 天以内向专业监理工程师提出的书面通知。
- ③ 可调价合同发生实体调价的情况时,施工单位向专业监理工程师发出的调整原因、 金额的意向通知。
 - 4 索赔意向通知。
 - ⑤ 发生不可抗力事件,施工单位向专业监理工程师通报受害损失情况。
 - (6) 在施工中发现的文物、地下障碍物向专业监理工程师提出的书面汇报。
 - ① 其他各方需要联系的事宜。
 - (2) 工作联系单格式见表 3-4(范例)。

表 3-4 工作联系单(范例)

编号: C1-001

××监理协会建设监理中心

事由:

设计交底和用纸会审

内容:

我方已与设计单位商定于××年×月×日进行本工程设计交底和图纸会审工作、请告方做好有关准 各工作

> 发文单位: ××学院 负责人(签字): ××× 日期: ××××年×月×日

特别提示

工作联系单有关单位各存一份。施工过程中、与监理有关各方进行工作联系的用表。 即与监理有关的某一方需向另一方或几方告知某一事项或督促某项工作、提出某项建议等。 对方执行情况不需要书面回复时均用此表

3.1.7 监理通知单

在监理工作中,项目监理机构按委托监理合同授予的权限和国家有关规定,对施工单 位所发出的指令提出的要求,除另有规定外,均应采用《监理通知单》。监理工程师现场发 出的口头指令及要求,也应采用此表予以确认。

监理通知单的内容, 施工单位应认真执行, 并将执行结果用《监理通知回复单》报监 理机构复核。

监理通知单常见格式见表 3-5(范例)。

表 3-5 监理通知单

程名称: ××实验实训楼 A 区	編号: /	A3-0
: ××建筑工程有限责任公司	(施工项目经理部)	
事由: 柱内钢筋骨架验收中发现	现问题整改	
内容:		
1. 柱内主筋搭接长度不足的应补品	₹.	
2. 箍筋间距不对的应纠正		
3. 柱内主筋电弧焊长度不足的应剂		
	off for this own for his a six six a part of the source of the source of	
	项 目 监 理 机 构 (盖 章); ××监理协会建设监:	理甲
	总/专业监理工程师(签字): ××	
	日期、マンマン年6日7日	

注:本表一式三份,项目监理机构,建设单位,施工单位各一份。

4 特别提示

《工作联系单》与《监理通知单》的主要区别在于:《工作联系单》不需要对方书面回 复执行情况,而《监理通知单》需要施工单位将执行结果用《监理通知回复单》报监理机 构复核。

3.1.8 监理通知回复单

监理通知回复单是指监理单位发出监理通知单,施 L单位对《监理通知单》执行完成 后,报项目监理机构请求复查的回复用表。施 L单位完成《监理通知回复单》中继续整改 的工作后,仍用此表回复。

- (1)"我方收到编号为_____":填写所回复的《监理通知单》的编号。
- (2)"完成了_____工作":按《监理通知单》要求完成的工作填写。
- (3) 详细内容:针对《监理通知单》的要求,简要说明落实过程、结果及自检情况,必要时附有关证明资料。
- (4) 复查意见:专业监理工程种应详细核查施工单位所报的有关资料,符合要求后针对工程质量实体的缺陷整改进行现场检查,符合要求后填写"已按《监理通知单》整改定毕/经检查符合要求"的意见。如不符合要求,应具体指明不符合要求的项目或部位,签署"不符合要求,要求施工单位继续整改"的意见。

监理通知回复单格式见表 3-6(范例)。

表 3-6 监理通知回复单(范例)

L程名称: ××实验实训楼 A 区

编号: B9-001

致: ××监理协会建设监理中心

我方核到编号为 A3-001 的监理通知单后,已按要求完成相关柱内钢筋骨架工程验收中发现问题的 整改工作。现报上,请予以复查。

附件:需要说明的情况

- 1. 柱内主筋搭接长度已补足焊牢。
- 2. 输筋间距不对的已纠正。
- 3. 柱内主筋电弧焊长度不足的已补焊。

施工项目经理部(盖章): ※×建筑工程有限责任公司 项 目 经 理 (签 字): ×××

××××年6月9日

复查意见:

经复查已按 A3-001 监理通知单中的内容整改完毕

项 目 监 理 机 构 (盖 章): ××监理协会建设监理中心 总监理工程师/专业监理工程师(签字): ×××

××××年6月9日

注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

3.1.9 工程暂停令

总监理工程师下达工程暂停令前,宣向建设单位报告。施工过程中发生了需要停工处理事件,总监理工程师签发停工指令。

- (1) 工程暂停指令,总监理工程师应根据暂停工程的影响范围和影响程度,按照施工合同和委托监理合同的约定签发。
- (2) 工程暂停原因若由施工单位的原因造成的,施工单位申请复工时,除了填报"工程复工报审表"外,还应报送针对导致停工原因所进行的整改工作报告等有关材料。
- (3) 工程暂停原因若由非施工单位的原因造成的,也就是建设单位的原因或应由建设单位承担责任的风险或其他事件时,总监理工程师在签发工程暂停令之后,应尽快按施工合同的规定处理因工程暂停引起的与工期、费用等有关问题。
 - (4) 由于_____原因: 应简明扼要地准确填写工程暂停原因。

工程暂停令表见表 3-7(范例)。

表 3-7 工程暂停令(范例)

L程名称: ××学院实验实训楼 A 区

编号: A05-003

致: ××建筑工程有限责任公司

在本工程外部脚手架拆除过程中贯方管理人员不到位,存在严重安全瘾想原因,现通知你方于×× 年 12 月 29 日 8 00 时起,暂停对本工程的外部脚手架拆除(工序)施工,并按下述要求做好前续工作。

要求: 1. 落实做好管理人员的到位工作。

2. 再次认真落实脚手架拆除的安全技术交底工作。

项目监理机构(盖章): ××监理协会建设监理中心 总监理工程师(签字、加盖执业印章): ××× ××××年12月29日

注, 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

3.1.10 工程复工报审表

此表用于工程暂停原因消失时,施工单位申请恢复施工。总监理工程师签署审查意见 前,宣向建设单位报告。

- (1)当工程暂停原因是由施工单位的原因引起时,表中"附件"系指施工单位提交的整改情况和预防措施; 几程暂停原因是由非施工单位的原因引起时,表中"附件"系指施工单位提交的工程暂停原因消失证明。
- (2) 审查意见:总监理工程师应指定专业监理工程师对复工条件进行复核,在施工合同约定的时间内完成对复工申请的审批,符合复工条件的注明同意复工的时间;不符合复工条件的注明不同意复工的原因和对施工单位的要求。

工程复工报审表格式见表 3-8(范例)。

表 3-8 丁程复丁报审表(范例)

L程名称: ××学院实验实训楼 A 区

编号: B03-2-003

致; (项目监理机构)

编号为 A05-003 的 L程暂停令所停 L的 外部脚手架拆除 部位(L序)

已满足复工条件, 我方申请于×× 年 12 月 31 日复工, 请予以审批。

附件: 证明文件资料

具备复工条件的情况说明。

施 [项目经理部(盖章): ××建筑工程有限责任公司

项目经理(签字》:XXX

××××年12月30日

亩核音原.

经审查具备复工条件, 同意×× 建筑工程有限责任公司于××××年 12 月 31 日 8:00 时复工

项目监理机构(盖章): ××监理协会建设监理中心 总监理工程师(签字): ×××

××××年12月30日

宙排資原.

同意××建筑工程有限责任公司于××××年12月31日8:00时复工

建设单位(盖章): ××学院

建设单位代表(签字): ×××

××××年12月30日

注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

3.2 进度控制文件

进度控制文件主要有:工程开工报审表、施工进度计划(调整计划)报审表等内容。

3.2.1 工程开工报审表

工程开工报审表用手施工单位申请工程项目开工。

(1) 施工单位应对表中所列 5 项准备工作逐一落实,自查符合要求后在该项"□"内 打"√",同时报送相关证明资料。

(2) 审查意见:总监理工程师应指定专业监理工程师对施工单位的准备情况进行检查,报项目总监理工程师审核;总监理工程师确认具备开工条件时签署同意开工时间,并报告建设单位。否则,应简要指出不符合开工条件要求之处。

工程开工报审表格式见表 3-9(范例)。

表 3-9 工程开工报审表(范例)

L程名称: ××实验实训楼 A 区	编号: B2-001
致: ××学院(建设单位)	
××监理协会建设监理中心 (项目监	理机构)
我方承担的 ××实验实训楼 A 区	□程, 己完成相关准备 □作, 具备开 □条件,
申请于××××年1月28日开工,请予以	以审批。
附件: 证明文件资料	
1. 施工许可证已办理。	N
2. 现场管理人员已到位,专职管理/	人员和特种作业人员已取得资格证、上岗证。
3. 施工现场质量管理检查记录已经标	≙ 查确认。 □
4. 进场道路及水、电、通信等已满足	己 开工要求。
5. 质量、安全、技术管理制度已建立	2,组织机构已落实。 🖸
	施工单位(盖章): ××建筑工程有限责任公司
	项目经理(签字): ×××
审查意见: 经审查上述各项工作已完成且资料齐	日 \
1 Alla tert Part	
1 Alastat Part	全,同意本工程于××××年1月28日开工
1 Alastat Part	全、同意本工程于××××年1月28日开工 项目监理机构(盖章); ××监理协会建设监理中心
1 Justice Part	全、同意本工程于××××年1月28日开工 项目监理机构(盖章): ××监理协会建设监理中心 总监理工程师(签字、加盖执业印章): ×××
经审查上述各項工作已完成且資料界	全、同意本工程于××××年1月28日开工 项目監理机构(盖章);××监理协会建设监理中心
1 Justice Part	全、同意本工程于××××年1月28日开工 项目监理机构(盖章): ××监理协会建设监理中心 总监理工程师(签字、加盖执业印章): ×××
经审查上述各项工作已完成且责料齐 即批意见:	全、同意本工程于××××车1月28日开工 项目監理机构(盖章); ××监理协会建设监理中心 总监理工程师(签字、加盖执业印章); ××× 日期; ××××年1月27日
经审查上述各项工作已完成且责料齐 审批意见:	全、同意本工程于××××年1月28日开工 项目监理机构(盖章): ××监理协会建设监理中心 总监理工程师(签字、加盖执业印章): ×××
经审查上述各項工作已完成且責料养 审批意见:	全、同意本工程于××××车1月28日开工 项目監理机构(盖章): ××监理协会建设监理中心总监理工程师(签字、加蓝执业印章): ××× 日期: ××××年1月27日
经审查上述各項工作已完成且責料养 审批意见:	全、同意本工程于××××车1月28日开工 项目監理机构(盖章): ××监理协会建设监理中心总监理工程师(签字、加蓝执业印章): ××× 日期: ××××年1月27日
经审查上述各項工作已完成且資料齐 审批意见:	全、同意本工程于××××车1月28日开工 项目监理机构(盖章): ××监理协会建设监理中心总监理工程师(签字、加盖执业印章): ××× 日期: ××××年1月27日
经审查上述各项工作已完成且责料齐 审批意见:	全、同意本工程于××××车1月28日开工 项目监理机构(盖章): ××监理协会建设监理中心总监理工程师(签字、加盖执业印章): ××× 日期: ××××年1月27日
经审查上述各项工作已完成且责料齐 审批意见:	全、同意本工程于××××年1月28日开工 项目监理机构(盖章); ××监理协会建设监理中心 总监理工程师(签字、加盖执业印章); ××× 日期; ××××年1月27日

注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

★别提示

如林个项目一次开工 只填招一次,如工程项目中游及转多单位工程 目开工时间不 同. 则每个单位工程开工都应填报一次。

施工单位应对表中所列项目准备工作逐一落实,自奋符合要求后在该项"□"内打"√"。 同时报送相关证明资料。

对具备开工条件的工程、总监理工程师签署意见中应明确开工日期。

3.2.2 施工进度计划报审表

施工进度计划报审表是施工单位根据已批准的施工总进度计划,按施工会同约定或监 理工程师要求,编制的施工讲度计划报项目监理机构审查、确认和批准。

- (1) 施工进度计划表。根据监理机构批准的施工组织设计(方案)。结合工程的大小、规 模等情况, 施工单位应分别编制按合同工期目标制订的施工总进度计划, 按单位工程或按 施工单位划分的分目标。按不同计划期4年、季、月制订的施工进度计划进行报审。
 - (2) 对施工讲度计划, 主要讲行如下审核。
- ① 讲度安排是否符合工程项目建设总讲度,计划中总目标和分目标的要求,是否符合 施工合同中开、竣工日期的规定。
- ② 施工总进度计划中的项目是否有遗漏,分期施工是否满足分批动用的需要和配套动 用的要求。
 - ③ 施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求。
- ④ 劳动力、材料、构配件、施工机具及设备、施工水电等生产要素的供应计划是否能 保证进度计划的实现,供应是否均衡、需求高峰期是否有足够能力实现计划供应。
- (5) 由建设单位提供的施厂条件(资金、施厂图纸、施厂场地、采购供应的物资设备等)。 施工单位在施工讲度计划中所提出的供应时间和数量是否明确、合理。是否有造成建设单 位违约而导致工程证期和费用素赔的可能。
 - ⑥ 丁期是否进行了优化, 讲度安排是否合理。
- ⑦ 总、分包单位分别编制的各单项工程施工进度计划之间是否相协调,专业分工与计 划衔接是否明确合理。

施工进度计划(调整计划)报审表格式见表 3-10。

♣ 特别提示

月进度计划审核表施工单位项目经理部应提前5日提出、一般为每月25日申报。

表 3-10 施工进度计划(调整计划)报审表

上程	名称:	編	号: BI
致:	(項目监理机构) 根据施工合同约定,我方己完成 附件:□施工总进度计划 □阶段性进度计划	工程施工进度计划的编制和批准,消予	以审查
		施工项目经理部(盖章): 项 目 经 理 (签 字): 年	月
	审查意见:	1	
		专业监理工程师(签字):	
_	审核意见:	年	月
		项目监理机构(盖章); 总监理工程师(签字);	
		年	月

注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

3.3 质量控制文件

质量控制文件的内容主要有:施工组织设计(专项施工方案)报审表、分包单位资质报 审、实验单位资格报审、施工测量放线报验表、工程材料/构配件/设备报审表、旁站监理 记录、工程报验申请表、工程质量/安全问题(事故)报告单、工程质量/安全问题(事故)技术 处理方案报审表、工程技术文件报审表等内容。

3.3.1 施工组织设计(专项施工方案)报审表

此表用于施工单位报审施工组织设计(专项施工方案)。《建设工程监理规范》5.2.2、5.2.3



中,施工单位对专业性较强的重点部位、关键工序的施工工艺、新工艺、新材料、新技术、 新设备的专项施工方案报审、也采用此表。施工过程中、如经批准的施工组织设计(专项施 厂方案)发生改变、变更后的施厂组织设计(专项施厂方案)报审时、也采用此表。

(1) 专业监理工程师审查意见:专业监理工程师对施工组织设计(方案)应审核其完整 性、符合性、适用性、合理性、可操作性及实现目标的保证措施。

如符合要求, 专业监理工程师审查意见应签署"施工组织设计(方案)合理、可行, 目 审批 F续齐全,拟同意施工单位按该施工组织设计(方案)组织施工,请总监理工程师审核"。 如不符合要求,专业监理工程师审查意见应简要指出不符合要求之处,并提出修改补充意 见后签署"暂不同意(部分或全部应指明)施工单位按该施工组织设计(方案)组织施工, 待修 改完善后重报,请总监理工程师审核"。

(2) 总监理工程师审核意见: 总监理工程师对专业监理工程师的结果进行审核,如同 意专业监理工程师的审查意见,应签署"同意专业监理工程师审查意见,同意(或不同意) 施工单位按该施工组织设计(方案)组织施工";如不同意专业监理工程师的审查意见,应简 要指明与专业监理工程师审查意见中的不同之外, 签署修查意见, 并签认最终结论"同意(不 同意)施工单位按该施工组织设计(方案)组织施工(修改后再报)"。

施工组织设计(专项施工方案)报审表常见格式见表 3-11(范例)。

表 3-11 施工组织设计(专项施工方案)报审表(范例)

工程名称: ××学院实验实训楼 A 区、\ `、` 编号: B1-001 致: ___××监理协会建设监理中心____(项目监理机构) 我方己完成 ××学院实验实训楼 A [X] 程施工组织设计/(专项)施工方案的编制和审批, 语予以 审查。 附件, 网施工组织设计 口专琼施工方家 口施工方案 施工项目经理部(盖章): ××建筑工程有限责任公司 项目经理(签字): ××× ××××年1月20日 审查意见:

- 1. 施工进度计划中总工期经计算为 336 天, 与合同要求的工期 330 天不符, 请予调祭
- 2. 设计要求的"静音防尘地板"在施工方案及施工进度计划中未体现出来
- 3. 由于现场施工条件是学生正常开课时间。相应安全防范措施应设计详细到位

专业监理工程师(签字): ××× ××××年1月23日

结表

宙核音贝.

- 1. 同意专业监理师的审查意见
- 2. 尚应补充设计要求的"静音防尘地板"在施工方案及相应施工进度计划
- 3. 在上述各项不足之处调整完成后同意本施工组织设计

项目监理机构(盖章): ××监理协会建设监理中心 总监理 [程师(签字、加盖执业印章): ×××

××××年1月23日

审批意见(仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案)

建设单位(盖章); 建设单位代表(签字);

××××年 × 月 × 日

注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

3.3.2 分包单位资格报审

- 1. 对分包单位资格应审核的内容
- (I) 分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证、国外企业在国内承包工程许可证。
 - (2) 分包单位的业绩。
 - (3) 拟分包工程的内容和范围。
 - (4) 专业管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。
- 监理工程师完成上述审查工作,审查合格后,签发《分包工程申请报告单》,批准分包单位进行工程分包。

2. 分包单位资格报审表格式(表 3-12)

本表由施工单位填报,项目监理机构专业监理工程师审查、总监理工程师签发。分包 单位资格审查由项目监理机构负责。

表 3-12 分包单位资格报审表

L程名称:		编号:
致:		(分包单位)具有承担下列工程的施工
或安装资质和能力,可以保证本工程	程按施工合同第条款的约定;	进行施工或安装。请予以审查。
分包工程名称(部位)	分包工程量	分包工程合同额

6#-#



			狭衣	
	合计			
附件:				
	2. 分包单位业绩材料			
	3. 分包单位专职管理人员和特种作业人员的资格证书			
	4. 施工单位对分包单位的管理制度			
		施工项目经理部(盖章):		
		项目经理(签字):	-	
		年	月	
审查意	见:			
		专业监理工程师(签字);		
		年	月	E
审核意	Я:			
		项目监理机构(盖章):		
		总监理工程师(签字):		
		年	月	- 1

注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

知识链接

建设工程分包与转包的区别

分包是指总承包人将其承包的建设工程的一部分转让给第三人(即分包人)完成 总包 人与发包人签订的建设工程施工合同称为总包合同。总包人与分包人签订的合同为分包合 同。分包合同的标的是总包合同的一部分、分包人与总包人共同对发包人承担连带责任

转包是指承包人在与发包人签订建设工程施工合同后、又将其承包的工程部分或全部 转让给第三人(即转承包人) 转让后,转让人即承包人退出承包关系,受让人即转承包人 成为承包合同的另一方当事人、转让人对受让人的行为不承担责任

分句,与转句,的区别为,转向,中,原承包人即转让人将其承包的工程部分或全部转让给 第三人,而转让人即原承包人不履行原承包合同约定的义务。转包是国家明令禁止的。分 包中、总承包人将其承包的一部分转让给其他人、总包人仍然就总包合同的履行向发包人 负责、



3.3.3 试验单位资格报审

施工单位对其实验室的资质等级及试验范围、法定计量部门对实验室出具的计量检定证明、实验室管理制度、试验人员的资格证书等向监理机构提请资格报审,以确定其是否具有自有实验室或"对外委托"实验室进行资质考核、确认和批复,即为实验室资格报审。

施工单位利用本企业实验室时,应将实验室的资质、实验内容、实验设备的规格、型导、数量及定期鉴定证明、实验室管理制度、试验人员资格证书等有关资料报送监理机构、专业监理工程师审核确认。当一个施工单位的实验室供本单位承建的几个工程项目共用时,只要经查符合实施要求即可视为有工地实验室。当该实验室资质不够、试验项目不全时均应进行外委试验,对外委托项目或试验,施工单位应填写《分包单位资格报申表》,将要委托实验室的营业故职、企业资质等级证书、委托试验内容等有关内容相关监理机构。

1. 实验室宙核

专业监理工程师应从以下5个方面对施工单位的实验室进行审核。

- (1) 实验室的资质等级及其试验范围。
- (2) 法定计量部门对试验设备出具的计量认证认可证明。
- (3) 实验室的管理制度。
- (4) 试验人员的资格证书。
- (5) 本工程的试验项目及其要求。
- 2. 试验单位资格报审表格式(表 3-13)

表 3-13 实验室资格报审表

工程名称:	13.1-1	· 1.	编号:		
	(监理机构) 我与认为拟选择的 上有关资料,请予以审查和批准。	_(实验室)具有与	工程相适应的实验	资质及	试验
			施工项目经理部(盖章); 项目技术负责人(签字); 年	月	E
审核意见:					П
			项目监理机构(盖章); 总监理工程师(签字); 年	月	E



3.3.4 施工控制测量成果报验表

施工测量放线报验分为: 开工前的交桩复测及施工单位建立的控制网、水准系统的测 量, 施工过程中的施工测量放线。

施工单位在测量放线完毕,应进行自检,合格后填写《施工控制测量成果报验表》,并 附上放线的依据材料及放线成果表(基槽及各层放线测量及复测记录),报送项目监理机构。

- (1) 测量放线依据材料及放线成果:依据材料是指施工测量方案、建设单位提供的红 线桩、水准点等材料:放线成果指施工单位测量放线所放出的控制线及其施工测量放线记 录表(依据材料应该是经过项目监理机构确认过的)。
 - (2) 备注: 施工测量放线使用测量仪器的名称、型号、编号。
- (3) 专业监理工程师审查意见,专业监理工程师根据对测量放线资料的审查和现场实 际复测情况签署意见。

施工控制测量成果报验表常见格式见表 3-14(范例)。

表 3-14 施工控制测量成果报验表(范例)

工程名称: ××学院实验实训楼 A 区

编号: B5-001

致: ×× 直理协会建设监理中心 (项目监理机构)

我方己完成××学院实验实训楼基础工程 的施工控制测量, 经自检合格, 请予以查验。

附件: 1、施工控制测量依据资料

2. 施工控制测量成果表

××学院实验实训楼基础工程的轴线位置图及测量数据

施工项目经理部(盖量): ××建筑工程有限责任公司 项目技术负责人(签字): ×××

××××年1月29日

审查意见:

项目监理机构(盖意): ××监理协会建设监理中心 专业监理工程师(签字): ×××

××××年1月29日

注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

3.3.5 工程材料/构配件/设备报审表

工程材料/构配件/设备报审是施工单位对报进场的主要工程材料、构配件、设备,在 自检合格后报项目监理机构进行进场验收。

- (1) 拟用于部位: 指工程材料、构配件、设备拟用于工程的具体部位。
- (2) 材料/构配件/设备清单;应用表格形式填报,内容包括名称、规格、单位、数量、 生产厂家、出厂合格证、批号。复试/检验记录编号等内容。
- (3) 工程材料/构配件/设备质量证明文件:指出厂合格证、复试/检验报告、准用证、商检证等。如无出厂合格证原件,有抄件或原件复印件亦可。但抄件或原件复印件上要注明原件存放单位,抄件人和抄件、复印件单位签名并盖公章。
- (4) 自检结果:指所购材料、构配件、设备的施工单位对所购材料、构配件、设备,按有关规定进行自检及复试的结果。对建设单位采购的主要设备进行开箱检查监理人员应进行见证、并在其《主要设备进行开箱检查记录》上签字。复试报告、般应提供原件。
- (5) 专业监理工程师审查意见:专业监理工程师对报验单所附的材料、构配件、设备 清单、质量证明资料及自检结果认真核对,在符合要求的基础上对所进场材料、构配件、 设备进行实物核对及观感质量验收,查验是否与清单、质量证明资料合格证及自检结果相 符、有无质量缺陷等情况,并将检查情况记录在监理工作目志中,然后根据检查结果,给 由审查意见。

工程材料/构配件/设备报审表常见格式见表 3-15(范例)。

表 3-15 工程材料/构配件/设备报审表(范例)

工程名称: ××学院实验实训楼 A 区

编号: B06-001

致: ××监理协会建设监理中心 (项目监理机构)

F××年1月27日进场的积用于基础工程防水防潮部位的聚乙烯丙纶防水卷材,经我方检验合格, 现象相关资料每上,请予以审查。

附件: 1. 工程材料、构配件或设备清单

- 2. 质量证明文件
- 3. 自检结果

施工项目经理部(盖章): ××建筑工程有限责任公司 项 目 经 理 (答 字): ×××

××××年2月7日

审查意见:

经检查上述材料符合设计文件和规范的要求。准许进场用于基础施工

项目监理机构(盖章): ××监理协会建设监理中心 专业监理工程师(签字): ×××

××××年2月8日

注: 本表 '式两份, 项目监理机构、施工单位各 '份。

3.3.6 旁站监理记录

旁站监理记录是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中,对关键部位、关键工序的施工质量,实施全过程现场跟班的监督活动所见证的有关情况的记录。旁站监理记录格式见表 3-16(范例)。

表 3-16 旁站监理记录(范例)

「程名称: ××学院室验室训楼 A 区

编号: A6-001

关键工序、旁站的关键 部位	基础混凝土工程浇捣	施工单位	××建筑工程有限责任公司
旁站开始时间	××年5月4日7:30	旁站结束时间	××年5月4日19:00

旁站的关键部位、关键 [序施工情况:

基础混凝土工程浇捣

采用商品混凝土,4根摄动棒振擒,现场有施工员1名,质量员1名,班长1名,施工作业人员15名, 完成的混凝土数量共有395m³,施工情况正常 留置诚块4组,抗参诚块2组,同条件养护诚块1组

发现的问题及处理情况:

施工单位未做好防雨措施、督促施工单位做好防雨措施

旁站监理人员(签字): ××× ××××年5月4日

注, 本表一式一份, 项目临理机构留存。

知识链接

《建设工程旁站监理管理规定》中指出房屋建筑工程的关键部位、关键工序包括: 基础工程, 桩基工程、沉井过程、水下混凝土浇筑、承载力检测、独立基础框架、基础土方回填; 结构工程, 混凝土浇筑、施加预应力、施工缝处理、结构吊装; 钢结构工程, 重要部位焊接、机械连接安装; 设备进场验收测试、单机无负荷试车、无负荷联动试车、试运转、设备安装验收、压力容器等; 隐蔽工程的隐蔽过程; 建筑材料的见证取样、送样; 新技术、新材料、新工艺、新设备试验过程; 建设工程委托监理合同规定的应旁站 监理的部位。

特别提示

表 3-16 旁站监理记录为项目监理机构实施旁站监理的通用表式 项目监理机构可根据需要增加附表。

建筑工程资料管理(第二版)

表中"旁站的关键部位,关键工序施工情况"应记录所旁站部位(工序)的施工作业内 窓 主要施工机械, 材料,人员和完成的工程数量等。

表中"发现的问题及处理情况"应记录旁站人员对施工作业情况的监督检查,主要内容包括如下方面。

- (1) 施工单位现场质检人员到岗情况、特殊工种人员持证上岗,以及施工机械、建筑 材料准备情况。
- (2) 在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工,执行施工方案及工程建设强制性标准情况。
 - (3) 核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等
 - (4) 其他需要说明的事项。

关键部位、关键工序未实施旁站监理或没有旁站监理记录的,专业监理工程师或总监 理工程师不得在相应文件上签字 旁站监理记录在工程竣工验收后,由监理单位归档备查。

3.3.7 见证取样、送检记录表

单位工程施工前,项目监理机构应根据施工单位报送的施工试验计划编写见证取样和 送检计划。由总监理工程师指定一名具备见证取样送检资格的监理人员担任见证取样送检 工作,并书面通知施工单位、检测单位和质量监督机构。

在施工过程中, 见证人员按计划对施工现场的取样和送检进行见证, 在试样标志和封 条上签字, 并在监理工作日志中进行记录。

知识链接

《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定如下。

- (1) 对涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定取样数量的30%。
 - (2) 下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检。
 - ① 用于承重结构的混凝土试块。
 - ② 用于承重墙体的砌筑砂浆试块。
 - ③ 用于承重结构的钢筋及连接接头试件。
 - ④ 用于承重墙的砖和混凝土小型砌块。
 - ⑤ 用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥。
 - ⑥ 用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂。
 - (7) 地下, 屋面, 厕浴间使用的防水材料,
 - ⑧ 国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。 见证取样、送检记录表格式见表 3-17。

表 3-17 见证取样、送检记录表

工程名称:	编号:	
样品名称	取样部位	
样品规格	试样数量	
取样时间	代表样本数量	
封样情况检查:		
试样外观检查:		
取样、送检人	日期	

\$ 特别提示

《建筑工程资料管理规程》(JGJ/T 185-2009)规定: 监理单位填写的见证取样和送检见 证人员备案表应一式五份、质量监督站、检测单位、建设单位、监理单位、施工单位各保 存一份

3.3.8 工程报审、报验表

本表是隐蔽工程、检验批、分项工程、分部工程报审、报验通用表。报审、报验时按 实际完成的工程名称填写。

- (1) 工程质量控制资料: 指相应质量验收规范中规定工程验收时应检查的文件和记录, 按规定应见证取样送检的,须附见证取样送检资料。
- (2) 安全和功能检验(检测)报告:指相应质量验收规范中规定工程验收时应对材料及其 性能指标进行检验(检测)或复验项目的检验(检测)报告和《建筑工程施工质量验收统一标 准》中要求的安全和功能检查项目的测试记录,按规定应见证取样送检的,须附见证取样 送检资料。
 - (3) 观感质量验收记录:指分部(子分部)观感质量验收记录。
 - (4) 隐蔽 L 程验收记录: 指相应质量验收规范中规定的隐蔽验收项目的隐蔽验收记录。
- (5) 审查意见: 专业监理工程师对所报隐蔽工程、检验批、分项工程资料认真核查, 确认资料是否齐全、填报是否符合要求,并根据现场实地检查情况按表式项目签署审查意 见,分部工程由总监理工程师组织验收,并签署验收意见。

工程报审、报验表常见格式见表 3-18(范例)。

表 3-18 ××学院实验实训楼基础工程报审、报验表(范例)

T程名称, XX学院字验字训楼 A 区

砂,××监理协会建设监理中心(项目监理机构)

编号 - B7-001

我方已完成××学院实验实训楼基础工程防水工作,经自检合格,请予以审查或验收。

附件, 门跨截工程质量检验资料

口检验批质量检验资料

团分项工程质量检验资料

□施工试验室证明资料

口其他

施 工 项 目 经 理 部 (盖 章): ××建筑工程有限责任公司 项目经理或项目技术负责人(签字); XX

××××年3月4日

审查或验收意见:

所报分项工程的技术资料齐全, 经现场检测, 核杏合格

项目监理机构(盖章): ××监理协会建设监理中心 专业监理工程师(签字): ××

××××年3月5日

注:本表一式两份,项目监理机构、施工单位各一份。

3.3.9 工程质量/安全问题(事故)处理

[程质量/安全问题(事故)资料包括 [程质量/安全问题(事故)报告单和 [程质量/安全 问题(事故)技术处理方案报审表两类。

1. 工程质量/安全问题(事故)报告单

口程质量/安全问题(事故)报告单是施工过程中发生工程质量/安全问题(事故),施工单 位就工程质量/安全问题(事故)的有关情况及初步原因分析和处理方案向项目监理机构报告 时用表。当监理工程师发现工程质量/安全问题(事故)要求施工单位报告时也用此表报告。

- (1) "_____时,在____(部位)发生_____工程质量/安全问题(事故)",分别填写工程 质量/安全问题(事故)发生的时间、工程部位和工程质量/安全问题(事故)的特征。
- (2) 原因、性质或类型、造成损失、应急措施及初步处理意见: 指质量事故发生的原 因的初步判断,一般事故还是重大事故、造成损失的初步估算、事故发生后采取的措施及 事故控制的情况及初步处理方案。

工程质量/安全问题(事故)报告单常见格式见表 3-19(范例)。

工程名称: ××学院实验实训楼 A 区

编号: C4-003

致: ××监理协会建设监理中心

××年8月6日9·00 計 在(3)/6) 三层框架标宏现外观缝窝严重 测其提度严重不足。 (7)工程质量 □安全问题(事故), 现据告如下

- 1. 原因: (初步调查结果及现场情况报告)
- 由于操作工人振捣不均造成
- 2. 性质或类型:

较严重

3. 造成损失:

造成经济损失约3000元

4. 应急措施,

对附近柱强度进行全面检查

5. 初步处理意见:

对该柱的混凝土进行返工重做处理

施工单位(音): ××建筑工程有限者任公司

项 目 经 理, XXX(手祭) 期: ××××年8月7日

H 抄报, 项目监理机构签收,

1. ××建设工程质量监督站。" 2. ××学院

于××年8月7日8:00 时收到

面目监理机构(音), ××监理协会建设监理中心 总监理工程师: ×××(手答)


Н 期: ××××年8月7日

注, 本表一式三份、建设单位、监理单位、施工单位各存、份。

2. 工程质量/安全问题(事故)技术处理方案报审表

厂程质量/安全问题(事故)外理方案报审是施厂单位在对厂程质量事故详细调查、研究 的基础上,提出处理方案后报项目监理机构审查、确认和批复。

- (1) 工程质量/安全问题(事故)调查报告。指施工单位在对工程质量事故详细调查、研究 的基础上提出的详细报告, 一般应包括下列内容, 质量事故情况, 质量事故发生的时间、 地点、事故经过、有关现场的记录、发展变化趋势、是否已稳定等:事故性质:事故原因: 事故评估: 质量事故涉及的人员与主要责任者的情况等。
- (2) 工程质量/安全问题(事故)处理方案。处理方案针对质量事故的状况及原因,应本着 安全可靠、不留隐患、满足建筑物的使用功能要求、技术可行、经济合理。因设计造成的 质量事故, 应由设计单位提出技术处理方案。
- (3) 设计单位意见。指建筑工程的设计单位对工程质量/安全问题(事故)调查报告和处理 方案的审查意见。若与施工单位提出的工程质量/安全问题(事故)调查报告和处理方案有不



同意见应 · 注明, 工程质量/安全问题(事故)技术处理方案必须经设计单位同意。

- (4) 总监理工程师批复意见。总监理工程师应组织建设、设计、施工、监理等有关人 员对工程质量事/安全问题(事故)调查报告和处理方案讲行论证,以确认报告和方案的正确 合理性, 如有不同意见, 应责今施工单位重报。必要时应邀请有关专家参加对事故调查报 告和处理方案的论证。
- (5) 监理人员发现施工存在重大质量隐患,可能造成工程质量/安全问题(事故)或已经造 成工程质量/安全问题(事故)时,应通过总监理工程师及时下达工程暂停令,要求施工单位停 工整改。凡要求施工单位提交工程质量/安全问题(事故)整改方案的,施工单位均应用该表向 项目监理机构报审工程质量/安全问题(事故)调查报告和工程质量/安全问题(事故)处理方案。

L.程质量/安全问题(事故)技术处理方案报审表常见格式见表 3-20(范例)。

表 3-20 工程质量/安全问题(事故)技术处理方案报审表(范例) L程名称: XX学院实验实训楼 A 区 编号: B7-003 勒,××监理协会建设监理中心(项目监理机构) 告 方××年 8 月 7 日提出的发生因振捣不均涉应构造柱强度降低的工程(习质量/□安全问题(事故)的 报告,经认直研究后,现提出处理方案,读予以审批。 附件, 同隐蔽工程质量检验资料 □检验批质量检验资料 □分玢 1.程质量检验资料 □施工试验室证明资料 口其他

> 施工项目经理部(盖章): ××建筑工程有限责任公司 项目经理或项目技术负责人(签字): ××

××××年8月8日

审查或验收意见:

所报隐蔽工程的技术资料齐全、符合设计文件和规范要求、同意按此处理方案施工

项目监理机构(盖章): ××监理协会建设监理中心

专业监理工程师(签字); ××

××××年8月8日

注, 本表一式两份, 项目监理机构, 施工单位各一份。

3.4 造价控制文件

投资控制即实现项目实际投资不超过计划投资,也就是指力求使项目在满足质量和进 度要求的前提下, 在整个项目施工阶段开展的管理活动。投资控制不是单一的目标控制,



须具有全面性、日是一种微观性的工作。造价控制文件包括工程数支付、工程数支付证书、 厂程变更费用报审表、费用索赔申请表、费用索赔审批表等内容。

3.4.1 工程款支付报审

工程款支付报审是指施工单位根据项目监理机构对施工单位自检合格后目经监理机构 验收合格的工程量计算应收的工程款的申请。

- (1) 工程款支付的程序及注意事项如下。
- 对实际完成的分部分项工程量进行计量和审核,对承建单位提交的进度付款申请进行 审核,并签发付款证明以控制合同价款。

根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定,项目监理机构对施工单位申报的 已完成的工程量进行的核验,即为工程计量。

发包方应在双方计量确认后 14 天,向承包方支付工程款;同期用于工程上的发包方供 应材料设备的价款、以及按约定时间发包方应按比例相同的预付款、应按工程款一并结算。 发包方超过约定时间而不支付工程款时,承包方可向发包方发出要求付款的通知,仍不能 支付时,双方可签订延期付款协议。协议须明确延期支付的时间和从发包方代表计量签字 后 15 天起计算应付款的贷款利息。如发包方不按合同约定支付工程款,双方又达不成一致 协议时,承包方可停止施工,由发包方承担违约责任。

(2) 工程款支付报审表格式见表 3-21(范例)。

表 3-21 T程款支付报审表(范例)

工程名称: ××学院实验实训楼 A 区

编号: B11-001

致, ×× 态理协会建设监理中心(项目监理机构)

根据施工合同约定,我方已完成××学院实验实训楼基础工程的中间结构验放工作。建设单位应在× ×年3月20目前支付工程款共计(大写)貳佰玖拾陆万零捌拾貳元整(小写: 2960082.00元), 请予以审核。 附件:

同己完成工程量报表

口工程竣工结算证明材料

团相应支持性证明文件

施工项目经理部(盖意): ××建筑工程有限责任公司 项目经理(签字): XXX

XXXX年3月7日

审查意见:

- 1 施工单位应得款为;工程款共计(大写)或佰玖拾陆万零捌拾或元整(小写: 296008200元)
- 2. 本期应扣款为: 零元(0.00元)
- 3 本期应付款为:工程款共计(大写) 底佰玖拾陆万零捌拾底元整(小写:296008200元) 附件:相应支持性材料

专业监理工程师(签字), ××× ××××年3月7日

结表

宙核音见.

经审核, 同意

本期支付施工单位工程款: (大写) 贰佰玖拾陆万零捌拾贰元整(小写: 2960082.00元)

项目监理机构(盖章): ××监理协会建设监理中心 总监理工程师(答字、加盖执业印章): ×××

××××年3月7日

审批意见:

同意支付施工单位工程款:(大写)或佰政拾陆万零捌拾贰元整(小写:2960082.00元)

建设单位(盖章): ××学院 建设单位代表(签字): ××× ××××年3月7日

注: 本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份;工程竣工结算报审时本表一式四份,项目监理机构、建设单位各一份、施工单位两份。

3.4.2 工程变更费用报审

工程变更是指在工程项目实施过程中,按照合同约定的程序对部分或全部工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面做出的改变。工程变更通常与初始目标不一致,会打乱原来的施工方案和计划,使工程的质量、投资、进度控制目标受到不利影响。工程变更费用报审是指由于建设、设计、监理、施工任何一方的工程变更,经有关方确认工程数量后,计算出的工程价款提请报审、确认、批复。

工程变更费报审表格式见表 3-22。

表 3-22 工程变更费用报审表

编号: C2-002-01

L程名称					日期		
致			(监理	!单位):			
根据第()号工程等	变更单, 申	请费用如下表	表, 请审核。			
项目名称	变更前			变更后			工程款
	工程量	单价	合价	L程量	单价	合价	增(+)减(-)

							疾衣	
								\neg
								_
				dele et es	E ET AZ YM WIT.	, 40 AC.		
				施工项目经理部(盖章): 项目经理(签字):				
				- 内 日	程 年 (2	年 年	月	Н
rts 43 ats to						Aq-	л	Н
审核意见:								
	项目监	理机构(盖章):					
	监理	工程师(签字):			年	Н	П
	总临到	工程师(签字).			年:	月	В

注, 本表一式三份, 由施工单位道报, 建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

知识链接

工程变更费用的确定如下。

- (1) 变更发生后,承包方在变更确定后 14 天内,提出变更工程变更价款的报告,经监 理工程师确认后调整合同价款
 - ① 合同中已有适用于变更工程的价格、按合同已有的价格变更合同价款。
 - ② 合同中只有类似于变更工程的价款。可参照此价格变更合同价款。
- (3) 合同中没有使用或类似于变更工程的价格,由承包方提出适当的变更价格,经监理 工程师确认后执行
- (2) 承包方在确定变更后 14 天内不向监理工程师提出变更借款报告时、视为该项设计 变更不涉及合同价款的变更。
- (3) 监理工程师收到变更工程价数报告之日起14天内予以确认。否则、自变更价数报 告送达之日起 14 天后、视为变更工程价数报告被确定、
 - (4) 监理工程师不同意承包方提出的变更价格。按照合同约定的争议解决方法处理。
 - (5) 监理工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款,与工程款同期支付。

- (6) 因承包人自身原因导致的工程变更、承包人无权要求追加合同价款。
- (7) 监理工程师同意采用承包人合理化建议,对所发生的费用和获得的收益,由合同双方另行约定分担或分享。

特别提示

工程变更费用报审程序如下。

- (1) 施工单位应按照施工合同的有关规定,编制工程变更计算书,报送项目监理机构 工程师审核、确认,经建设单位、施工单位认可后,方可进入工程计量和工程款支付程序
- (2)发生工程变更,无论是由设计单位或建设单位或承建单位提出的,均应经过建设单位、设计单位、施工单位、监理单位的代表签认,并通过项目总监理工程师下达变更指令后,施工单位方可进行施工和费用报审。
- (3)由施工单位填报、加盖公章、项目经理签字、经专业监理工程师审查符合要求后报总监理工程师批准后签字有效、加盖项目监理机构章;工程变更费用单以经项目监理机构审查签章后的表格形式归存。
 - (4) 工程变更费用的拒审。
 - ① 未经监理工程师审查同意、擅自变更或修改施工方案进行施工而计量的费用。
 - ② 工序施工完成后,未经监理工程师验收或验收不合格而计量的费用
 - ③ 隐蔽工程未经监理工程师验收确认而计量和提出费用。

3.4.3 费用索赔报审

在施工合同实施中,合同一方当事人不履行或未正确履行其义务,而使另一方受到损失,受到损失的一方向违约的一方提出给于赔偿的要求,成为素赔。在涉及工程施工合同时,大多数素赔是施工单位向建设单位提出的,而且素赔的原因是多种多样的。

- (1) 项目监理机构处理费用索赔应依据下列内容。
- ① 国家相应的法律、法规和工程项目所在地的地方法规。
- ② 本工程的施工合同文件。
- ③ 国家、部门和地方有关的标准、规范和定额。
- ④ 施工合同履行过程中与索赔事件有关的凭证。
- (2) 当施工单位提出费用索赔的理由同时满足以下条件时,项目监理机构应予以受理。
- ① 索赔事件造成了施工单位直接经济损失。
- ② 索赔事件是由于非施工单位的责任发生的。
- ③ 施工单位已按照施工合同规定的期限和程序提出费用素赔报审表,并附有索赔凭证 材料。
 - (3) 费用索赔报审表格式见表 3-23(范例)。



表 3-23 费用索赔报审表(范例)

工程名称: ××学院实验实训楼 A 区

编号: B13-001

致,××监理协会建设监理中心(项目监理机构)

根据施工合同第361、362条款、由土设计变更导致部分工程返工的原因、我方申请索赔金额(大写) 伍万伍仟陆佰贰拾元整, 请予批准。

索赔细由:由于设计变更导致部分工程返工的原因,返工导致施工材料,人工管,机械管等增加, 特申请索赔费用

附件: 図索赔金额计算

国证明材料

施工项目经理部(盖章): ××建筑工程有限责任公司 项 目 经 理 (答 字)s X X X

××××年 12 月 16 日

审核意见:

口不同意业项索赔,

国同意此项素赔,素赔金额为(大写)伍万伍仟陆佰贰拾元整。

同意/不同意索赔的理由:

附件: 図索磨审查报告

项目监理机构(盖章): ××监理协会建设监理中心 总监理工程师(签字、加盖执业印章): ×××

××××年12月16日

审批意见:

同意支付索赔金额为(大写)伍万伍仟陆佰貳拾元整

建设单位(盖章): ××学院 建设单位代表(签字): ×××

××××年 12 月 16 日

注, 本表一式三份、项目监理机构、建设单位、端下单位各一份。

▲ 特别提示

《建筑工程施工合同示范文本》规定、承包人可以按下列程序以书面的形式向发包 人索赔。

- (1) 索赔事件发生后 28 天内、向监理工程师发出索赔意向通知书。
- (2) 发出索赔意向通知书后 28 天内, 向监理工程师提出延长工期要求或补偿经济损失 的索赔报告及有关资料。
- (3) 监理工程师收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,在28天内给予签复或要求 承报人讲一步补充索赔理由和证据。
- (4) 监理工程师收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,28 天内尚未给予答复或未 对承包人做出进一步要求的。视为该项索赔已经被认可。

- (5) 当索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性地向监理工程师发出索赔意向通知书, 在索赔事件终了后28天内,向监理工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。
 - (6) 总监理工程师在签署费用索赔审批表时,可附送索赔审查报告,具体内容如下。
- ① 正文: 受理索赔的日期、工作概况、确认索赔理由及合同依据等,经过调查、讨论、协商而确定的计算方法及由此而得出的索贴批准额和结论。
 - ② 附件: 总监理工程师对索赔评价, 施工单位索赔报告及有关证据、资料。

如果施工单位违反了上述程序的某些规定、并不完全取消其索赔的权利、但应受到限制,施工单位有权得到的赔偿赦额将不超过监理工程师通过同期记录核实估价的索赔总额。 FIDIC 条款规定、当施工单位向监理工程师递交了最终报告后、其索赔的权利就终止了



合同争议

合同是连接社会经济生活各环节的重要纽带,是经济活动借以实现的主要形式 在建筑市场中,合同管理直接关系着工程项目建设的投资、进度、质量三大控制,是工程建设监理方法系统中不可缺少的组成部分 在工程项目的进展过程中,由于对某些问题的处理需要合同依据,当建设单位和施工单位对合同条款的适用性或解释形不成一致意见时,就出现合同争议。

1. 合同争议的分类

常见的合同争议内容主要包括下列几种

- (1) 索賠争议。如施工单位提出经济或工期索賠,建设单位不予承认,或予以承认但支付金额与施工单位的要求相差较大,双方不能达成一致意见而发生的争议
 - (2) 违约赔偿争议 如建设单位或施工单位违约责任不明确,双方产生严重分歧。
- (3)工程质量的争议如工程施工中的缺陷、设备性能不合格等施工质量责任分不清,双方不能达成一致意见而发生的争议
- (4)中止合同争议 施工单位因建设单位违约而中止合同,并要求建设单位对因这一中止所引起的损失予以赔偿,建设单位不予以承认或不同意施工单位提出的索赔要求而发生的争议。
- (5) 终止合同争议、对于终止合同的原因、责任,以及终止合同后的结算和赔偿,双 方持有不同看法而引起的争议。
 - (6) 计量与支付争议。双方在计量原则、方法及程序上的争议。
 - (7) 其他争议。如进度、质量控制、试验等方面产生的争议。
 - 2. 接到合同争议后的工作

项目监理机构接到合同争议的调解要求后应进行以下工作。

- (1) 及时了解合同争议的全部情况,包括进行调查和取证。
- (2) 及时与合同的双方进行磋商。
- (3) 在项目监理机构提出调解方案后,由总监理工程师进行争议调解。
- (4) 当调节未能达到一致时,总监理工程师应在施工合同规定的期限内提出处理该合

同争议的意见。

- (5) 在争议调解过程中。除已达到了减工合同规定的暂停履行合同的条件外。项目监 理机构应要求施工合同的双方继续履行施工合同。
 - 3 今同争议处理的原则

按照合同要求, 无论是施工单位还是建设单位, 应以书面的形式向监理工程师提出争 议事官,并呈一副本给对方。监理工程师应在收到争议通知后, 按合同规定期限, 完成对 争议事件的全面调查与取证。同时对争议做出决定。并将决定书面通知建设单位和施工单 位、如果监理工程师发出调知后、建设单位或施工单位为在规定的期限内要求仲裁、其决 定则为最终决定,争议事宜处理完毕 只要合同未被放弃或终止, 监理工程师应要求施工 单位继续精心组织施工

当调解不成时, 双方可以在合同专用条款内约定下面的任何一种方式解决争议

- (1) 双方达成仲裁协议, 向约定的仲裁委员会申请仲裁。
- (2) 向有管辖权的人民法院起诉

在总监理工程师答发合同争议处理意见后、建设单位或施工单位在施工合同规定的期 限内未对合同争议处理决定提出异议。在符合施工合同的前提下、此意见应成为最后的决 官、双方必须执行

在合同争议的仲裁或诉讼过程中,项目监理机构接到仲裁机关或法院要求提供有关证 据的诵知后,应公正她向仲裁机关或法院提供与争议有关的证据

3.5 工期管理文件

工期管理文件包括工程临时延期申请表、工程临时延期审批表、工程最终延期申请表、 工程最终延期审批表,《建设工程监理规范》(GB/T 50319-2013)将上述表格综合成工程临 时/最终延期报审表。

3.5.1 工程临时延期报审表

当工程暂停是由于非施工单位的原因造成时,施工单位可向监理单位提出临时延期报 宙。

- (1)"根据合同条款 条的规定":填写提出工期索赔所依据的施工合同条目。 "由于 原因";填写导致工期拖延的事件。
- (2) 工期延长的依据及工期计算包括: 索赔所依据的施工合同条款; 导致工程延期事 件的事实: 厂程拖延的计算方式及过程。
 - (3) 合同竣工日期:指建设单位与施工单位签订的施工合同中确定的竣工日期或已最

终批准的竣工日期。 申请延长竣工日期:指合同竣工日期加上本次申请延长工期后的竣工 日期。

(4) 证明材料:指所有能证明本期申请延长的工期是由非施工单位原因导致工程延期的证明材料(包括施工日记与监理一致的内容)。

特别提示

工程临时延期报审是发生了施工合同约定由建设单位承担的延长工期事件后, 施工单位提出的工期索赔, 据项目监理机构审核确认

(1) 总监理工程师在签认工程延期前应与建设单位、施工单位协商,宜与费用索赔一并考虑处理

(2) 总监理工程师应在施工合同约定的期限内签发《工程临时延期报审表》, 或发出要求施工单位提变有关延期的进一步详细资料的通知。

- (3) 临时批准延期时间不能长于工程最终延期批准的时间。
- (5) 审查意见:专业监理工程师针对施工单位提出的工程临时延长工期报审表,首先 审核在延期事件发生后,施工单位在合同规定的有效期内是否以书面形式向专业监理工程师提出延期意向通知;其次审查施工单位在合同规定有效期内向专业监理工程师提交的延期依据及延长工期的计算;最后,专业监理工程师对提交的延期报告应及时进行调查核实,与监理同期记录进行核对、计算、并将审查情况报告总监理工程师。总监理工程师问意临时延期时在暂同意延长工期前"□"内画"√",延期大数按核实天数。"原竣工日期"指"合同竣工日期","延迟到的竣工日期"指"合同竣工日期",但还对的数工日期。

工程临时延期报审表格式见表 3-24(范例)。

表 3-24 工程临时延期报审表(范例)

工程名称: XX学院实验实训楼 A 区

编号: B14-001

致: ××监理协会建设监理中心(项目监理机构)

根据施工合同 13.1、13.2(条款),由于非纯工方原因停水、停电原因,我方申请工程临时/最终延期 2 天(日历天),请予批准。

附件: 1. 工程延期依据及工期计算:

(每天按8小时工作时间计算)

16-8=2(天)

合同竣工日期: ××××年12月31日

申请延长竣工日期: ××××年1月2日

- 2. 证明材料:
- (1) 停电通知/公告
- (2) 停电通知/公告

施工项目经理部(盖章): ××建筑工程有限责任公司 项目经理(签字): ×××

××××年11月2日

续表

宙核奇见.

施工方提供的证明材料情况属实, 依据充分, 工期计算合理, 同意工期延期2天

団同意 Г.程临时/最终延期 2 天 (日历天)。 Г.程竣 Г.日期从施 Г.合同约定的××年 12 月 31 日延迟 到XX年1月2日。

□不同意延期, 请按约定竣工日期组织施工。

项目监理机构(盖意): ××监理协会建设监理中心 总监理工程师(签字、加盖执业印章); ×××

XXXX年11月2日

审批意见:

同载工程临时延期两天,工程验工日期从施工会同约定的××××年17月31日延迟至××××年 1月2日

> 建设单位(盖章): ××学院 建设单位代表(签字): ××× ××××年11月2日

注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

3.5.2 丁程最终延期报由表

工程最终延期报审表是在影响工期事件结束, 施工单位提出最后一个《工程临时延期 报审表》批准后,经项目监理机构详细地研究评审影响工期事件全过程对工程总工期的影 响后, 批准施工单位有效延期时间。

- (1) 总监理工程师在签认工程延期前应与建设单位、施工单位协商, 宜与费用索赔一 并考虑处理。
- (2)"根据施工合同 (条款),由于 原因,我方申请工程临时/最终延期 (日历天), 请予批准。"分别填写本次延长工期所依据的施工合同条目和施工单位申请延 长工期的原因及相应延期时间。
- (3) 审核意见: 在影响「期事件结束, 施工单位提出最后一个《工程临时延期报审表》 批准后,总监理1程师应指定专业监理1程师复查1程延期及临时延期审批的全部情况, 详细地研究评审影响工期事件对工程总工期的影响程度、应由建设单位承担的责任和施工 单位采取缩小延期事件影响的措施等。根据复查结果,提出同意工期延长的目历天数,或 不同意延长工期的意见、报总监理工程师最终审批、若不符合施工合同约定的工程证期条 歉或经计算不影响最终上期,项目监理机构总监理上程师在不同意延长工期前"□"内画 " √",需延长工期时在同意延长工期前"□"内画"√"。
 - (4) 同意工期延长的日历天数为: 由影响工期事件原因使最终工期延长的总天数。
- (5) 原竣工日期:指施工合同签订的工程竣工日期或已批准的竣工日期。延迟到的竣 工目期: 原竣工日期加上同意工期延长的目历天数后的目期。

(6) 说明:详细说明本次影响工期事件和工期拖延的事实和程度,处理本次延长工期 所依据的施工合同条款,工期延长计算所采用的方法及计算过程等。

工程最终延期报审表格式见表 3-25(范例)。

表 3-25 工程最终延期报审表(范例)

L程名称: ××学院实验实训楼 A 区

编号。B14-007

致: ××监理协会建设监理中心(项目监理机构)

根据施工合同 13.1、13.2(条款),由于非施工方原因停水、停电以及设计变更原因,我方申请工程临时/最终延期 2 天 (日历天),请予批准。

附件: 1. 工程延期依据及工期计算:

(每天按8小时工作时间计算)

120 - 8 = 15(£)

合同竣工日期: XXXX年12月31日

申请延长竣工日期, ××××年1月15日

- 2 证明****1.
- (1) 停电通知/公告
- (2) 停电通知/公告
- (3) 变更通知单

施 L项目经理部(盖章): ××建筑工程有限责任公司 项目经理(签字): ×××

××××年12月2日

审核意见:

施工方提供的证明材料情况属实、依据充分、工期计算合理、同意工期延期 15 天

団最終同意 1.期延长 15 天。使竣 「日期(包括己指令延长的 「期)从原来的××××年 12 月 31 日延 沢到××××年 1 月 15 日。诸你 万城行。

□不同意工期延长工期, 诸按约定的竣工日期组织施工。

项目监理机构(盖章): ××监理协会建设监理中心 总监理 [程师(签字、加盖执业印章): ×××

××××年12月2日

审批意见:

最终同意工期延长 15 天 使竣工日期(包括已指令延长的工期)从原来的××××年 12 月 31 日延迟到××××年 1 月 15 日

建设单位(盖章): ××学院 建设单位代表(签字): ××× ××××年12月2日

注: 本表 '式一份, 项目监理机构、建设单位、施丁单位各一份。

3.6 监理验收文件

3.6.1 监理工作总结

在工程结束后,监理工程师应提交监理工作总结报告,即监理单位对履行委托监理合同情况及监理工作的综合性总结,其主要内容是总结监理组织及监理单位在该工程工作中的经验和教训。该总结由总监理工程师组织项目监理机构有关人员编写,报业主和上级主管部门。

1. 监理工作总结

监理工作总结应包括以下内容。

- (1) 工程概况。主要包括工程名称(填写全称)、工程地址(填写详址)、工程项目的单位工程数量、不同单位工程结构类型、不同单位工程的建筑面积、 开工时间、竣工时间、施工总天数、工程质量、进度、投资的总体情况等。
 - (2) 监理组织机构、监理人员和投入的监理设施。
 - (3) 监理合同履行情况。
- (4) 监理工作情况: 建立工作制度化、标准化、规范化的开展情况,监理工作是如何 开展的,如何取得业主的信任,如何提高人员紊质。
 - (5) 监理工作成效。
 - (6) 施工过程中出现的问题及其处理情况和建议。
 - (7) 工程照片(有必要时)。

2. 单位工程竣工总结

监理工作总结报告再附单位工程竣工总结将进一步佐证监理工作的善始善终,也利于 提升监理工作质量。

单位工程竣工总结可包含下列内容。

- (1) 工程概况:主要包括工程项目名称、设计单位、总施工单位、监理公司、施工单位、工程规模等。
 - (2) 管理方法、项目管理目标情况:如对新技术的应用、安全和文明施工管理方法等。
- (3) 工程质量控制:如竣工工程质量验收,事前、事中、事后的质量控制手段,采用 新技术、新材料的情况,发生质量通病和质量事故的情况,消除质量通病的情况,执行 ISO 9001 质量保证体系情况等。
- (4) 工程进度控制:如工程进度的规划,工程进度的检查,工程进度的协调,组织措施上由项目经理亲自负责项目分解、进度协调;合同措施上实行工期奖罚制度等。

- (5) 工程投资控制:如遵循"投入少,见效高"的原则等。
- (6) 合同管理和组织协调。
- (7) 工作体会。

3.6.2 质量评价意见

质量评价意见用于质监机构对监理单位的工作质量的评价,每个评价项目分为三级评价,分数常采用五分制。总体评价由五分制换算百分制。在评价前,监理单位须提报监理工作质量评价报告。

(1) 监理单位工程质量评价报告格式见表 3-26。

表 3-26 监理单位工程质量评价报告

工程名称			施工单位	
建筑面积		层数/总高度		最大跨度
结构类型			基础类型	
地基持力层		设防烈度	1.12	设计合理使用年限
施工工程监理情况简述				程序报验资料、现场质量管理资料 全数合格,能反映工程的质量及施
合同履约情况	.填写说明: 已按与建设单位	签订的监理合	-同约定内容, ;	· 真履行了工程监理职责
监理资料情况		的监控程序户		签与工程问步进行,能够反映工程 全面、细致、合理地反映出工程各
工程质量资料	.填写说明:	小穴分析 50	*-春文人 上上	and the sale of th
与验收结论	观公正地反映实体,			工同步进行可正确地指导施工、能
				L 同



(2) 监理工作质量评价表格式见表 3-27。

表 3-27 监理工作质量评价表(质监机构用表)

评价机构			
<u><u></u> </u>			
	评价项目	评价	得分
(一) 项目监理	专业人员及检验检测器材配备齐全、合理,监理手段先进	优良 4~5 分	
机构人员组成、	专业人员配备基本合理情况,主要检验器材有配备	·般 3~4分	
设备投入情况	专业人员配备不合理情况,所配器材不能满足检验需要	差 0~3 分	
	监理人员的业务能力、协调能力较强, I 作态度积极、责任心强	优良 4~5 分	
	监理人员 点、态度 点、态度		
肥力、心及	力、态度 益理人员的业务、协调能力能满足需要,监理人员普遍有责任心 益理人员的业务、协调能力普遍差,或监理人员责任心不强		
	公司总监常驻工地或每天到现场巡视,开会及重要情况均在现场	优良 4~5 分	
.) 总监的到	总监经常到现场巡视, 了解工地情况, 重要情况常在现场	-般3~4分	
位情况	总监经常不在现场,对工地情况不了解	差 0~3分	
	监理资料整理规范、齐全,监理规划、细则有针对性	优良 4~5 分	
(四) 监理资料	益理资料基本齐全,监理规划、细则基本可以指导工作	·般 3~4分	
	益理资料零乱、不齐个,监理规划、细则无针对性,不能指导工作	差 0~3 分	
	蓝理人员独立进行检查、定期或不定期巡视现场,及时解决问题	优良 4~5 分	
	五) 监理机构		
见场	益理人员经常坐在办公室,很少到现场检查、巡视	差0~3分	
A . III-an Plate	任何时间、任何关键部位、 [序施工, 均有监理员旁站监督	优良 4~5 分	
六) 监理员旁	关键部位、 1.序施工, 一般都有监理员旁站监督	-般3~4分	
站情况	一些关键部位、工序施工、无监理员务站监督、或有问题不指出	差 0~3 分	
	能按规定对原材料、主要安装设备进行检验	优良 4~5 分	
七) 对原材料 检验情况	基本能按规定对原材料、主要安装设备进行进场检验	-般3~4分	
M.特征 同 · DC	工地材料经常未经检验,或检验不合格即同意使用	差 0~3 分	
	能及时对隐蔽!程进行验收以及结构验收	优良 4~5 分	
八) 隐蔽 [程	基本能及时对隐蔽工程进行验收以及结构验收	-般3~4分	
验收情况	不能及时对隐蔽工程进行验收以及结构验收,或资料后补	差 0~3 分	
A service A alternation	对安全施 工控制紧,对安全隐患不整改的行为及时上报质监机构	优良 4~5 分	
九)安全监理	所监 L地对安全隐患有指出,但跟进济实不足	·般 3~4 分	
情况	所监工地经常因安全隐患被责令整改,经常对安全隐患不采取措施	差 0~3 分	
I . dv A. pri tob	经常有建设单位对监理工作表示满意	优良 4~5 分	
(十) 各方反馈 情况	未听闻建设单位、承包商对监理的工作发表意见,或意见中性	·般 3~4分	
月氏	建设单位不满意监理工作,承包商经常提出合理投诉	差 0~3 分	
	各项评分合计		
总体评价得分(4	各项评分合计得分除以评价项数, 再乘以 20)		
质监机构(公章)	: 质监机构负责人:	年 月	Е

3.6.3 监理资料移交书

监理工作完成后,一个重要标志是将相应的监理资料移交,并以监理资料移交书为证(表 3-28 和表 3-29)。

表 3-28 监理资料移交书

X 市城市建设工程竣工档案移交书 工程项目名称: 单位工程名称: 移交文字材料 张, 蓝图 张, 照片 张。 移交单位(盖章): 接收单位(盖章): 接收人: 移交日期: 年月日 持收日期: 年月日


注:移交清单一式三份,一份交监理单位,一份交建设单位存档,一份交城建档案馆存档。

表 3-29 监理档案移交目录

归档编号	归百文件	更数	表注
1	委托监理合同	29	
2	监理规划	30	
3	监理实施细则	60	
4	监理月报	40	
5	监理会议纪要	30	
6	开工/复工报审表、工程暂停令	8	
7	见证记录及见证取样送检	169	
8	质量事故报告及处理意见	10	
9	监理旁站记录	102	
10	合同与其他事项管理(工程延期报告及审批、合同变更材料、 合同争议违约报告及处理意见)	12	


四四回で	医与文件	张数	备注
11	阶段质量评估报告(地基、基础、主体、安装、竣工)	70	
12	监理工作总结	36	
13	临理报告	38	

⑥小 结 〕

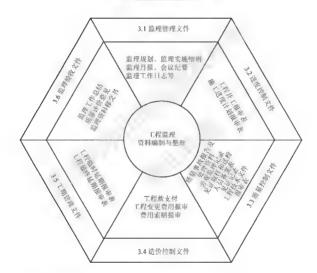

能力拓展

- 1. 依据章前学习要求、画出监理资料的组成结构图
- 2 依据资料员的岗位职责要求,进行监理资料收集、整理、分类存放并模拟监理工程 资料移交程序规范进行, 有可以展示的资料卷宗
- 3. 依据下列监理工作程序图(图 3.2~图 3.9), 复制并添画出监理过程形成的监理资料 名称,要求按照新规程分类编号。便于分析归档到相应宗卷。

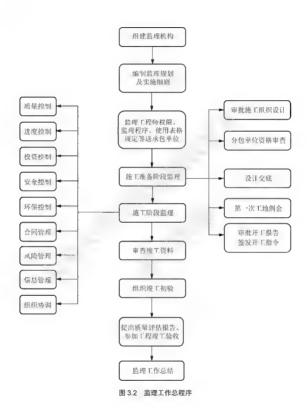

110





图 3.3 工程质量控制程序

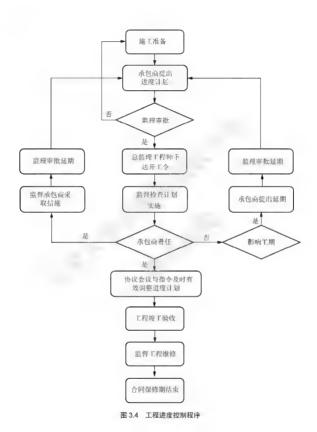

112

第3章 工程监理资料编制与整理




图 3.5 工程投资控制程序

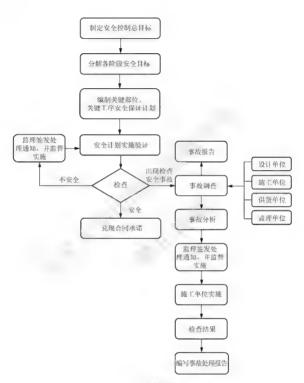


图 3.6 安全控制程序

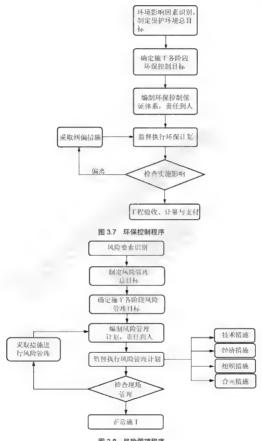


图 3.8 风险管理程序

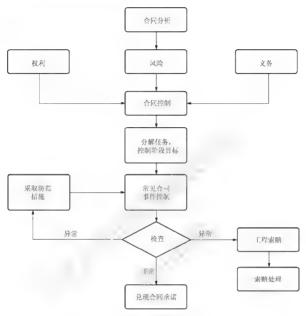


图 3.9 合同管理程序

4. 对应章前学习要求, 填写学习效果自我检测记录表

学习效果自我检测记录表


領域			* 4		
理论认知	了解	透用		综合	
岗位技能	模仿	应用		创造	
职业情感	激情	心境		热情	

5. 学习过程中、不仅要注重沟通表达能力训练、团队合作学习,更要加强个人工程实践经验的积累。伴随着理论知识学习,自觉及时记录课后实践将促进职业能力的提升。

课后实践记录表

实 践 分 项	时间	段	实 践 要 点	见证人及联络方式
E地考察			工程名称、工程所在地	
沟通能力训练			沟通对象、沟通内容、沟通效果	
内业资料管理			收集、分类、整理、立卷、归档	
小组合作学习			分工负责情况及合作成效	
实践中遭遇的问题			视具体填写,着眼于发现问题、分析 问题及解决问题	
其他				

6. 依据监理工作过程中信息管理和组织协调程序图(图 3.10 和图 3.11), 画出监理资料 员的工作内容图

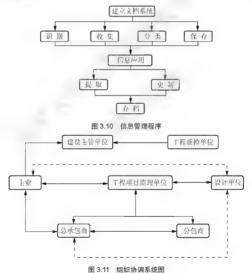

第4章 施工资料编制与整理



学习要求

资料员应知	资料员应会	职 业 素 养
1. 施工资料形成流程 2. 施工资料基本内容 3. 施工资料分类、编号、归档 4. 施工资料分类编号、归档 6. 施工资料编制要求 6. 施工资料验收和移交	1. 会进行施工资料分类、归档保存 2. 及时收集施工质量、控制等资料 3. 能够检查单位工程安全和功能检 整本等资料正设 4. 依据事文、规范填写施工过程中 产生的施工资料 5. 及时收发、传阅、登录保存施工 资料 6. 规范办理施工资料移交	1. 提高对工程资料管理问题的分析、归结、概括与总结能力 2. 不断增强查阅工程规范、标准等信息应用的能力 3. 加强相似协作, 有效交流, 提高沟通能力

学习性工作任务

工程背景

2010 年上海世博会中国馆共分为国家馆和地区馆两部分 国家馆居中升起。层叠出排。采用极富中 国建筑文化元素的红色"斗冠"造型。建筑面积 46 457m2、高度 69m、由地下一层、地上 6 层组成 地区 馆建筑高度 13m 左右、总建筑面积为 16 万平方米、地下室高 8m

作为世傳主办国建筑水平的代表。中国馆的建设充分利用新技术、新材料、新工艺来展示中国文化和 现代技术、特别是太阳能利用、雨水固收、循环水降温及建筑构件节能处理都是中国建筑水平的最新体现。

中国领导永久性建筑、为游客和工作人员提供理想的空间、是设计者和端工者共同努力的目标、中国 馆中是当前中国智能建筑系统完善的典型建筑

工作准备

- 1,每组档案金8套、A4纸、口取纸及其他零星资料、装订工具若干
- 2. 各类施工资料空白表格齐全。
- 3. 無報工程图纸 1 套
- 4. 工程档室示范1查
- 5. 工程资料管理软件 1~3套。

工作任务

选择一个单位工程。依据现行的工程资料管理规程。模拟施工单位、完成施工资料编制任务

- (1) 以小组为单位。制订施工资料管理计划
- (2) 分工协作完成资料收集、整理、使用归档、移交任务
- (3) 及时建立施工资料收集台账
- (4) 规范进行施工资料交底
- (5) 建立资料传递、追溯、使用和安全防护资料
- (6) 应用专业软件进行工程资料的处理

教学建议

教币在进行本章畅学时,可参考引例安排学习任务,也可根据本地工程实际,灵活布置训练任务 建 议每一节学习都采用任务驱动方式,学习以分理协作为宜 分组合作学习不仅能分工协作完成分项工程或 分部工程的资料整理,更有助于学生沟通表达能力、合作解决问题等核心职业能力训练

组织装学宝施过程中;重分组任务的一致性和不雷国原则, 充分实践"在做中学"的职业教育教学理念 在本章结束后。每个学习小组须完成单位工程施工资料的归档

施工管理资料

□ 引例

本例侧重于讨论施工管理资料的内容及验收归档

日期职业技术学院讲堂群(命名为地滋楼),总面积 47 570m²,分为 A,B,C 三个区;A 区面积 19 257m²,由山东锦华建设集团承建;B 区面积 11 029 m²,由日照市西湖建筑工程有限公司承建;C 区面积 17 284m²,由山东日建集团有限公司承建 A,B,C 三区的工程虚理单位都是山东虚理协会建设监理中心

息 思考

- 1. 施工管理资料形成的流程是什么?
- 2. 施工管理资料包括哪些内容?
- 3. 企业资质证书及相关专业人员岗位证书检查是否属于施工管理?
- 4. 旅工管理资料与工程监理资料有何联系?
- 5. 项目经理、施工员、质量员、资料员在工程资料管理中的职责有哪些?
- 6. 工程施工过程中见证取样的项目有哪些?

知识链接

图 4.1 是施工资料管理网络图——施工管理资料。

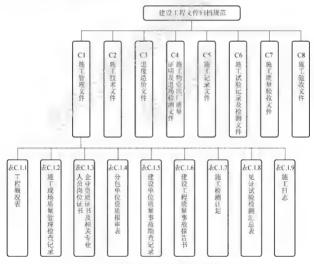


图 4.1 施工资料管理网络图 --施工管理资料



4.1.1 工程概况表和开工报告

1. 工程基本概况表

工程概况表是对工程基本情况的描述,应包括单位工程的一般情况。资料表格形式见 表 4-1。

Ι	程名称	编号	
	建设单位		
Γ	建设用途	设计单位	
Γ	建设地点	勘察单位	
_	建筑面积	监理单位	
般	工 期	施工单位	
情	计划开工日期	计划竣工日期	
况	结构类型	基础类型	
	层次	建筑檐高	
Γ	地上面积	地下面积	
	人防等级	抗震等级	
	地基与基础		
	柱、内外墙		
构	梁、板、楼盖		
造	外墙装饰		
特	内墙装饰		
征	楼地面装饰		
	屋面构造		
	防火设备		
	机电系统名称		
	其 他	· ·	

表 4-1 工程概况表

2. 开工报告

开工报告是建设单位与施工单位共同履行基本建设程序的证明文件,是施工单位承建 单位工程施工工期的证明文件。资料表格形式见表 4-2。

表 4-2 开丁报告

施工许可证号:						编号:
工程名称	结构类型					建设单位
L程地点	建筑面积			层数		施工单位
T.程批准文号			施工.图纸	交审情	况	
预算造价		1	材料设备	准备情	况	
计划开工日期		开工	施工现场	质量管	理检查情况	
计划竣工日期		条件	七通一平	情况		
实际开工日期		说明	工程预算	编审情	Ж.	
合同工期		7	施工队伍	进场情	况	
合问编号		7	施工机械	进场情	况	
	建设单位(公章)		监理单位(公	(章)	施	□単位(公章)
审核意见	项目负责人: (签字) 年 日	В	总监理工程		字) 项	目负责人:(签字) 年 日 F

知识链接

- (1) 开工报告一般由施工总承包单位填写,分包单位只填写工程开工报审表,并报监理单位审批
 - (2) 开工前应具备如下条件。
- ① 建设单位应使施工现场具备"七通一平"条件,即土地(生地)在通过一级开发后, 使其达到具备给水、排水、通电、通路、通信、通暖气、通天然气或煤气,以及场地平整 的条件,使二级开发商进场后可以迅速开发建设
- ② 总监理工程师对施工单位的资质、劳务资质、质量保证体系、现场项目经理资质、 技术负责人、质量负责人等管理人员进行了资质审查. 对现场管理制度、质量责任制、工程质量检验制度、主要专业工种操作人员上岗证、合格证、施工图审查情况、地质勘察资料、施工组织设计(方案)审批、施工技术标准引用、搅拌站及计量装置、现场材料设备存放于管理等,进行了认真核查、并填写《施工质量管理检查记录》的验收结论并签字认可。
- ③ 施工单位应完成施工图纸预审和参与会审;编制施工组织设计方案,履行审批手续; 编制工程预算;按施工材料需用量计划、准备钢材、水泥等主要材料和设备;按施工机具 需用量计划、备好机械及工具;按劳动力需用量计划、组织施工队伍进场,并进行入场 教育。
- (3) 开工程序:在具备了开工条件后,由施工单位生产部门填写开工报告,经施工单位(法人单位)的工程管理部门审核通过,法人代表或其委託人签字加盖法人单位公章,报请监理、建设单位审批,由监理单位总监理工程师、建设单位项目法人签字加盖公章,即可开工。

4.1.2 施工现场质量管理检查记录表

施工现场质量管理检查记录是健全的质量管理体系的具体体现。资料表格形式见表 4-3。

表 4-3 施工现场质量管理检查记录

开工日期:

			71 - 1. 11 791-
工程名称		施工许可证号	
建设单位		项目负责人	
设计单位		项目负责人	
监理单位		总监理工程师	
施工单位	项目负责人	,	项目技术负责人
序号	项 目	主要	内容
1 项目部质	量管理体系		
2 现场质量	计责任制		
3 主要专业	k.1.种操作岗位证书		
4 分包单位	2 管理制度		
5 图纸公司	记录		
6 地质勘察	Y 资料		
7 施工技术	·标准		
8 施工组织	《设计、施工方案编制及审批		
9 物资采料	与 管理制度		
10 施工设施	• 和机械设备管理制度		
11 计量设备	抓备		
12 检测试验	企 管理制度		
13 工程质量	社 检查验·收制度		
14			
检结果:		检查结论:	
工单位项目负责人:	年 月	日 总监理工程师:	年 月

特别提示

- (1) 直接将有关资料的名称写上,资料较多时,也可将有关资料进行编号,将编号填写上,注明份数
- (2)填表时间是在开工之前,监理单位的监理工程师(建设单位项目负责人)应对施工现场进行检查,这是保证开工后施工顺利进行和保证工程质量的基础,目的是做好施工前的准备。
- (3)由施工单位负责人填写、填写之后、将有关文件的原件或复印件附在后边、请总 监理工程师(建设单位项目负责人)验收核查 检查验收不合格,施工单位必须限期改正 验收核查后返还施工单位、并签字认可。

- (4) 通常情况下,一个工程的一个标段或一个单位工程只检查一次,若分段施工、人员更换、或管理工作不到位时。可再次检查。
- (5)"項目部质量管理体系"就是指为了实施质量管理的组织机构、职责、程序、过程和资源的一种特定体系 质量体系所包含的内容仅需要满足实现质量目标的要求
- (6)"现场质量责任制"指检查质量负责人的分工,各项质量责任的落实规定,定期检查及有关人员奖罚制度等
- (7)"主要专业工种操作岗位证书"指检查测量工、起重、塔式起重机等垂直运输司机、 钢筋、混凝土、机械、焊接、瓦工、防水工等建筑结构工种 电工、管道等安装工种的岗位证。以当地建设行政主管部门的规定为准。
- (8)"分包单位管理制度"指在有分包的情况下,总承包单位应有管理分包单位的制度, 主要是质量、技术的管理制度等。
- (9)"图纸会审记录"是指工程各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位、各种设备厂家)在收到设计院施工图设计文件后,对图纸进行全面细致的熟悉、审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动图纸会审由建设单位负责组织并记录(也,可请监理单位代为组织)
 - (10)"地质勘察资料"指有勘察资质的单位出具的正式地质勘察报告
- (11)"施工技术标准"是操作的依据和保证工程质量的基础,承建企业应编制不低于国家质量验收规范的操作规程、施工作业指导书等企业标准 该标准要有批准程序,由企业的总工程师、技术委员会负责人审查批准,要有批准日期、执行日期、企业标准编号及标准名称 企业应建立技术标准档案,施工现场应备全应有的技术标准 施工技术标准可作为培训工人、技术交底和施工操作的主要依据,也是质量检查评定的标准之一
- (12) "施工组织设计、施工方案及审批"指检查编写施工组织设计的内容及施工方案的具体措施情况、并要有编制单位、审核单位、批准单位和贯彻执行的措施。
- (13)"物資采购管理制度"是指加强內部管理和控制、規范采购行为、保障生产经营活动的正常进行、以最大限度地降低采购成本。
- (14) "施工设施和机械设备管理制度"是为了进一步加强施工现场机械设备的管理,提高设备的三率(即机械设备的利用率、完好率、机械效率),确保设备安全,满足施工生产的需要。
- (15)"计量设备配备"指专业工程及其项目在具体实施过程中、作业组织品质、效率的标识性度量与审计。
- (16) "检测试验管理制度"为了规范检验、试验秩序和行为,实现生产分析检验和试验活动的有效性和时效性、准确提供质量数据达到质量体系符合性要求
- (17)"工程质量检验验收制度"包括 3 个方面的检验:一是原材料、设备进场检验制度;二是施工过程的试验报告;三是竣工后的抽查检测,应专门制定抽测项目、抽测时间、抽测单位等计划。

4.1.3 工程质量事故处理

工程质量事故处理记录是指在工程建设中或在交付使用后, 因勘察、设计、施工等过

失造成 L程质量不符合强制性标准、设计文件以及施 L 合同规定的要求,须加固、返 L 、报废及造成人身伤亡或者重大经济损失的事故,对其发生情况及处理的记录形成 L 程质量事故报告和 L 程质量事故处理记录。

资料表格形式见表 4-4 和表 4-5。

表 4-4 工程质量事故报告

		编号:
工程名称	施工单位	(公章)
建设单位	设计单位	
结构类型	建筑面积、工程造	i价
事故部位	报告日期	
事故发生日期	事故等级	
事故责任单位	事故性质	
直接责任者	职务	预计损失
事故经过和原因分析:		
事故初步处理意见:		
单位技术负责人:	专业技术负责人:	项目经理:

表 4-5 工程质量事故处理记录

						年	月	EL.			编号:	
I.	程名称	-				12	V	事故治	部位			
事	故简况											
预	计损失	建筑	Á:	材	料设	畓:		人	工费			
F故处:	理经过:											
H. 14t th.	理结果:										 	_
P TO XL	压给水;											
验	建设单位	Ĭ		监理单	位			设计单	单位		施工单位	
收	项目负责	1人:		总监理	工程	师:		项目负	负责人	2	项目经理:	
意	(公章)			(公章)				(公章))		(公章)	
	(24 45)											
見栏	(2, 45)			,								

知识链接

- (1) 工程质量事故按其严重程度,分为重大质量事故和一般质量事故。
- (2)发生质量事故后,工程负责人应组织填写质量事故报告和工程质量事故处理记录。 重大质量事故应在事故发生24小时内写出书面报告,逐级上报;一般质量事故可按各单位的规定每月汇总上报。

- (3)"事故经过和原因分析"要填事故发生经过及事故发生的主要原因、事故原因包括设计原因(计算错误、构造不合理等)、事故原因(施工租制滥造、材料、构配件质量低劣等)、设计与施工的共同问题。不可抗力等。
 - (4)"预计损失"是指因质量事故导致的材料、设备、建筑和人员伤亡等预计损失费用。
- (5)"事故初步处理意见"填写事故发生后采取的紧急防护措施,以及需制定的事故处理方案,对责任单位,责任人的处理意见。
- (6)"事故处理结果"填写质量事故经处理后,工程实体质量是否符合事故处理方案的要求,是否满足工程原来对结构安全和使用功能的要求

4.1.4 施工日志

施工门志是施工过程中由项目经理部的有关人员,对有关技术和质量等管理活动及其 达到的效果,逐日做的连续完整的记录。

资料表格形式见表 4-6。

表 4-6 施工日志





施工日志的内容

- (1) 工程的开、竣工日期。主要分部、分项工程的施工起止日期。以及技术资料的提 供情况。工程准备工作的记录、包括:现场准备、施工组织设计学习、各级技术交底要求、 熟悉图纸中的重要问题、关键部位和应抓好的措施。向班、组长的交底日期、人员及其主 要内容
- (2) 进入施工以后对班组抽检活动的开展情况及其效果,组织互检和交接检的情况及 按果, 施工组织设计及技术变底的执行情况的记录和分析
- (3) 分项工程盾署评定, 盾号检查, 隐蔽工程验收, 上级组织的各项检查等技术活动 的日期、结果、存在问题及处理情况记录。有关领导或部门对工程所作的生产、技术方面 的决定或律议。新工艺、新材料的推广使用情况
- (4) 原材料检验结果,施工检验结果的记录。包括,日期、内容、达到的效果及未达 到要求等问题, 处理情况及结论 混凝土试块, 砂浆试块的留置组数, 时间, 以及 28 天的 强度试验报告结果。
- (5) 质量、安全、机械事故的记录、向括原因、调查分析、责任人、研究情况、处理 结论等、对人员伤亡、经济损失等的记录
- (6) 有关冷商、空更情况、交代的方法、对象、结果的记录 有关归档资料的转交时 间、对象及主要内容的记录
 - (7) 气候、气温、地质以及其他特殊情况(如停电、停水、停工待料)的记录

2 推荐阅读资料



- 1.《中华人民共和国建筑法》, 国务院法制办, 中国法制出版社。
- 2. 《建筑工程资料管理规程》(JGJ/T 185-2009)
- 3. 《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》。中华人民共和国建设部 2000 年颁布
- 4.《建设工程施工现场安全资料管理规程》(CECS 266-2009)
- 5.《建筑旅工现场环境与卫生标准》(JGJ 146-2013)

任务训练

- 1. 考察施工现场、据实填写工程概况表
- 2、依据引例工程介绍情况。分别填写 A、B、C 三个区开工报告
- 3. 收集旅工现场质量管理与职业健康有关的资料
- 4. 收集重大工程质量事故和一般工程事故案例。分析工程资料管理所起的作用。
- 5. 判断在施工日志中是否记录施工过程中发生的一切与工程有关的项目。

4.2 施工技术资料

○ 引例

本例侧重分析讨论施工技术资料包括的内容、分类及验收

广州新白云机场是国家"上五"期间重点工程项目之一、是我国第一个导入中枢机场理会而设计的机 均、也是我国第一个同期建设两条路坡的机场 新机场的智能化程度高,拥有国际上最先进的行事处理系 统, 且网络无遗传死向 第一期工程建设总投资 196 亿元,工程于 2000 年8 月 28 日正式开工,历经 4 年 多建设、于 2004 年 8 月 5 日正式遊戲, 其中机场楼的主要施工单位和工作范围是表 4-7

表 4-7 航站楼的主要施工单位和工作范围

施 工 单 位	序号	工作范围
中国建筑工程总公司	1	旅客航站楼。总承包管理及上楼和南、北市港會 架桥上部上建工程
中国建筑第八工程局	2	旅客航站楼东、西高架连廊和连接楼及指导走廊上部上建工程
中国建筑第八工程局、上海市安装工程有限公司	3	旅客航站楼安装工程
深圳:鑫特种玻璃技术股份有限公司	4	旅客航站楼上楼幕牆制作与安装工程
中山市盛兴摹墙有限公司	. 5	旅客制站楼东西连接楼幕墙制作与安装工程
陕西艺林实业有限责任公司	6	旅客航站楼东西指廊幕墙制作与安装工程
中国海外建筑有限公司	3.7	旅客航站楼公共区、办公区装修上程(标段一)
深圳华丽装修家私企业公司和深圳市深装总装饰 工程工业有限公司	8	旅客航站楼公共区、办公区装修工程(标段二)
广东省建筑装饰工程公司	9	旅客航站楼公共区、办公区装修工程(标段三)
中国建筑第三工程局、江南造船(集团)有限公司、 上海中远川崎重工钢结构有限公司联合体	10	旅客航站楼钢结构工程
广州市建筑集团有限公司、上海市机械施工公司、 浙江东南网架集团有限公司联合体	11	旅客航站楼钢结构工程
广州市电力工程公司	12	航站楼 10kV 变电站安装工程
广州市杰赛科技发展有限公司	13	航站楼控制中心与弱电机房工程
广州工程总承包集团有限公司和杭州大地网架制 造有限公司联合体	14	登机桥固定廊道 L程
企荣公司、霍高文公司和中国建筑第二工程局联 合体	15	金属屋面工程
SKYSPAN(欧洲)公司	16	索膜结构屋面体系
CRISPI、ANT 公司	17	行李自动分析系统
芬兰通力公司、日立公司、奥的斯公司	18	垂直电梯、自动扶梯、自动人行道

思考

- 1. 施工技术资料形成的清程导什么?
- 2. 旅工技术资料包括哪些内容?
- 3. 大型工程和小型工程施工技术资料有何区别?
- 4、智能化建筑在技术资料管理中有哪些分项工程?
- 5 施工组织设计包括哪些内容?
- 6. 技术交底参与人员有哪些? 交底程序是什么?
- 7. 图纸会审的主要内容有哪些?
- 8,设计变更的权利人是谁?
- 9. 工程治商记录时应注意哪些事项?

知识链接

图 4.2 是施工资料管理网络图 --- 施工技术资料




图 4.2 施工资料管理网络图 施工技术资料

4.2.1 施丁组织设计

施工组织设计是指承包单位开工前为工程所做的施工组织、施工工艺、施工计划等方面的设计,是指导拟建工程施工过程中各项活动的技术、经济和管理的综合性文件。

1. 资料要求



- (1) 施工组织设计内容要齐全、步骤清楚、层次分明、反映工程特点,有 保证工程质量的技术措施。必须在开工前编制并报审。
 - (2) 按要求及时编制单位工程施工组织设计,且先有施工组织设计后施工。
- (3) 参与编制人员应在"会签表"上签字,交项目经理签署意见并在会签表上签字,经报审同意后执行并进行下发交底。

2. 施工组织设计的内容

- (1) 工程概况:包括工程特点、建设地点、环境特征、施工条件、项目管理特点等内容。
- (2) 施工部署:包括项目的质量、进度、成本及安全目标,拟投入的最高人数和平均 人数,分包计划,劳动力使用计划,材料供应计划,机械设备供应计划,施工程序,项目 管理总体安排。
- (3) 施工方案:单位工程应按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2013) 中分部、分项工程的划分原则,对主要分部、分项工程制定施工方案;对脚手架工程、起 重吊装工程、临时用水用民电工程、季节性施工等专项工程所采用的施工方案应进行必要 的验算和说明,包括施工阶段划分、施工顺序、施工工艺、方法和施工机械的选择,安全 施工、环境保护的内容。
- (4) 施工进度计划:包括施工总进度计划、单位工程施工进度计划。施工进度计划可采用网络图或横道图表示,并附必要说明,对于工程规模较复杂的工程。宜采用网络图表示。
- (5) 资源需求计划:包括劳动力需求计划,主要材料和周转材料需求计划,机械设备需求计划,预制品订货和需求计划,大型工具、器具需求计划。
- (6) 施工准备工作计划:包括施工准备工作组织及时间安排,技术准备及质量计划,施工现场准备,管理人员和作业队伍的准备,物资、资金的准备。
- (7) 施工现场半面布置:包括施工平面布置图及说明。施工现场平面布置图应包括: 工程施工场地状况;拟建建(构)筑物的位置、轮廓尺寸、层数等;工程施工现场的加工设施、存储设施、办公和生活用房等的位置和面积;布置在工程施工现场的垂直运输设施、供电设施、供水供热设施、排水排污设施和临时施工道路等;施工现场必备的安全、消防、保卫和环境保护等设施;相邻的地上、地下既有建(构)筑物及相关环境。
- (8) 施工技术组织措施;包括保证进度目标的措施,保证质量目标的措施,保证安全目标的措施,保证成本目标的措施,保证季节施工的措施,保护环境、文明施工的措施。
- (9)项目风险管理计划:包括风险因素识别,风险可能出现的概率及损失值估计,风险管理重点,风险防范对策,风险管理责任。
- (10) 项目信息计划:包括与项目组织相适应的信息流通系统的建立,以及项目管理软件的应用。



- (11) 职业健康安全与环境管理计划。
- (12) 技术经济指标:包括指标水平高低的分析和评价,以及实施难点和对策。

施工单位编制完成施工组织设计后,应填报的工程技术文件报审表应一式两份,并应 由监理单位、施工单位各保存一份。工程技术文件报审表格式见表 4-8。

表 4-8 工程技术文件报审表

		施工编号	-			
L程名称		监理编号				
		日 期				
致	(监理单位)					
Th. 1-1-(2) 8-1-(2) - (4)	7	44 Ja ve	件,并经相关技术负责人审查批准,请引			
我方已编制完成 以审定。	1	12个人	件,并经相关技术贝贝八甲宣侃准,词:			
附:技术文件 页	·					
m: 10.10 0.11						
			理/责任人:			
专业承包单位:		项目经理/责任人:				
专业监理工程师审查	意见:					
		₽₽₽₽	监理工程师:			
		H				
总监理工程师审批意	见:					
审定结论: □同意	□修改后再报	□重卵	所编制 一			
		监	理单位:			
		总里	监理工程师:			
		В	期:			

4.2.2 危险性较大分部分项工程施工方案专家论证表

当工程中存在危险性较大分部分项工程时,为确保工程质量安全,应组织相关专家充 分论证相应施工方案。施工单位填报危险性较大分部分项工程施工方案专家论证表应一式 两份,并应由监理单位、施工单位各保存一份。危险性较大分部分项工程施工方案专家论 证表的格式见表 4-9。

表 4-9 危险性较大分部分项工程施工方案专家论证表

L程	名称			编号		
施工总	承包单位			项目负责人		
专业承	包单位			项目负责人		
分项 □	.程名称					
			专家、览表			
姓名	性别	年龄	工作单位	职务	职称	
专家论证意见	L:					
					4	羊 月 日
签字栏		组长:				
		专家:				

4.2.3 技术交底记录

技术交底是施工企业管理的一项重要环节和制度,是把设计要求、施工措施、安全技术措施贯彻到基层实际操作人员的一项技术管理方法。资料表格形式见表 4-10。

表 4-10 技术交底记录

施工单位:	年	月 日	编号:
L程名称			
参加单位及 人员			
交底人	记录人		交底日期
交底内容:			
技术负责人		作业负责	i.k

注: 参加人员均应由本人签字。



交底的具体内容

- (1) 图纸交底的主要内容如下。
- ① 包括工程的设计要求, 地基基础、主要结构和建筑上的特点、构造做法与要求, 抗 震处理, 图纸的轴线、标高、尺寸, 预留孔洞、预埋件等具体细节, 以及砂浆、混凝土、 砖等材料和强度要求、使用功能等 做到掌握设计关键, 认真按图施工
- ② 暖、卫安装分项工程技术交底内容:包括施工前的准备、施工工艺要求、质量验收 标准,成品保护要求、注意可能出现的问题。
- ③ 电气安装分项工程技术交底内容:包括施工前的准备、操作工艺要求、质量标准、 成品保护,应注意的质量问题
- ① 通风空调分项工程技术交底内容;包括施工前的准备、系统的技术要求、图纸关键 部位尺寸、位置、标高,质量要求、施工顺序、施工方法、工种之间交叉配合,设备安装 的注意事项、成品保护及可能出现的问题
- (2) 施工组织设计交底的内容:要将施工组织设计的全部内容向施工人员交代,主要包括工程特点、施工部署、施工方法、操作规程、施工顺序及进度、任务划分、劳动力安排、平面布置、施工工期、各项管理措施等。
- (3)设计变更和洽商交底的内容:将设计变更的结果向施工人员和管理人员做统一说明,避免差错。
- (4)分项工程技术交底的内容:是各级技术交底的关键,应在各分项工程开始之前进行、主要包括施工准备,操作工艺要求、技术安全措施,劳动定额,材料消耗定额,机器具使用,质量标准,成品保护要求,消灭和预防质量通病措施,新工艺、新材料、新技术的特殊要求以及应注意的质量问题
- (5)安全交底的內容:包括工程项目的施工特点和危险点及针对危险点的具体预防措施,应注意的安全事项,相应的安全操作规程和标准,发生事故后及时采取的避难和急救措施等必须实行逐级安全技术交底,纵向延伸到班组全体作业人员

4.2.4 图纸会审记录

正式施工前,由建设单位组织,设计单位、监理单位、施工单位共同参加进行图纸会 审,将施工过程中将要遇到的问题提前予以解决。

图纸会审纪要是对己正式签署的设计文件进行交底、审查和会审,对提出的问题予以 记录的技术文件。图纸会审记录范例见表 4-11。

表 4-11 图纸会审记录(范例)

编号: C2-5-008

L程名称	Ш	山东智慧建筑中心大厦				共 页 第 页			页
地点	山东智慧建筑 项目部办		记录整理人	×××		日期		××	××
参加人员	××× ××	× ×××							
序号	图号	T	图纸问题	9	Т		图:	纸问题交	底
1	结施 36(2-44)	梁 没 KL18 标注,	结施 36(2-44)/(2-Y)~(2-V)轴的 梁没有梁号及尺寸、Lla(1)/ KLl8(1)无尺寸。LL35(1)有两种 标注,以何为准,梁号是否标注 错误?			200×850 8@200(2).3聚16:3聚16.1 为L2(1),200×500; \$8@200(2) 种			6:3⊈16.L1a(1)₺ @200(2)⊈3⊈14:: L18(1)300×40 300×850 ¢8@
2	结施 36(2-42)~ (2-48)	框线技	结施 36(2-42)~(2-48)/(2-Y)轴处 框线指什么?怎么做?其他类似 框线怎么做?						
3	建施 11	口梁为	建施 11 中 D1、4 号节点与阳台封 □梁为 L5(1)200×300Φ8(ω/150(2), 2億14, 2億14(-0.050)尺寸不一致						
4	给施12	结施 12 结施墙身大样 1 上没有索引导?			平面图 与建施 16 图的索引位置一致			置一致	
5		YA29 与结构上7		ar 2		攻为 YA29a, YA29a 承台面至 面 14 2 20, 中 12@150			
6									
7									
8									
技术负责力	技: 技	术负责人	:	技术负责	人:		技	术负责力	\:
建设单位(公章) 设	计单位(公	(章)	监理单位	(公)	章)	施	工单位(公章)

知识链接

1. 图纸会审过程

各单位各专业先进行内部预审, 熟悉图纸和设计说明书, 了解设计意图、工程质量标准, 以及新结构、新技术、新材料、新工艺的技术要求, 达到采取正确的施工方法实现设计意图; 然后提出问题记录备忘, 会审时逐一解决; 会审时一般问题经设计单位同意的, 可在会审记录中注释进行修改, 并办理手续, 校大的问题必须由建设或监理、设计和施工单位洽商, 由设计单位修改, 经监理单位同意后向施工单位签发设计变更图或设计变更通知单方为有效, 如果设计变更影响了建设规模和投资方向, 要报请批准初步设计的单位问意后方准修改。

2. 图纸会审的主要内容

- (1) 设计图纸、设计说明、做法说明是否齐全、清楚、明确; 总图的建筑坐标位置与单位工程建筑平面图是否一致; 建筑物的设计标高是否可行。
- (2)建筑、结构、安装、装饰和节点大样图之间有无矛盾,设计图纸之间相互配合的 尺寸是否相符,各专业图纸之间互相配合的尺寸是否一致,预留孔洞、预埋件、大样图及 标准构配件图的型号,尺寸有无矛盾和错误。
- (3) 地基与基础的设计、结构在承载力刚度稳定性方面的设计是否合理,能否保证工程质量和安全施工 设计图纸的结构方案以及新技术新工艺能否保证
 - (4) 水电及设备安装专业施工图纸与土建专业是否一致协调、切实可行

4.2.5 设计变更通知单

设计变更是施工过程中由于设计图纸本身差错,设计图纸与实际情况不符,施工条件变化,原材料的规格、品种、质量不符合设计要求等原因,需要对设计、图纸部分内容进行修改的变更设计文件。资料表格形式见表 4-12。

表 4-12 设计变更通知单

L程名称: 编号, 砂. 1(・) 原因, 兹提出 工程变更, 请予以审批。 附件, 口变更内容 口变更设计图 口相关会议纪要 口其他 变更提出单位, A. 年 月 工程量增/减 费用增减 丁期变化 施工项目经理部(盖章) 设计单位(盖章) 项目经理(签字) 设计负责人(签字) 项目监理机构(盖章) 建设单位(盖章) 总监理 [程师(签字) 负责人(签字)

注:本表一式四份,建设单位、项目监理机构、设计单位、施工单位各一份。

4 特别提示

- (1)设计变更是施工图的补充和修改的记载,应及时办理、内容要求明确具体,必要 时附图,不得任意涂改和后补 设计变更按签订日期先后顺序编号,要求责任制明确、签 童齐全。
- (2)工程设计变更由设计单位提出、如设计计算错误、做法改变、尺寸矛盾、结构变更等问题,必须由设计单位提出变更设计联系单或设计变更图纸,由施工单位根据施工准备和工程进展情况。做出能否变更的决定。

(3)工程设计变更由施工单位提出,如钢筋代接、细部尺寸修改等施工单位提出的重大技术问题,必须取得设计单位和建设、监理单位的同意

- (4) 遇到下列情况之一时,必须由设计单位签发设计变更通知单或施工变更图纸
- ① 当决定对图纸进行较大修改时,
- ② 施工前及施工过程中发现图纸有差錯,做法或尺寸有矛盾、结构变更或与实际情况不符时。
- ③ 由建设单位提出,对建筑构造、细部做法、使用功能等方面提出的修改意见,必须 经过设计单位同意,并提出设计通知书或设计变更图纸

由设计单位或建设单位提出的设计图纸修改,应由设计部门提出设计变更联系单;由 施工单位提出的属于设计错误时,应由设计部门提供设计变更联系单;由施工单位的技术、 材料等原因造成的设计变更,由施工单位提出洽商,请求设计变更,并经设计部门同意, 以洽商记录作为变更设计的依据

4.2.6 工程洽商记录

工程治商记录是施工过程中,由于设计图纸本身差错,设计图纸与实际情况不符,施 工条件变化,原材料的规格、品种、质量不符合设计要求及员工提出合理化建设等原因, 需要对设计图纸部分内容进行修改而办理的工程治商记录文件。资料表格形式见表 4-13。

L程名称			编 号 期	
提出单位		专业名称		
治商摘要			页 数	共 页,第 页
序号	图号		治 商 内 容	
签	建设单位	设计单位	监理单位	施工单位
2	AL 04 1 III			
字栏				

表 4-13 工程洽商记录



推荐阅读资料

- 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)
- 2.《建设工程施工图设计文件审查暂行办法》建设部[2004]41号
- 3. 《建筑施工组织设计规范》(GB/T 50502-2009)
- 4.《建设工程项目管理规范》(GB/T 50326---2017)

任务训练

- 1. 归纳分析点理工程师通知回复单填写内容
- 2. 分析 占纳智能建筑 工程 合商 会涉及哪些部门和人员。如何规范填写文字
- 3. 收集建筑工程环境保护管理中关于危险原的识别与规避知识
- 4、填写《技术交底》系列表
- 5. 列出危险性较大分部分项工程

施工测量资料

引例

太例例面讨论施工测量资料及申稿分项工程的测量控制

金茂大製采用超高层建筑史上首次运用的最新结构技术,整幢大楼垂直偏差仅2cm、楼顶部的晃动连 年未都不到,这是世界高楼中最出色的。还可以保证 12 级大风不衡。同时能抗 7 度地震 上海金茂大厦 电梯配置见表 4-14~表 4-18

表 4-14	上海全苗大厦建定与白冠	*************

电梯编号	数量/台	电梯类型	载重量/kg	速度/(m/s)	服务楼层	备注
e1~e18	18	自动扶梯	1	0.50	b1~6	
p56~p57	2	观光客梯	1 600	1.75	b1~6	可观赏到浦东景色
sf58~sf59	2	消防梯	2 000	1.75	b1~6	
s60	1	服务梯	3 000	0.50	b1~2	大厦内最大货梯
s62	1	服务梯	2 000	1.00	b1	

金茂大厦裙房 6 层, 长 150m, 宽 46m, 主要功能为会展和购物。

上海金茂大厦地下 b1~b3 层主要是停车场与后勤服务设施,设置了3台电梯和1台残疾人专用电梯

表 4-15 上海金茂大厦地下停车场电梯配置

电梯编号	数量/台	电梯类型	载重量/kg	速度/(m/s)	服务楼层
p35 -p37	3	客梯	1 350	1.75	b3~2
w1	1	残疾人专用	341		b3

金茂大厦 88 层观光厅,高 340m,面积 1 520m²,是国内最高最大的观光厅,观光电梯也是中国运行 速度最快的电梯

表 4-16 上海金茂大厦 88 层观光层电梯配置

电梯编号	数量/台	电梯类型	载重量/kg	速度/(m/s)	服务楼层
p33 -p34	2	客梯	2 500	9.00	ы. 88

金茂大厦 3~50 层是可容纳 1 万多人同时办公的空间 办公区电梯共有 28 台, 分成 6 组、服务于不同的区域、满足不同的需求

表 4-17 上海金茂大厦办公区电梯配置

电梯编号	数量/台	电梯类型	载重量/kg	速度/(m/s)	服务楼层
p1 -p3	3	客梯	1 350	1.75	1, 3~6
p4~p9	6	客梯	1 600	3.50	1, 7~17
p10~p15	6	客梯	1 600	4.00	1, 18~29
p16~p21	6	客梯	1 600	4.00	1, 30~40
p22~p26	5	客梯	1 600	6.00	1, 41~50
sf39~sf40	2	消防梯	2 200	3.50	b2~1、3~5

金茂則悦大酒店是五星级超豪华大酒店, 但于上海金茂大慶 53~87 层 酒店內有 555 套豪华客房。有可成實到上海景色的各式中西餐厅、健身中心、会议设施等。酒店有 21 台电檔

表 4-18 金茂凯悦酒店电梯配置

电梯编号	数量(台	电梯类型	製置量/kg	速度/(m/s)	服务楼层
p27~p32	6	客梯	1 600	6.00	1, 2, 54
s41	1	服务梯	2 200	3.50	b1~2.53
s42	1	服务梯	2 200	3,50	b1~2.53
p43~p48	6	客梯	2 200	5.00	54~85
s49	1	服务梯	1 600	4.00	53~88
sf50~sf51	2	消防梯	1 600	4.00	51~88
sf52~sf53	2	客梯	1 600	1.00	53~56
sf54~sf55	2	客梯	1 600	1.00	85 -87

思考

- 1. 施工则量资料形成的流程是什么?
- 2. 施工期量资料包括哪些内容?
- 3. 为保障电梯安全运行,须测量哪此数据?
- 4. 楼层平面放线及标高抄剧时如何控制电梯位置?
- 5. 电梯井的垂直度、标高风景有何要求?
- 6. 电梯并与建筑物的分隔与联系部件有哪些?

知识链接

图 4.3 是施工资料管理网络图——施工测量资料

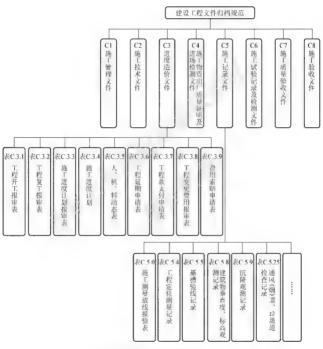


图 4.3 施工资料管理网络图 施工测量资料

4 特别提示

图 4.4 是分项工程质量验收流程图。




图 4.4 分项工程质量验收流程图

4.3.1 施工测量放线报验表

施工单位应在完成施工测量方案,红线桩的校核成果、水准点的引测成果以及施工过程中各种测量记录后,填写《施工测量放线报验申请表》,其中"专职测量员"一栏必须由具有相应资格的技术人员签字,并填写岗位证书号。

施工测量放线报验申请表格式见表 4-19(范例)。

表 4-19 施工测量放线报验申请表(范例)

	监理公司(监理)		編 上该 L 程报验申请表,请予以审	号:
附件:	放线的部位及内		The Parallem and Sec. 44 and	E. 11-321 14 o
序号	工程部位名称	测量放线内容	专职测量员(岗位证书编号)	备注
1		轴线控制线、培柱轴线 及边线、门窗洞口位置线等		30m 钢尺
2	四层6~9/	柱轴线控制线、柱边线等		DS ₃ 級 水准仪

- (2) 放线的依据材料 1 页。
- (3) 放线成果表5页。

承旬单位(意): ××××建筑工程公司 项目技术负责人: ××× 期: ××年×月×日

审查意见,

经检查,符合工程施工图的设计要求,达到了《建筑工程施工测量规程》的精度要求

项目监理机构: ××监理公司××项目监理部 专业监理工程师: ××× N 期: ××年×月×日

注: 本表由施工单位填报,建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

4.3.2 工程定位测量记录

工程定位测量是施工单位根据测绘部门提供的放线成果、红线桩及场地控制网或建筑 物控制网,测定建筑物的位置、主控轴线、建筑物土0.000 处绝对高程等,标明现场标准水 准点、坐标点位置。

工程定位测量记录填写说明如下。

- (1) 工程名称要与图纸标签栏内名称相一致。
- (2)"委托单位"填写建设单位或总承包单位。
- (3) 图纸编号应填写施工蓝图编号。
- (4)"平面坐标依据、高程依据"由测绘院或建设单位提供,应以市规划委员会钉桩坐 标为标准,在填写时应注明点位编号,目与交桩资料中的点位编号一致。
 - (5) 定位抄测示意图要标注准确、具体。
- (6)"复测结果"一栏必须填写具体数字,各坐标点的具体数值。不能只填写"合格" 或"不合格"。应由施工测量单位填写。工程定位测量记录格式见表 4-20(范例)。



表 4-20 工程定位测量记录(范例)

扇号:

T.程名称	××大学综合楼	4	托单位	××公司	
图纸编号	×××	Ħ	测日期	××年×月	1× E
平面坐标依据	測 2005-036A、方	1、D §	测日期	××年×月	1× E
高程依据	测 2003-036BMG	19	用仪器	DSI 96007	
允许误差	± 13mm	6	器校验日期	××年×月	I X E
Zi Zi	1 80 1 557 7 1 340 1 445 7 1 368 7 1 247 4 1 348				
复测结果;	1275, 1315	113号 .386 <u>.1.432</u> 本1.92 .172 _E 1.429 本1.55 .返测	6 1.443 8 F 1.017	992 [36.612] 35 G现场	+0.465
$h : = \sum_{n} - \sum_{n} = 1$	1.305 1.816 x 1.437 p 1.784 x 1	1.386 · 1.432 ★ 1.92 1.172 E 1.429 ★ 1.55	6 · 1.443	⁰⁹³ [36.612] G现场	+0.465
$h_{i_1} = \sum_{i_2} -\sum_{i_3} = \frac{1}{2}$ $h_{i_3} = \sum_{i_3} -\sum_{i_3} = -\frac{1}{2}$	1.305 1.816 A 1.437 D 1.784 A 1	1.386 · 1.432 ★ 1.92 1.172 E 1.429 ★ 1.55	6 1.443 8 F 1.017	093 [36.612] G现场	t+0. 46 5
$h_{i,i} = \sum_{i,j} -\sum_{i,j} = 1$ $h_{i,j} = \sum_{i,j} -\sum_{i,j} = -\sum_{i,j} +\sum_{i,j} = -\sum_{i,j} = -\sum_{i,j} +\sum_{i,j} = -\sum_{i,j} = -$	-0.273m -0.281m -8mm	1.386 1.172 1.172 1.429 1.53 返溯		G现场	t+0. 46 5
$h_{i_0} = \sum_{n} -\sum_{n} = +$ $h_{i_0} = \sum_{n} -\sum_{n} = -$ $f_{i_0} = \sum_{n} +\sum_{n} = -$ $f_{i_0} = \pm 5 \text{mm}$	1.305 1.816 1.305 1.816 1.437 0.1784 1.437 0.1784 1.437 0.1784 1.437 0.273m -0.281m 8mm √N = ±5mm	1.386 · 1.432 ★ 1.92 1.172 E 1.429 ★ 1.55		G现场	+0.465
$h_{i} = \sum_{n} - \sum_{n} = \frac{1}{2}$ $h_{i_{0}} = \sum_{n} - \sum_{n} = -\frac{1}{2}$ $f_{i_{0}} = \sum_{n} + \sum_{n} = -\frac{1}{2}$ $f_{i_{0}} = \pm 5 \text{mm}$ $\tilde{n} \stackrel{\text{\tiny E}}{=} h = +0.277 \text{m}$	-0.273m -0.281m 8mm $\sqrt{N} = \pm 5$ mm	1.386 1.172 1.172 1.429 1.53 返溯	·····································	G现场	
$h_{i_0} = \sum_{n} -\sum_{n} = +$ $h_{i_0} = \sum_{n} -\sum_{n} = -$ $f_{i_0} = \sum_{n} +\sum_{n} = -$ $f_{i_0} = \pm 5 \text{mm}$	1.305 1.816 1.305 1.816 1.437 0.1784 1.437 0.1784 1.437 0.1784 1.437 0.273m -0.281m 8mm √N = ±5mm	.386、1.432 本1.92 1.172 _E 1.429 本1.53 返測	·····································	合格	027-001038 施测人

注: 本表由建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各保存 一份。

4.3.3 基槽验线记录

施工測量单位应根据上控轴线和基槽底平面图,检验建筑物基底外轮廓线、集水坑、电梯井坑、垫层底标高(高程)、基槽断面尺寸和坡度等,填写《基槽验线记录》,并报监理单位审核。

重点工程或大型工业厂房应有测量原始记录,还应收集"普通测量成果"基础平面图 等相应附件。

1. 基槽验线记录填写说明

- (1)"验线依据及内容"一样填写由建设单位或测绘院提供的坐标、高程控制点或工程测量定位控制桩、高程点等,内容要描述清楚。
- (2) "基槽平面、剖面简图"一样要画出基槽平、剖面简图轮廓线,应标注 E轴线尺寸,标注断面尺寸、高程。
- (3)"检查意见"一栏将检查意见表达清楚,不得用"符合要求"一词代替检查意见(应有测量的具体数据误差)。

2. 基槽验线记录填写式样

基槽验线记录格式见表 4-21(范例)。

表 4-21 基槽验线记录(范例)

他只

					777 J .
工程名称	××大学综合楼			日期	××年×月×日
验线依据及P	9容:				
依据: (1) 祐	工图纸(图号××), 设计	十变更/洽商(编号	××)		
(2) 本	工程《施工测量方案》				
(3) 定	位轴线控制网				
内容:根据:	主控轴线和基底平面图,	检验建筑物基层	、外轮廓线、集水	坑(电梯井	·坑)、垫层标高、基槽
面尺寸	· 及边坡坡度(1·0.5)等				
悲樹平面、 台					
SETER TELLS IN	.f 101 191 531 :				
	2059	1 .			
		- T+B	v 6 850	∠ 3 850	
	200		1 0000	1 3 650	1
	3 520 m	27 000			
	6 680		1 500 L 3 850	2 350	2.500
		- + + (a)	1 1	1	7

检查意见:

经检查: ①~①③~⑧軸为基底控制轴线, 整层标高(误差: -1mm), 基槽开挖的断面尺寸(误差: +2mm), 坡度边线、坡度等各项指标符合设计要求及本工程《施工测量方案》规定,可进行下述工序施工

签		施工測量单位	××建筑	工程公司
字		专业技术负责人	专业质量员	施测人
栏				

注:本表由建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

4.3.4 楼层平面放线记录

楼层放线是指每个施工部位完成到一个水平面时,如底板、顶板要在这个平面板(顶板) 上投测向上一层的平面位置线。

1. 楼层平面放线记录值写说明

- (1)"放线部位"一栏一定应注明楼层(分层、分轴线或施工流水段)。若是建筑面积小, 没有划分施 厂流水段,就按轴线填写。
- (2)"放线内容"一栏包括轴线竖向投测控制线、各层墙柱轴线、墙柱边线、门窗洞口 位置线、垂直度偏差等。
 - (3)"放线依据"应填写加下内容。
 - ① 定位控制桩。
 - ② 测经院 BMI、BM2。
 - ③ 地下/地上××层平面(图号××)。
- (4)"放线简图"若是平面放线要标注轴线尺寸、放线尺寸、若是外墙、门窗洞口放线 要画剖而简图, 注明放线的标高尺寸。
- (5)"检查意见"一样应由监理人员填写、要表达清楚、不得用"符合要求"一词代替 检查意见。

2. 楼层平面放线记录格式(表 4-22)


表 4-22 楼层平面放线记录

			MI 7:
工程名称	××大学综合楼	日期	××年×月×日
放线部位	地下一层①~⑦/△~①轴顶板	放线内容	轴线坚向投测控制线, 塘柱轴线、边线、 门窗洞口位置线, 垂直度偏差等

放线依据:

- (1) 施工图纸(图号××), 设计变更/洽商(编号××)
- (2) 本工程《施工测量方案》
- (3) 地下二层已放好的控制桩点

放线简网:



检查意见:

- (1) ①~⑦(A~①轴为地下一层外廓纵横轴线
- (2) 括号内数据为复测数据(或结果)
- (3) 各细部轴线间几何尺寸相对精度最大偏差+2mm,90°角中误差10″。精度合格
- (4) 放线内容均已完成、位置准确、垂直度偏差在允许范围内、符合设计及测量方案要求、可以进 行下道工序施工



徒老

签	建设(监理)单位	施工单位	××建筑工程公司	
字栏	建以(鱼理)甲世	专业技术负责人	专业质量员	施测人
村.				

注: 本表由施工单位填写并保存。

4.3.5 楼层标高抄测记录

楼层标高抄测内容包括+0.5m(或+1.0m)水平控制线、皮数杆等, 施丁单位应在完成 楼层标高抄测记录后、填写《楼层标高抄测记录》、并报监理单位审核。

1. 楼层标高抄测记录填写说明

- (1)"抄测部位"·栏应根据施工方案分层、分轴线或施工流水段填写明确。
- (2) 抄测内容: 写明是+0.5m 线还是+1.0m 线标高、标志点位置、测量工具等,涉及 数据的应注明具体数据。
 - (3)"抄测依据"一栏要根据测绘院给出的高程点、施工图等。
- (4)"检查说明"栏应画简图予以说明,标明所在楼层建筑+0.5m(或+1.0m)水平控制 线标志点位置、相对标高、重要控制轴线、指北针方向、分楼层段的具体图名等。
- (5)"检查意见"一样由监理人员签署。要格检查意见表达清楚,不得用"符合要求" · · 词代替检查意见。
 - 2. 楼层标高抄测记录格式(表 4-23)

表 4-23 楼层标高抄测记录(范例)

编号:

工程名称	×××综合楼	[]划]	××年×月×日
抄測部位	地上8层%~型/⑥~圆轴墙柱	测量内容	楼层+0.5m 水平控制线
抄测依据:			•

- (1) 施工图纸(图号××), 设计变更/冷荫(编号××)
- (2) 本工程《施工测量方案》
- (3) 地上7层已放好的控制桩点

检查说明:

地上8层級~@/⑥~⑥轴墙柱+0.5m水平控制线,标高=23.3m,标注点的位置设在塘柱上 依据 《测量方案》, 在培柱上设置固定的 3 个点, 作为引测需要

测量工具, 自动容平水准仪 型号 DZS3-1 根据需要可画墙柱剖面简图平以说明, 标明重要控制轴 线尺寸及指北针方向

检查意见:

经检验: 地上 8 层图~图/⑥~图轴墙柱。+0.5m 水平控制线已接施工图纸、测量方案引测完毕、 引测方法正确。标高传递准确、误差值-2mm、符合设计、规范要求

签	建设(监理)单位	施工单位	××建筑	工程公司
字		专业技术负责人	专业质量员	施测人
栏				

注, 本表由施工单位填写并保存。



4.3.6 建筑物垂直度、标高测量记录

施工单位应在结构工程完成和工程竣工时,对建筑物进行垂直度测量记录和标高全高 讲行实测并控制记录、填写《建筑物垂直度、标高测量记录》根监理单位审核。超过允许 偏差目影响结构性能的部位,应由施工单位提出技术处理方案,并经建设(监理)单位认可 后进行处理。

- 1. 建筑物垂直度、标高测量记录填写说明
- (1)"施工阶段"一栏应填写清楚, 如"结构工程"。
- (2) 观测说明: 采用仪器类型、观测点位布置、观测时间的确定等, 均应说明。用精 度激光水准仪配合量距测得全高、垂直度。
 - (3) 观测示意图。按实际建筑物轮廓画示意图,标注观测点位置。
 - (4) "观测结果"一栏将观测的数值填上。
 - (5)"结论"一栏根据观测的数值下结论。
 - 2. 建筑物垂直度、标高测量记录格式(表 4-24)

表 4-24 建筑物垂直度、标高测量记录(范例)

编尽,

				-999 "Z ;
工程名称	××综合标	&		
施工阶段	结构工程		观测日期	××年×月×日
测量说明(附观测 (图略)	示意图):			
	垂直度测量	量(全高)	ħ	·高测量(全高)
测量部位		实测偏差/mm	观测部位	实测偏差/mm
一层	西	1、东3、北2、南1	一层	3
二层	东 2	、西1、东北-2、南1	二层	-4
三层	西	1、东2、北1、南1	三层	-3
21.16				
结论: 工程垂直度、	标高测量结	果符合设计及规范规定		
签 ************************************		施工单位	××	×建筑工程公司
建设(监	理) 単位	专业技术负责人	专业医量品	施測人

注: 本表由建设单位、施工单位各保存一份。

4.3.7 建筑物沉降观测记录

沉降观测是为保证建筑物质量满足建筑使用年限的要求,使施工过程中及竣工后的建筑物沉降值得到有效控制,设计必须标注工程竣工验收沉降值。无论何种结构类型的工程,施工单位都要对建筑物进行沉降观测。沉降观测记录、沉降量汇总表格式见表4-25 和表4-26。

表 4-25 沉降观测记录

L程名称							施工	单位				
	夠	91次		3	第2次		3	第3次			第4次	
artiata la tale tit	年	月	3	年	月	В	年	月	B	年	月	B B
观察点编号	But We con	沉降	∄/mm	标高/m	沉降的	∄/mm	And the con-	沉降	昂/mm	江		氧 mm
	标高/m	本次	累计	标尚/m	本次	累计	标高/m	本次	累计	标高/m	本次	累计
					1	1.						
				1	1	1.						
工程部位			10	11.	•		and a	1				
观测人员												
监测人员						1.	1					
施上单位 项目负责人												
监理工程师												

表 4-26 沉降量汇总表

L程名称	设计允许沉降量	
观测点编号	总沉降量/mm	备注
1		
2		
3		
4		
 		•

沉降观测点布置示意图



为防止地基不均匀沉降引起结构破坏、按设计要求及有关规范规定、对新建工程以及

受其影响的邻近建筑均要进行沉降观测、并做好沉降观测记录。

(1) 沉障观测的次数和时间,应符合设计要求 当设计无明确规定时,一般建筑可在基础完成后开始观测:大型、高层建筑、可在基础垫层或基础底部完成后开始观测。

民用建筑可每加高 1~2 层观测一次,工业建筑可接不同施工阶段(如回填基坑、安装柱于和屋架、砌筑墙体、设备安装等)分别进行观测,如建筑物均匀增高,应至少在增加荷载的 25%、50%、75%和 100%耐各测一次,整个施工期间的观测不得少于5次。雨季和冬期过后应补充观测。施工过程中如暂时停工,在停工及复工时应各测一次。停工期间,可每隔 2~3 个月观测一次。建(构)筑物坡工后,一般情况,第一年观测 3~4次,第二年观测 2~3次,第三年后每年观测 1次,直至稳定为止。

- (2) 沉降观测资料应及时整理和妥善保存, 并应附有下列各项资料
- ① 根据水准点测量得出的每个观测点高程和其逐次沉降量。
- ② 根据建筑物和构筑物的平面图绘制的观测点位置图,根据沉降观测结果绘制的沉降量、地基荷载与连续时间三者的关系曲线图及沉降量分布曲线图
 - ③ 计算出的建筑物和构筑物的平均沉降量、相对弯曲和相对倾斜值
 - ④ 水准点的平面布置图和构造图。测量沉降的全部原始资料



推荐阅读资料

- 1. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)
- 2.《建筑地茶基础工程施工质量胎收规范》(GB 50202-2002)
- 3. 《居面工程质量验收规范》(GB 50207-2012)
 - 4.《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)

任务训练

- 1. 收集著名建筑物沉降观测数量, 分析观测技术的讲程
- 2. 整理一个小型建筑工程测量资料
- 3. 收集目前最先进测量仪器的资料并备档
- 4. 考察周边建筑物的观测点
- 5. 收集居住地全国大地网测量控制数据并备档

4.4 施工物资资料



本例侧重于讨论施工过程物资资料的分类、整理、使用和归档

日 阿泽 厚 回 12 條住宅接全部采用地板采暖方式。配合分户计量改革和建筑物保 基技术应用、整个小区达到环保节能效果



- 1. 施工物资资料形成的流程是什么?
- 2. 施工物资资料包括哪些内容?
- 3. 如何判断哪些施工物资需要进行材料试验?
- 4. 哪些属于施工物资?
- 5、设备开箱检验的检查单位和验收单位相同吗?
- 6 材料、构配件进场检验的项目有哪些?
- 7. 给排水和采暖工程物质所需质量证明文件有哪些?

知识链接

图 4.5 是施工资料管理网络图——施工物资资料

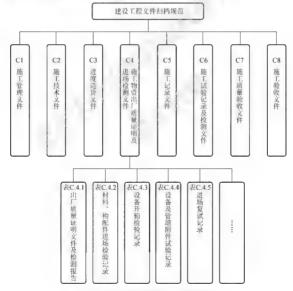


图 4.5 施工资料管理网络图 — 施工物资资料



特别提示

图 4.6 是工程物资管理流程图。




图 4.6 工程物资管理流程图

4.4.1 常用物资所需质量证明文件

建筑给水排水及采暖工程常用物资所需质量证明文件及要求见表 4-27(范例)。

表 4-27 常用物资所需质量证明文件及要求(范例)

物资名称	异等	供应单位提供的质量证明文件	检验报告应含基本检测项目
镀锌钢管	1	质量证明书	
无缝钢管	2	质量证明书	
焊接钢管	3	质量证明书	
- 次镀锌管道及附件	4	质量证明书、检验报告	镀锌层厚度、附着强度、外观

续表

			疾 表
物资名称	序号	供应单位提供的质量证明文件	检验报告应含基本检测项目
建筑给水塑料管道	5	质量证明书、检验报告、备案证明	生活饮用给水管道的卫生性能、织 向回缩率、维卡软化温度等
建筑排水塑料管道	6	质量证明书、检验报告、备案证明	纵向回缩率、维卡软化温度等, 旋消音管材要有消声检测证明
铜管道及配件	7	质量证明书、检验报告	生活饮用给水管道的卫生性能
柔性接口排水铸铁管	8	质量证明书、产品合格证、备案证明	
不锈钢管	9	质量证明书、检验报告	生活饮用给水管道的卫生性能
钢管外涂塑管道 (室外景观)	10	质量证明书	涂覆材料、涂层颜色、外观质量 涂层厚度、针孔检测、附着力
法兰	-11	产品合格证或质量证明书、检验报告	国标或行标
沟槽连接件	12	质量证明书、检验报告	用于生活饮用水系统应有胶圈 I 生性能
快速接头(园林绿化)	13	产品合格证、检验报告	壳体试验、密封试验、上密封试验 连接尺寸、标志包装、铸件质量 表面质量、装配质量、阀体壁厚
刚性密闭套管	14	质量证明书(外购)	
柔性防水套管	15	质量证明书(外购)	
人防密闭套管	16	质量证明书(外购)	
型钢(角钢、槽钢、扁钢、 工字钢)	37	质量证明书	
电焊条 /、、、	- 18	产品合格证、质量证明书	
水表、热量表	19	产品合格证、计量检定证书	
压力表、温度计	20	产品合格证	
各种阀类(截止阀、闸阀、 蝶阀、球阀等)	21	产品合格证、检验报告	强度、严密度
安全阀、减压阀	22	产品合格证、调试报告及定压合格证 书	
消防供水设备、消火栓箱	23	产品合格证、检验报告	强制检验
消火栓、灭火器、消防接口、消防枪炮、防火阻燃 材料	24	产品合格证、检验报告	型式认可
水喷头、湿式报警阀、水 流指示器、消防用压力开 关、消防水带	25	产品合格证、检验报告	强制认证
散热器	26	质量证明书、检验报告	耐压强度、热工性能
整体或拼装水箱	27	质量证明书、检验报告 (生活水箱)	卫生性能

44.45

			* 失 仪
物资名称	序号	供应单位提供的质量证明文件	检验报告应含基本检测项目
卫生洗具	28	质量证明书、检验报告、备案证明	冲击功能、吸水率、抗龟裂试验、 水封试验、污水排放试验,环保 检测
疏水器、过滤器、除污器	29	质量证明书	
地漏、清扫口	30	产品合格证	
金属波纹补偿器	31	产品合格证、检验报告、成品补偿 器预拉伸证明书	外观、尺寸偏差、形位偏差、补偿 量、刚度检测、应变、耐压力、气 密性、稳定性
绝热材料	32	产品合格证、检验报告	容重、导热性能、燃烧性能
布基胶带	33	产品合格证、检验报告	总厚度、初粘、持粘、剥离力、抗 拉强度
锅炉、压力容器	34	质量证明书、检验报告、安装使用 说明书	焊缝无损探伤
热交换器	35	质量证明书、安装使用说明书	
水泵、变频供水设备	36	产品合格证、质量证明书、安装使 用说明书	

特别提示

- (1) 各类管材应有产品质量证明文件
- (2) 阀门、调压装置、消防设备、卫生洁具、给水设备、中水设备、排水设备、采暖设备、热水设备、散热器、锅炉及附属设备、各类开(闭)式水箱(罐)、分(集)水器、安全阀、水位计、减压阀、热交换器、补偿器、疏水器、除污器、过滤器、游泳池水系统设备等应有产品质量合格证及相关检验报告
- (3)对于国家有规定的特定设备及材料,如消防、卫生用的压力容器等,应附有相应 資质檢验单位提供的檢验报告。如:安全阀、减压阀的调试报告、锅炉(承压设备)焊缝无 损探伤检测报告、给水管道材料卫生检验报告、卫生器具环保检测报告、水表和热量表计 量检定证书等
 - (4) 绝热材料应有产品质量合格证和材质检验报告。
 - (5) 主要设备、器具应有安装使用说明书。
 - (6) 对涉及建筑工程质量、安全、节能、环保的建筑材料。实行供应备案管理。
- (7) 已实施产品强制认证制度的消防产品包括:点型感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、火灾报警控制器、洒水喷头、湿式报警阀、水流指示器、消防用压力开关、消防水带、手动火灾报警按钮、消防联动控制设备 实施型式认可制度的消防产品包括:灭火剂、防火门、消火栓、灭火器、消防接口、消防枪炮、消防应急灯具、火灾报警设备(可燃气体报警控制器、可燃气体探测器、家用可燃气体报警器)、防火阻燃材料(钢结构、饰面

- 型、电缆、无机防火堵料、有机防火堵料、阻火包)。实施强制检验制度的消防产品包括: 气体灭火系统、干粉灭火系统、气溶胶灭火系统、防火赛帘门、防排烟风机、防火阀、排 烟防火阀、消防供水设备、消火栓箱等。
- (8) 境内制造、使用的锅炉压力容器、制造企业必须取得《中华人民共和国锅炉压力 容器制造许可证》。
- (9) 安装于建筑工程中用于贸易结算的电度表、水表、煤气表、热量表等计量仪表的 生产厂家必须提供产品合格证和法定计量检测单位出具的计量检定证书。
- (10) 国家实施生产许可证产品目录包括: 电焊条、空气压缩机、家用燃气快速热水器、 泵、燃气调压器(箱)、铜及铜合金管材、耐火材料、锅炉及压力容器用钢管(管坯)、锅炉、 压力容器用钢板、制冷设备等产品。

4.4.2 工程材料/构配件/设备报审表

工程物资进场后, 施工单位应对拟采用的构配件和设备进行检测、测试, 合格后境写 《工程材料/构配件/设备报审》, 附齐主要原材料复试结果、备案资料、出厂质量证明文件等。 报项目监理部,监理工程师签署审查结论。

1. 相关规定及填写说明

- (1) 工程材料/构配件/设备报审是承包单位对拟进场的主要工程材料、构配件、设备。 在自检合格后报项目监理机构进行进场验收。
- (2) 对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备,监理人员应拒绝 签认,承包单位不得在工程上使用,并应限期将不合格的材料、构配件、设备撤出现场。
 - (3) 拟用于部位: 指工程材料、构配件、设备拟用于工程的具体部位。
 - (4) 材料/构配件/设备清单: 按表列括号内容用表格形式填报。
- (5) 工程材料/构配件/设备质量证明资料;指生产单位提供的证明材料/构配件/设备质 量合格的证明资料,如合格证、性能检测报告等。凡无国家或省正式标准的新材料、新产 品、新设备应有省级及以上有关部门鉴定文件。凡进口的材料、产品、设备应有商检的证 明文件。如无出厂合格证原件,有抄件或原件复印件亦可。但抄件或原件复印件上要注明 原件存放单位, 抄件人和抄件、复印件单位签名并盖公章。
- (6) 自检结果: 指所购材料、构配件、设备的承包单位对所购材料、构配件、设备, 按有关规定进行自检及复试的结果。对建设单位采购的主要设备进行开箱检查监理人员应 进行见证, 并在其开箱检查记录签字。复试报告一般应提供原件。
- (7) 专业监理工程师审查意见:专业监理工程师对报验单所附的材料、构配件、设备 清单、质量证明资料及自检结果认直核对, 在符合要求的基础上对所进场材料、构配件、 设备进行实物核对及观感质量验收、查验是否与清单、质量证明资料合格证及自检结果相 符、有无质量缺陷等情况、并将检查情况记录在监理工作日志中、根据检查结果、如符合 要求,将"不符合""不准许"及"不同意"用横线划掉。反之,将"符合""准许"及"同 意"划掉,并指出不符合要求之处。

2. 工程材料/构配件/设备报审表格式(表 4-28)

工程名称: ××工程	编号: B06-00
致: ××些理公司(监理单位)	
我方于 $\times \times$ 年 \times 月 \times 口进场的工程材料/构配件/设备数量如下(见附件)。	现将质量证明文件及自检结
果报上, 拟用于下述部位: 二层给排水管道及部件安装	, 请予以审核。
附件:	
1. 数量清单	

L程材料 构配件/设备名称	主要规格	单位	数量	取样报审表编号
镀锌铜管	DN200	m	$\times \times$	××××
PVC 塑料管	DN200	m	××	××××

2. 质量证明

(1) 出厂会格证5页(如出厂会格证无原件,有抄件或原件复印件亦可,但抄件或原件复印件上要注 明原件存放单位, 抄件人和抄件, 复印件单位答名并盖公章)

- (2) 厂家质量检验报告5页
- (3) 进场复试报告5页(复试报告一般应提供原件)
- 3. 自检结果

工程材料质量证明资料亦全、观感质量及进场复试检验结果合格

承包单位(章): ××建筑工程公司 项目经理:XXX 期:××年×月×日

审查意见:

经检查上述工程材料,构配件/设备,符合/不符合设计文件和规范的要求,准许 不准许进场,同意/ 不同意使用干拟定部位。

> 项 目 监 理 机 构: ××监理公司××项目监理部 总/专业监理工程师: XXX 期: ××年××月×日

4.4.3 材料、构配件进场检验记录

材料、构配件进场后,应由建设、监理单位会同施工单位共同对进场物资进行检查验 收,填写《材料、构配件进场检验记录》。

1. 进场检验规定及要求

对讲场物资进行检查验收, 主要检验项目包括如下内容。

- (1) 物资出厂质量证明文件及检测报告是否齐全。
- (2) 实际进场物资数量、规格和型号等是否满足设计和施工计划要求。
- (3) 物资外观质量是否满足设计要求或规范规定。
- (4) 按规定须抽检的材料、构配件是否及时抽检。

工程采用施工总承包管理模式的, 签字人员应为施工总承包单位的相关人员。

2. 材料、构配件讲场验收记录填写说明

- (1) 按规定应进场复试的工程物资,必须在进场检查验收合格后取样复试。
- (2) 表格内检验项目应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)第 3.2.1 条、第 3.2.2 条填写, 为"品种、规格、外观、质量合格证明文件"。
- (3) 抽检比例也要依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002) 相关条目规定。
 - (4) 本表由施工单位填写并保存。
 - 3. 材料、构配件进场检验记录格式(表 4-29)

表 4-29 材料、构配件进场检验记录

他早, C4 31 007

工程名称		名称 ×× E程			检验日期	××年×月×日	
序号	名称	规格	进场	生产厂家	检验项目	10 00 / 1 00 00 00 10	
13-13	右仰	型号	数量	合格证号	作证的证书 则 [1]	检验结果	各注
1	铜三通	80×40	5		品种、规格、外观、质量 合格证明文件	合格	
2	铜套法兰	50	20	34	品种、规格、外观、质量 合格证明文件	合格	
3	铜大小头	50×40	5		品种、规格、外观、质量 合格证明文件	合格	
4							
5							

品种、规格、外观、质量合格证明文件符合设计及施工质量验收规范要求。

签	建设(监理)单位	施工单位		
字	建以[而理]早世	专业质量员	专业工长	检验员
栏				

注, 本表由施丁单位填写并保存。

4.4.4 设备开箱检验记录

建筑给水排水及采暖工程所使用的设备进场后,应由施工单位、建设(监理)单位、供 货单位共同开箱检查,并进行记录,然后填写《工程物资进场报验单》报请监理单位核查 确认,并填写《设备开箱检查记录》。



1. 设备的种类

设备的种类主要包括各类消防设备、给水设备、中水设备、排水设备、采暖设备、热 水设备、游泳池水系统设备、锅炉及辅助设备: 卫生洁具: 散热器: 各类开(闭)式水箱(罐)、 分(集)水器、压力容器。其他设备。

2. 设备开箱检查的主要内容

检查项目主要包括:设备的产地、品种、规格、外观、数量、附件情况、标识和质量 证明文件、相关技术文件等。

3. 相关规定及要求

- (1) 设备必须具有中文质量合格证明文件, 规格、型号及性能检测报告应符合国家技 术标准或设计要求, 进场时应做检查验收。
 - (2) 主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。
 - (3) 在运输、保管和施工过程中, 应采取有效措施防止损坏或腐蚀。

4. 设备开箱检验注意事项

- (1) 对于检验结果出现的缺损附件、条件要列出明细、待供应单位更换后重新验收。
- (2) 测试情况的填写应依据专项施工及验收规范相关条目,如步格中的"离心水泵" 可参照《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》(GB 50275-2010)。

【标准规范】

5 设备开箱检验记录填写说明

- (1) 凡有数据要求的项目必须填写实际测量的数据。
- (2)"检查结果"栏需进行详细记录,对于发现包装、文件、部件的缺损 情况应做出准确的文字描述。没有数据要求的项目可填写"符合规范要求" 的字样。
- (3) 在实际检查未涉及表格所列的项目时,可将此项目用"/"在"检查结果"栏中划除。
- (4) 发现的问题必须由建设(监理)单位、供应单位和安装单位形成共同的处理意见, 将 形成的处理意见填写在表格的"处理意见"栏中,各单位各保存一份,以备对处理意见解 决情况讲行核实检查。

6. 设备开箱检验记录格式(表 4-30)

表 4-30 设备开箱检验记录(范例)

编号。C4-26-006

				別行 フ: C4-20-000		
	设备名称	离心水泵	检查日期	××年×月×日		
	规格型号	×××	总数量	×××台		
	装箱单号	×××	检验数量	×××台		
	包装情况	包装完整良好, 无损坏	,标识明确			
检	随机文件	设备装箱单1份。中文	质量合格证明1份,安装值	 电用说明书 1 份		
验记	备件与附件	配套法兰、螺栓、螺母	等齐全			
北京	外观情况	外观良好。无损坏锈蚀现象				
20	测试情况	良好				

续表

检	缺、损附备件明细表								
验	序号	名称	规格	单位	数量	备注			
结									
果									
要求	克备包装、外观 私	k况、测试情况:	沒好 随机文件、	备件与附件系引	全,符合设计及施	工质量验收规范			
签	建设(监理)单位		施工单位		供应单位				
字									
124									

4.4.5 设备及管道附件试验记录

设备、阀门、密封水箱(罐),成组散热器及其他散热设备于安装前均应按规定进行强 度试验并做记录。填写《设备及管道附件试验记录》。

设备、密封水箱(罐)的试验应符合设计,施工质量验收规范或产品说明书的规定。设 备及管道附件试验记录格式见表 4-31(范例)。

表 4-31 设备及管道附件试验记录

设备	及管道附件试验记录	- 资料编号	C6-21-007 给水系统	
L程名称	山东建筑中心大厦	系统名称		
设备/管道 附件名标	(網河II	试验日期	××年×月×日	

阀门公称压力为1.6MPa, 非金属密封;强度试验压力为公称压力的1.5倍、严密性试验压力为公称 压力的 1.1 信: 强度试验时间为 60s. 严密性试验时间为 15s: 试验压力在试验时间内应保持不变, 且壳 体填料及阀瓣密封面无渗漏

	型号、材质	铜闸阀	钢球阀	
	规格	DN25	DN15	
	总数量	300	1 450	
	试验数量	30	145	
公	称或工作压力/MPa	1.6	1.6	
	试验压力降/MPa	0	0	
	渗漏情况	无渗漏	无渗漏	
	试验结论	合格	合格	
pue.	试验压力/MPa	1.8	1.8	
密	试验持续时间/s	30	30	
性	试验压力降/MPa	0	0	
ù¢.	渗漏情况	无渗漏	无渗漏	
验	试验结论	合格	合格	

继来

签	施工单位	山东智慧建筑公司	专业技术负责人	专业质量员	专业工长
12	98 1. TE		××	××	××
栏	监理(建设)单位	山东智慧」	山东智慧监理公司		××

注: 本表由施工单位填写, 建设单位、施工单位各保存一份。




推荐阅读资料

- 1. 《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002)
- 2. 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007)
- 3.《建设项目环境保护管理条例》。2017年中华人民共和国国各院今第682号

任务训练

- 1. 收集并填写室内给水管道及配件安装质量验收表
- 2. 参与排水设备安装质量验收
- 3. 根据实际工程填写室外供热管道及配件安装验收表
- 4. 列出进场物资合格证明资料汇总表
- 5. 收集工程质量事故中涉及施工物资的案例



🛕 引例

本例侧垂干讨论施工记录资料的分类, 整理, 归档与使用

建筑物场地土类别为Ⅱ类,抗震设防烈度为7度。

北工程是一陸現代化集商场、办公、餐飲、酒店式公寓于一体的综合性太ځ 地下一、二层为人防地下室、平时为汽车库、设置铺风接气条统和防持烟系统、榴房为大型商场和餐飲 建筑大楼采用智能化中央控制条统、其灯气控制多样化解决方案、提高了建筑价值、为办公室区配备的 PAC2 照明主机与 12 键 可编程智能面极的控制方式、能够实现对区域内所有荧光灯光源进行调光和开关控制 这种智能化控制包括照明、空调、窗窗插廊及所有用电设备。

思考

- 1. 旅工记录资料形成的流程是什么?
- 2. 施工记录资料包括哪些内容?

- 3. 电气分部工程包括哪些子分部工程?
- 4. 电气照明安装工程的施工记录有哪些?
- 5. 隐蔽工程验收与施工检查有何联系与区别?
- 6. 交接检查记录的责任方涉及哪几个?
- 7. 系统试运行记录属于施工记录吗?

知识链接

图 4.7 是施工资料管理网络图——施工记录。

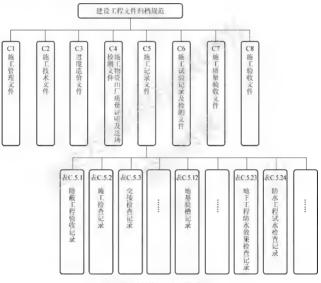


图 4.7 施工资料管理网络图 -施工记录

4.5.1 隐蔽工程验收记录

隐蔽工程验收是保障工程质量的重要措施,每一个涉及建筑工程质量与安全的分项(子分项)工作皆应实行隐蔽工程验收。

1. 隐蔽工程检查记录道写说明

- (1)隐蔽下程项目施工完毕后,施工单位应进行自检,自检合格后,申报建设(监理) 单位会同施工单位共同对隐蔽下程项目进行检查验收并填报《隐蔽工程检查记录》。
- (2) 主要检查内容包括:应根据隐蔽工程的检查项目和内容认真进行检查,不得落项, 隐检内容应根据规范要求填写齐全、明了、检查结果和结论齐全。
 - (3) 隐蔽 厂程检查应及时, 自检合格后向监理报验。签验的时限不应与上建进度相矛盾。
 - (4) 当检查无问题时,复查意见栏不应填写。
- (5) 编号栏的填写应参照材料、构配件进场检验记录中编号栏的填写说明进行填写,但顺序号填写时应注意,由于隐蔽工程涉及多个分项工程,所以顺序号应根据分项工程的不同。按各检查项目分别从 001 开始连续编号。
 - (6) 要求无未了事项。
- ① 表格中凡需填空的地方,实际已发生的,如实填写:未发生的,则在空白处画斜杠"/"。
- ② 对于选择框,有此项内容,在选择框处画"√",若无此项内容,可空着,不必画"×"。
- (7) 对于隐蔽工程检查记录表不适用的其他重要工序,应按照现行规范要求进行施工质量检查。并填写施工检查记录表(通用)。
 - 2. 隐蔽工程验收记录格式(表 4-32~表 4-35)

表 4-32 隐蔽工程(随工检查)验收表

系统名称:	综合布线系统	200	X 27.5	編号: C5-1-002
	建设单位	施工	「単位、 \ ~	监理单位
	×××公司。 l	××	×公司 ′	×××公司
	to the object		检查结	4果
隐蔽工程	检查内容	安装质量	楼层(部位	() 图号
(随 L检 查)内容	暗配管	√	-:层	弱电 7
与检查				

验的音句.

符合相关验收规范及图纸剪求。

建设单位/总包	单位	施工单位				监理单位			
验收人:		验收人:				验收人:			
日期: 年 盖章:	月日	日期: 盖章:	年	月	日	日期: 盖章:	年	月	Ħ

注:

- (1)检查内容包括:①管道排列、走向、弯曲处理、固定方式;②管道连接、管道搭铁、接地;③管口安放护圈标识;④按线盒及桥架加盖;⑤线缘对管道及线间绝缘电阻;⑥线缆接头处理等。
- (2) 检查结果的安装质量栏内,按检查内容序号,合格的打"√",不合格的打"×",并注明对应的楼层(部位)、图号。
- (3) 综合安装质量的检查结果,在验收意见栏内填写验收意见并扼要说明情况。

表 4-33 隐蔽工程检查验收记录

工程名称				施工单位			
隐蔽项目部位				分包单位			
图号				检查日期			
隐蔽内容							
施工单位检查结果:				监理(建设)单位检查结论:			
专业负责人:				监理工程师:			
				(建设单位项目专业负责人)			
	年	月	日		年	月	E

表 4-34 钢筋隐蔽工程检查验收记录

单位(子单位) L 程名称	分部(子分部)」	[程名称		
总承包施工单位	项目负责人		验收部位	
专承包施工单位	项目负责人	1	施工图名称及	图号
检查项目	施工单位自检	记录	监理(建设)单 位验收意见	备注
1. 材料使用申报及检验情	况 符合设计及规范要	求		
2. 检验批的划分及检查情	況 符合设计及规范要	求		
3. 设计变更	龙			
4. 受力钢筋的品种、级别 规格和数量	符合设计及规范要	求		
5. 接头型式及检验报告	符合要求			
6. 接头位置和数量	符合要求			
7. 保护层厚度及控制措施	符合设计及规范要	求		
8. 抗震构造措施	符合设计及规范要	求		
专业工长 专业 (施工) 承包 (签名)	施工班 组长 (签名)	监理		
施工 单位 检查 范要求,本检验符 项目专业质量员(签名); 项目负责人(签名);		(建设) 单位 验收 结论	总监理工程师(签名) 专业监理工程师(签名) (建设单位项目专业社	图):

表 4-35 隐蔽工程检查记录

编号:

□ 下程名称					
隐检部位 地上、层⑤~①⑥~⑥ 轴线 +8.90 标高 隐检依据:施工图图号 电-8 ,设计变更治前(编号 /)及有关国家现行标准等。 提應 PVC 管 隐检内容: (1) 避需引线共 26 处,分别利用轴(3、①、轴(3、②····································	L程名称	××大厦			
隐检依据:施工图图号 电8 ,设计变更/治前(编号 /)及有关国家现行标准等。	隐检项目	避雷引线	隐蔽日期	××年×月	×П
D及有关国家现行标准等。 提展 PVC 管 提展 PVC 管	隐检部位	地上::层⑤~①©~①	轴线	+8.90	标高
主要材料名称及规格/型号	隐检依据: 施	C图图号 电-8		,设计变更/治	商(编号
隐检内容: (1) 避常引线夹 26 处,分别利用轴⑥、①、轴⑥、③·········处两根 25mm 柱主筋上下对应5 符合电气施工图纸 (2) 柱主筋采用搭接焊接 焊接长度大于铜筋直径的 6 倍,且两面施焊;药皮已清除,并 现象(柱筋进接采用压力埋弧焊等做法时,可按实填写) 以上隐检内容已做完、清予以检查 申报人: 检查意见: 经检查:避需引线位置、施工做法、核主筋搭接符合设计要求及《建筑电气工程施工质量 (GB 50303—2015)的要求 检查结论: 図同意隐蔽、 】 □不同意,修改后进行复置 复查结论: 望 查 人: 复查日期:	1)及有关国家现行	F标准等 。	
(1) 避需引线共26 处,分别利用+(A)、(B)、(G)、(G)、(G)、(G)、(G)、(G)、(G)、(G)、(G)、(G	主要材料名称。	及规格/型号	硬质 PVC 管		
申报人: 检查意见: 经检查: 適需引线位置、施工做法、柱主筋格接符合设计要求及《建筑电气工程施工质量(GB 50303—2015)的要求 检查结论: 园间意隐蔽。] □不同意。修改后进行复置复查结论: 复查	(1) 避當引 符合电气施工 (2) 柱主於	图纸 5采用搭接焊接 焊接长度	大于钢筋直径的 6 倍		
GB 50303—2015)的奏求 检查结论: 図問意隐蔽 . □ 不同意,修改后进行复型 复查结论:	检查意见:				申报人:
复査 人: 复査日期: 签 建设(佐海県) 単位 ※×建筑工程公司	(GB 50303—20)15)的要求	柱主筋搭接符合设计:		
2 建设(监理)单位	复查结论:				24 22 7 41
注度(型法)由1//	签 加加州	施工单位	××建筑	寬工程公司	
字 专业技术负责人 专业质量员 专业工长	字 建设(监与	专业技术负	贵人 专业质	业 员	专业工长

知识链接

主要隐检项目及内容如下。

- (1) 各种桩基工程桩头处理补救措施等。
- (2) 砌体工程中的特殊防裂措施。现场预制混凝土小构件钢筋隐蔽检查验收
- (3) 框架结构中填充墙与框架中的拉结筋留置情况检查。
- (4) 混凝土工程后浇带、施工缝留置方法、位置和接槎的处理等
- (5) 阳台栏板焊接或二次浇筑混凝土: 焊口质量外观检查、混凝土接淹处理。大楼板

的连接筋焊接。预制阳台和楼梯尾筋焊接检查。

- (6) 钢结构工程中地脚螺栓、预埋件位置、数量、标高、焊接焊缝的外观质量检查等。
- (7) 地下防水工程变形缝、施工缝、后浇带接槎情况、穿墙管道,预埋设置,转角的做法等。
 - (8) 屋面工程找平层、保温层、防水层做法及细部检查等。
- (9) 有防水要求地面的基层处理,垫层、找平层、防水材料品种规格、铺设厚度、方式、标高、密封处理、黏结情况等。
 - (10) 工程质量问题处理、结构补强等。
 - (11) 装饰装修工程。
 - ① 具有加强措施的抹灰工程检查加强构造的材料规格、铺设、固定、搭接情况等。
- ② 门窗工程检查预理件和锚固件、螺栓等规格数量、位置、间距、预理方式、与框的 连接方式、防腐处理、缝隙填嵌、密封材料的黏结等
- ③ 吊顶工程检查吊顶龙骨及吊件材质、规格、间距、连接方式、固定方法、表面防火、防腐处理、外观情况、接缝和边缝情况、填充和吸声材料的品种、规格、铺设、固定情况等
- ④ 轻质隔墙工程检验预理件、连接件、拉结筋的规格位置、数量、连接方式、与周边墙体及顶棚的连接、龙骨连接、间距、防火、防腐处理、填充材料的设置等
- ⑤ 饰面板(砖)工程检验预埋件、后置埋件、连接件规格、数量、位置、连接方式、防腐处理等。有防水构造的部位应检查找平层、防水层的构造做法,材料品种、规格、表面情况、密封处理、黏结情况等
- ⑥ 幕墙工程检查幕墙与主体结构选接的各种预理件、选接件、紧固件的规格、数量、 位置、选接方式、防腐处理等 构件之间以及构件与主体结构的选接点的安装及防水处理; 幕墙四周、幕墙与主体结构之间间隙节点的处理、封口的安装; 幕墙伸缩缝、沉降缝、防 震缝及墙面转角节点的安装; 幕墙防火、隔烟节点; 幕墙防雷接地节点的安装等。
- ⑦ 细部工程检查预理件、后置埋件和连接件的规格、数量、位置、连接方式、防腐处理等
- ⑧ 居住和民用建筑节能(屋面、外墙、外门窗及玻璃、地面、非采暖公共间等)工程的 隐蔽验收应依据发生項目按規定的要求进行记录

特别提示

- (1) "隐检内容"应将隐检的项目、具体内容描述清楚 包括主要原材料名称、规格,型号及试(检)验报告编号,主要选接件的复试报告编号,主要施工方法,若文字不能表述清楚,可用示意简图或采用照片进行说明。
 - (2) 混凝土结构分项工程隐蔽检查。
- 漁筑混凝土之前,应按检验批进行钢筋隐蔽检查,每楼层应按验收时间分别做记录 (每楼层至少分两次记录),由施工单位、监理(建设)单位对隐蔽工程进行验收签字确认。
 - ② "受力钢筋品种、规格、数量、位置等" 栏中纵向受力钢筋、箍筋、横向钢筋的品

种、规格标注齐全不应遗漏;位置应标注柱、梁、塘、板、阳台、楼梯等;数量应标注间 距及范围。

- ③"钢筋连接方式、接头位置数量、接头面积百分率"栏,钢筋连接方式应标注受力钢筋品种,规格采用机械连接或焊接、绑扎搭接接头,数量应与试验报告内容一致;接头位置相互错开;接头面积百分率应标注明确,符合施工现场执行规范和设计的具体要求。
- ④ "預理件规格、数量、位置"栏、预理件的位置应标注阳台、楼梯和外檐的规格、数量等具体情况,构造筋(胡子筋)的位置、数量、钢筋等
- ⑤ "除锈和油污钢筋代用、其他" 栏,应按规范要求进行检查记录,其他项应注明保护层及铸族应证明的内容。

知识链接


建筑电气工程隐检内容

- (1) 埋于结构内的各种电线导管:检查导管的品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、管盆固定、管口处理、敷设情况、保护层、需焊接部位的焊接质量等。
- (2)利用结构钢筋做的避雷引下线:检查轴线位置、钢筋数量、规格、搭接长度、焊接盾量、接地板、避雷网、均压环等连接点的焊接情况。
- (3) 等电位及均压环暗埋:检查使用材料的品种、规格、安装位置、连接办法、连接 后署 保护层履序等。
- 质量、保护层厚度等。 (4) 接地极装置埋设: 检查接地极的位置、间距、数量、材质、埋深、接地极的连接
- 方法、连接质量、防腐情况等。 (5) 金属门窗、幕墙及避雷引下线的连接: 检查连接材料的品种、规格、连接位置和 射量, 连接方法和质量等。
- (6) 不进人吊顶内的电线导管:检查导管的品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、需焊接部位的焊接质量、管盒固定、管口处理、固定方法、固定间距等。
- (7) 不进人吊顶内的线槽:检查材料品种、规格、位置、连接、接地、防腐、固定方法、固定间距及其他管线的位置关系等。
- (8) 直埋电缆: 检查电缆的品种、规格、埋设方法、埋深、弯曲半径、标桩埋设情况等。
- (9) 不进人的电缆沟敷设电缆:检查电缆的品种、规格、弯曲半径、固定方法、固定间距、标识情况等。

3. 预检记录

电气工程预检记录是施工重要工序进行的预先质量控制检查记录。预检工程项目施工 完毕后,施工单位应由专业技术负责人、工长、质检员共同进行检查。

- (1) 建筑电气工程预检记录内容如下。
- ① 电气明配管(包括进入吊顶内): 检查导管的品种、规格、位置、连接、查 扁度、弯曲半径、跨接地线、焊接质量、固定、防腐、外观处理等。
- ② 明装线槽、桥架、母线(包括能进人吊顶内); 检查材料的品种、规格、位 置、连接、接地、防腐、固定方法、固定间距等。
 - ③ 明装等电位连接: 检查连接导线的品种、规格、连接配件、连接方法等。
- (4) 屋顶明装避雷带, 检查材料的品种、规格、连接方法、焊接质量、固定、 防腐情况等。
- ⑤ 变配电装置: 检查配电箱、柜基础槽钢的规格、安装位置、水平与垂直度、 接地的连接质量:配电箱、柜的水平与垂直度:高低压电源进出口方向、电缆位 胃等。
- ⑥ 机电表面器具(包括开关、插座、灯具、风口、卫生器具等): 检查位置、 标高、规格、型号、外观效果等。
 - (2) 电气工程预检记录填写说明如下。
- ① 主要检查内容包括: 应根据预检工程的检查项目和内容认真进行检查, 不 得落项, 预检内容应根据规范要求填写齐全、明了, 检查结果和结论齐全。
- ② 预检工程检查应及时;设备、机电表面器具的安装位置、标高的检查应在 抹灰前进行: 吊顶或轻钢龙骨墙部位的配管及线槽的检查应在封板前进行。
 - ③ 当检查无问题时,复查意见栏不应填写。
- ④ 编号栏的填写应参照隐蔽工程检查记录表编号编写, 但表示不同时顺序 号应重新编号。
- (5) 要求无未了事项:表格中凡需填空的地方,实际已发生的,如实填写:未 发生的,则在空白处画斜杠"/"。
- ⑥ 预检内容档应说明的内容:门口的翻板开关因构造样钢筋密而无法安装开 关念,其开关要移位,而移位又不符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2015)的规定,在不影响操作方便和电气安全的情况下,可做冷商移位处 理, 这样的问题应在预检内容中说明, 暖气炉片讲出支管间有电源插廊肘, 其 插座距暖气管的距离不符合《建筑电气通用图集》(92DO8)中要求的上 200mm、 下 300mm 的规定, 应采取技术处理并办理洽商, 同时应在预检内容中说明; 照明 配电箱应按《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303 2015)中的要求,底 边距地 1.5m, 而有的箱子比较高,超过 lm,按此标高要求则影响箱子的开启,这 种情况下要降低安装高度,并办理洽商,同时在预检内容中应说明。



- 图 对于预检工程检查记录表不适用的其他重要工序,应按照现行规范要求讲 行施工质量检查、并填写施工检查记录表(通用)。
 - (3) 电气工程预检记录格式见表 4-36。



表 4-36 预检记录(范例)

编号: C8-1-001

工程名称 預檢部位 依据: 施工图纸(施工图纸 设计变更/洽商(编号_ 主要材料或设备; 规格/型号;			避雷帶敷设 ××年×月×日
依据: 施工图纸(施工图纸 设计变更/治商(编号 主要材料或设备;	당/	电施 27),
施工图纸(施工图纸 设计变更/洽商(编号 主要材料或设备;	1		
设计变更/洽商(编号 主要材料或设备:	1		
主要材料或设备:]钠)和有关规范、规程。
	镀锌圆	1钠	
现格/型号:			
预检内容:			
(1) 屋面避雷带采用	J××(規格)镀锌圓钢	1,符合设计规范要求	
(2) 搭接长度大于医	目钢直径的 6 倍,且两	有面施焊	
(3) 焊接处药皮已清	†除,涂刷防腐漆		
(4) 避雷带平正顺直	L, 固定点支持件间3	E均匀、固定可靠	
IA * * D			
检查意见: 符合设计及规范要;	de:		
付合设计及规范安全	*		
复查意见:			
			the state of
			复查人:
			复查人; 复查日期:
施工单位		××建筑工程	复查日期:

4.5.2 施工检查记录

按照现行规范要求应进行施工检查的重要工序皆应填写相应施工检查记录。 无相应施工记录表格的应填写《施工检查记录》(通用)。

施工检查记录格式见表 4-37 和表 4-38。



表 4-37 施工检查记录(通用)(范例)

编号: C8-1-002

L程名称	××大厦	预检项目	避雷带敷设
检查部位	3 层①~⑩/④~⑩轴墙体	检查日期	××年×月×日

检查依据:

- (I) 施工图纸
- (2)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2015)

检查内容:

- (1) 电工13人进行管路敷设
 - (2) 质检员检查时发现镀锌铜管(SC)有 2 处漏做跨接地线

检查结论:

基本符合设计图纸及《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2015)的规定。2 处漏做跨接 地线的应进行整改

复查意见:


经检查整改已完成

复 查 人: 复杏日期,

			Sec. 312 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Г	施工单位	××建筑 L程公司		
Г	专业技术负责人	专业质量员	专业 工长	
Г				

表 4-38 现场混凝土施工、养护检查记录

L程名称			施工	单位		
设计混凝土等级			施工混淆	疑上等级		
浇筑部位			浇筑	.日期		
平均气温			养护	方法		
浇筑 工程量			要求均	丹落度		
商品混凝土供应单位			商品混凝土质量证书编 号			
配合比	水泥/kg	细骨料/kg	粗骨料/kg	掺合料/kg	外加剂/kg	水/kg
每 m³(每盘)用量						



**

			狭 表
混凝土试块留置组数		取样人	见证人
坍落度抽查情况			
混凝土施工情况			
楼板厚度控制方法			
养护日期	检查情况	养护日期	检查情况
施工工长		备注	

4 特别提示

- (1) 表 4-38 是现场混凝土施工过程检查、混凝土施工完进行养护的检查记录
- (2) "施工混凝土等级" 栏应和设计混凝土等级相同、特殊时可高于设计等级
- (3) "浇筑部位" 栏应注明浇筑混器土具体部位
- (4)"浇筑工程量"栏应注明浇筑混凝土实际工程量
- (5)"要求坍落度"栏应按施工方案注明
- (6) "配合比" 栏应按配合比通知单和实际使用情况注明
- (7) "混凝土试块留置组数" 栏应注明标养、同条件养护组数
- (8)"坍落度抽查情况"栏应注明检查几次、最大值和最小值
- (9) "混凝土施工情况" 栏应注明运输、浇筑顺序、高度、振捣情况等。
- (10)"楼板厚度控制方法"栏应按施工方案填写。
- (11) "养护日期" 栏应在混凝土浇筑完毕后,接施工方案及时采取有效养护措施,进行检查记录。

按照現行規范要求应进行施工检查的重要工序,皆应填写相应施工检查记录,无相应 施工记录表格的应填写《施工检查记录(通用)》。

4.5.3 交接检查记录

分部(分项)工程完成,在不同专业施工单位进行移交,应由移交单位、接收单位和见证单位共同对移交工程进行验收。

(1) 主要检查内容包括: 应根据专业交接检查的检查项目和内容认真进行检查, 交接

内容应根据规范要求填写齐全、明了,检查结果和结论齐全。

- (2) 当检查无问题时,复查意见栏不应填写。
- (3) 编号栏的填写应参照隐蔽工程检查记录表编号编写, 但表示不同时顺序号应重新 编号。
- (4) 见证单位意见: 见证单位应根据实际检查情况, 并汇总移交和接收单位意见形成 见证单位意见。
 - (5) 见证单位的确定内容如下。
 - ① 当在总包管理范围内的分包单位之间移交时, 见证单位为总包单位。
 - ② 当在总包单位和其他专业分包单位之间移交时,见证单位应为建设(监理)单位。 交接检查记录格式见表 4-39(范例)。

表 4-39 交接检查记录(范例)

编号: C5-3-007

T.程 名称	(××大度	
移交单位名	称 ××机电安装工程公司	接收单位名称	××消防公司
交接部位	整个工程消防系统配管	检查日期	××年×月×日
交接内容:			
(1) 该工:	程消防系统配管使用管材的规构	各、型号	
(2) 管路:	教设质量情况		
(3) 成品:	保护情况		
检查结果:			
(1) 该工:	程消防系統配管使用××(型号))、××(规格)钢管,符合施工	图纸要求
(2) 管路:	教设的位置、教设的质量符合证	及计及施工规范要求	
(3) 该工:	程消防系统配管已全部施工完与	产 带线已穿完,管口已进行	封堵 无堵塞现象
			复 企 人:
			复查日期:
见证单位意见	:		
m & 2-12			
同意交接			
			见证单位名称;
签	移交单位	接收单位	见证单位
also .			



4.5.4 地基验槽记录

基坑(槽) L程施工挖至设计标高后要进行验槽,结果需建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位共同验收签字确认。

基坑(槽)工程施工挖至设计标高后要进行验槽,结果地基验槽记录格式见表 4-40。

表 4-40 其位(槽) 工程施工验收记录

工程	名称			施	□单位						
骀	位			项	目经理						
放坡	比例			验日	收时间						
序号		检查内容		Τ'		检	验结果				
1	位	置及儿何尺寸									
2		基底标高									
3	上质情况										
4	地下水情况										
5	槽底:	是否有异物情况	7								
6	- 1	排降水方式									
7	支	护位移情况									
8	附基坑(槽	1)平面、剖面示	意图								
						自然地址					
						自然地达					
建设单	位验收结论	设计单位验收	女结论	勘察单位验	收结论	自然地步		5果		位验收约	结论
	位验教结论 业负责人:	设计单位验收设计专业负责		勘察单位验			- 生验收红	5果	监理单		结论

\$ 特别提示

- (1) "位置及几何尺寸" 栏说明实际尺寸或注明见附图, 在平面图中反映尺寸
 - (2)"槽底标高"栏由+0.000反映的实际槽底高度
 - (3)"土质情况"栏注明检查土质是否均匀,是否与设计图纸要求一致
 - (4)"地下水情况"栏注明检查槽底表层是否有明水淤泥。
- (5)"槽底是否有异物情况"栏注明检查槽底异物情况,如发现有异常,需要进行地基 处理的应及时进行处理。并填写处理方法。要经过建设、勘察、设计、监理单位的同意 地基处理工程验收记录见表 4-41

表 4-41 地基处理验收记录

编号:

4 1.	呈名称		处理部位		
处理	里依据				
施口	[图号		验收日期	711	
地畫	美处理方法、处理 籍	邓位及深度(或用简图]表示):		
处理	里记录及结果:		-117		
验证	女意见;				
		III- WIII AAA EA-	ML ser At At	19.1 00 00	March & D.
验	建设单位	监理单位	勘察单位	设计单位	施工单位
验收		监理单位 总监理工程师;	勘察单位 项目负责人:	设计单位 项目负责人:	施工单位项目经理。
验收单	建设单位				
验收	建设单位				

- (6)"排降水方式"栏注明检查采用排降水的做法详细注明。
- (7)"支护位移情况"栏注明检查基坑槽支护是否位移、特别是深基坑还应单独进行位 移观测。
- (8)"附基坑(槽)平面、剖面示意图"栏注明实际尺寸,由±0.000 反映的实际槽底高度, 施工现场的自然地坪标高、轴线等。

特别提示

- (1) 地基经过验槽、钎採后发现问题,应进行地基处理,并由勘察、设计单位复查, 处理结果必须得到建设。设计、勘察单位同意,并与减工单位。监理单位共同验收答率确认
- (2) 地基处理一般包括地基处理方案、地基处理的施工试验记录、地基处理检查记录 处理结果应符合加固的原理、技术要求、质量标准等。
 - (3)"处理范围示意图"栏: 地基处理附图中的平面、剖面图各种尺寸应记录详细

4.5.5 地下工程防水效果检查记录

地下防水工程质量验收的程序和组织,应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2013)的有差规定。地下防水工程质量验收的合格要求见表 4-42。

表 4-42 地下防水工程质量验收的合格要求

分项	会権会求
检验批	(1) 主控项目的质量经抽样检验全部合格。 (2) 一般项目的质量经抽样检验 80%以上检测点合格,其余不得有影响使用功能的缺陷。 对有允许偏差的检验项目,其最大偏差不得超过本规范规定允许偏差的 1.5 倍。 (3) 施工具有明确的操作依据和完整的质量检查记录
分项工程	(1) 分项 E程所含检验批的质量均应验收合格。 (2) 分项 E程所含检验批的质量验收记录应完整
子分部 E程	(1) 子分部工程所含分项工程的质量均应验收合格。 (2) 质量控制资料应完整。 (3) 地下工程渗漏水检测应符合设计的防水等级标准要求。 (4) 观感质量检查应符合要求

知识链接

地下防水工程是一个子分部工程, 其分项工程的划分应符合表 4-43 的要求。

表 4-43 地下防水工程的分项工程

	子分部工程	分项工程				
地	主体结构防水	防水混凝土、水泥砂浆防水层、卷材防水层、涂料防水层、塑料防水板防水层、金属板防水层、膨润上防水材料防水层				
下防	细部构造防水	施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、埋设件、预留通道接头、桩头、孔口、 坑、池				
水 II	特殊施 L法结构 防水	貓喷支护、地下连续墙、盾构隧道、沉井、逆筑结构				
程	排水	渗排水、盲沟排水、隧道排水、坑道排水、塑料排水板排水				
	注浆	预注浆、后注浆,结构裂缝注浆				

1. 地下防水工程竣工和记录资料

地下防水工程竣工和记录资料应符合表 4-44 的规定。

表 4-44 地下防水工程竣工和记录资料序号项目文件和记录

序号	項 目	发工和记录资料
1	奶水设计	设计图、设计交底记录、图纸会审记录、设计变更通知单和材料代用核定单
2	资质、资格证明	施工单位资质及施工人员上岗证复印证件
3	施工方案	施工方法、技术措施、质量保证措施
4	技术交底	施工操作要求及安全等注意事项
5	材料质量证明	产品合格证、产品性能检测报告、材料进场检验报告
6	混凝土、砂浆质量 证明 1)	试配及施工配合比、混凝土抗压强度、抗渗性能检验报告、砂浆黏结强度、 抗渗性能检验报告
7	中间检查记录	施工质量验收记录、隐蔽工程验收记录、施工检查记录
8	检验记录	渗漏水检测记录、观感质量检查记录
9	施工日志	逐日施工情况
10	其他资料	事故处理报告、技术总结

2. 地下防水工程隐蔽工程的验收记录

地下防水工程应对下列部位做好隐蔽工程验收记录。

- (1) 防水层的基层。
- (2) 防水混凝土结构和防水层被掩盖的部位。
- (3) 变形缝、施工缝、后浇带等防水构造做法。
- (4) 管道穿过防水层的封固部位。
- (5) 渗排水层、盲沟和坑槽。
- (6) 结构裂缝注浆处理部位。
- (7) 衬砌前围岩渗漏水处理部位。
- (8) 基坑的招挖和回填。

3. 地下防水工程的观感质量检查应符合的规定

- (1) 防水混凝土应密实,表面应平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;裂缝宽度不得大于 0.2mm,并不得贯通。
 - (2) 水泥砂浆防水层应密实、平整、黏结牢固,不得有空鼓、裂纹、起砂、麻面等缺陷。
 - (3) 卷材防水层接缝应黏结牢固、封闭严密、防水层不得有损伤、空鼓、皱折等缺陷。
 - (4) 涂料防水层应与基层黏结牢固,不得有脱皮、流淌、鼓泡、露胎、皱折等缺陷。
 - (5) 塑料防水板防水层应铺设牢固、平整, 搭接焊缝严密, 不得有下垂、绷紧破损现象。
- (6)金属板防水层焊缝不得有裂纹、未熔合、夹渣、焊瘤、咬边、烧穿、弧坑、针状 气孔等缺陷。
- (7) 变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管、埋设件、预留通道接头、桩头、孔口、坑、 池等防水构造应符合设计要求。
 - (8) 锚喷支护、地下连续墙、盾构隧道、沉井、逆筑结构等防水构造应符合设计要求。
 - (9) 排水系统不淤积、不堵塞,确保排水畅通。
 - (10) 结构裂缝的注浆效果应符合设计要求。

4. 地下工程出现渗漏水的处理

地下工程出现渗漏水时,应及时进行治理,符合设计的防水等级标准要求后方可验收,见表 4-45。

表 4-45	HA TO I	程院少	空细	好准

防水等级	防 水 标 准
1級	不允许渗水,结构表面无湿渍
2级	不允许調水,结构表面可有少量湿渍。 工业与层料建筑,溶液透面积不大于岛防水面积的 1‰,单个湿润面积不大于 0.1m²,任意 100m²的水面积不超过 1 处。 其他地下已程:单个湿渍总面积不大于总防水面积的 6‰,单 个溶渍面积小大于 0.2m²,任意 100m²防水面积不超过 4 处
3 级	有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂。 单个湿渍面积不大于 0.3m²、单个漏水点的漏水量不大于 2.5L/d,任意 100m² 防水面积不超 过 7 处
4级	有溺水点,不得有线流和漏泥砂。 整个工程平均漏水量不大于 2L(m²·d),任意 100m² 防水面积的平均漏水量不大于 4L(m²·d)

5. 地下工程渗漏水调查

- (1) 明控法地下工程应在混凝土结构和防水层验收合格以及回填土完成后,即可停止 降水;待地下水位恢复至自然水位且趋向稳定时,方可进行地下工程渗漏水调查。
 - (2) 地下防水工程质量验收时,施工单位必须提供"结构内表面的渗漏水展开图"。
- (3) 房屋建筑地下 L程应调查混凝土结构内表面的侧墙和底板。地下商场、地铁车站、 军事地下库等单建式地下工程,应调查混凝土结构内表面的侧墙、底板和顶板。
 - (4) 施工单位应在"结构内表面的渗漏水展开图"上标示下列内容。
 - ① 发现的裂缝位置、宽度、长度和渗漏水现象。
 - ② 经堵漏及补强的原渗漏水部付。
 - ③ 符合防水等级标准的渗漏水位置。



渗漏水现象的定义和标识符号。可按表 4-46 选用。

表 4-46 渗漏水现象的定义和标识符号

渗漏水现象	定义	标识符号
强渍	地下混凝土结构背水面,呈现防显色产变化的制定斑	#
渗水	地下混凝土结构背水面有水渗出,墙壁上可观察到明显的流挂水迹	0
水珠	地ト混凝土结构背水面的项板或拱项,可观察到悬垂的水珠,其滴落间 隔时间超过 lmin	\$
滴濕	地下混凝上结构背水面的顶板(拱顶),渗漏水的滴落速度至少为1滴 min	∇
线漏	地下混凝土结构背水面,呈渗漏成线或喷水状态	1

6. 地下工程渗漏水检测

- (1) 当被验收的地下工程有结露现象时,不宜进行渗漏水检测。
- (2) 渗漏水检测工具宜按表 4-47 使用。

表 4-47 渗漏水检测工具

名 称	用 途
钢直尺	量測混凝土湿渍、渗水范围
精度为 lmm 的钢尺	量測混凝土裂缝宽度
放大镜	观測混凝土裂缝
有刻度的塑料量简	量測滴水量
秒表	量測渗漏水滴落速度
吸墨纸或报纸	检验湿渍与渗水
粉笔	在混凝土上用粉笔勾画湿渍、渗水范围
工作登高扶梯	顶板渗漏水, 混凝土袈缝检查
带有密封缘口的规定尺寸方框	量测明显滴漏和连续渗流,根据工程需要可自行设计

7. 房屋建筑地下工程渗漏水的检测

房屋建筑地下工程渗漏水检测应符合下列规定。

- (1) 湿渍检测时,检查人员用下手触摸湿斑,无水分浸润感觉。用吸墨纸或报纸贴附,纸不变颜色。要用粉笔勾画出湿渍范围,然后用钢尺测量并计算面积,标示在"结构内表面的渗漏水展开图"上。
- (2) 渗水检测时,检查人员用干手触摸可感觉到水分浸润,手上会沾有水分。用吸墨纸或报纸贴附,纸会浸润变颜色。要用粉笔勾画出渗水范围,然后用钢尺测量并计算面积,标示在"结构内表面的渗漏水展开图"上。
 - (3) 通过集水井积水, 检测在设定时间内的水位上升数值, 计算渗漏水量。

8. 地下工程渗漏水检测记录

- (1) 地下工程渗漏水调查与检测,应由施工单位项目技术负责人组织质量员、施工员 实施。施工单位应填写地下工程渗漏水检测记录,并签字盖章; 监理单位和建设单位应在 记录上填写处理意见与结论,并签字盖章。
 - (2) 地下工程渗漏水检测记录应按表 4-48 填写。

表 4-48 地下工程渗漏水检测记录

L程名称			结构类型		
防水等级			检测部位		
	1. 单个湿渍的	最大面积m	² ; 总湿渍面积m ²		
渗漏水量检测	2. 每 100m ² 的渗水量L/(m ² ·d); 整个工程平均渗水量L/(m ² ·d)				
	3. 单个漏水点	的最大漏水量	_L/d:整个工程平均漏水量L/d		
结构内表面的 渗漏水展开图	(渗漏水现象用标识符号描述)				
处理意见与结论	(按地下工程防;	(按地下工程防水等级标准)			
	监理单位	建设单位	施工单位(签章)		
	(签章)	(签章)	项目技术负责人(签字) 质量员(签字) 施工员(签字)		
会签档		307			
	年 月 日	年 月 日	年 月 日		

知识链接

(1) 现行建筑防水工程材料标准应按表 4-49 的规定选用

表 4-49 现行建筑防水工程材料标准

类别	标 准 名 称	标准号
	(1) 聚氯乙烯防水卷材	GB 12952—2011
防	(2) 高分子防水材料 第 1 部分 片材	GB 18173.1—2012
水	(3) 改性沥青聚乙烯胎防水卷材	GB 18967-2009
茶	(4) 弹性体改性沥青防水卷材	GB 18242-2008
材	(5) 带自粘层的防水卷材	GB/T 23260-2009
4/3	(6) 自粘聚合物改性沥青防水卷材	GB 23441-2009
	(7) 预铺/湿铺防水卷材	GB/T 23457—2009
防	(1) 聚氨酯防水涂料	GB/T 19250-2013
水	(2) 建筑防水涂料用聚合物乳液	JC/T 1017-2006
涂	(3) 聚合物乳液建筑防水涂料	JC/T 864-2008
料	(4) 聚合物水泥防水涂料	GB/T 23445-2009

续表

类别	标 准 名 称	标准号
密	(1) 聚氨酯建筑密封膏	JC/T 482-2003
封	(2) 聚硫建筑密封膏	JC/T 483-2006
材	(3) 混凝土建筑接缝用密封胶	JC/T 881-2001
料	(4) 丁基橡胶防水密封胶粘带	JC/T 942-2004
其	(1) 高分子防水材料第2部分;止水带	GB 18173.2—2014
他	(2) 高分子防水材料第3部分: 遇水膨胀橡胶	GB 18173.3 2014
防	(3) 高分子防水卷材胶粘剂	JC/T 863-2011
JK B/J	(4) 沥青基防水卷材用基层处理剂	JC/T 1069—2008
材	(5) 膨润土橡胶遇水膨胀止水条	↑ \ JG/T 141—2001
料	(6) 週水膨胀止水胶	JG/T 312—2011
44	(7) 钠基膨润土防水毯	JG/T 193—2006
刚性	(1) 砂浆、混凝土防水剂	JC 474—2008
防水	(2) 混凝土膨胀剂	GB 23439—2009
材料	(3) 水泥基渗透结晶型防水材料	GB 18445 2012
ተባ ተዣ	(4) 聚合物水泥防水砂浆	JC/T 984-2011
防水	(1) 建筑防水卷材试验方法	GB/T 328.1~27—2007
,,,	(2) 建筑胶粘剂试验方法第1部分: 陶瓷砖胶粘剂试验方法	GB/T 12954.1-2008
材料	(3) 建筑密封材料试验方法	GB/T 13477~20—2002
方法	(4) 建筑防水涂料试验方法	GB/T 16777—2008
刀法	(5) 建筑防水材料老化试验方法	GB 18244-2000

(2) 建筑防水工程材料的现场抽样复验应符合表 4-50 的规定。

表 4-50 建筑防水工程材料现场抽样复验

序号	材料名称	抽样数量	外观质量检验	物理性能检验
1	高聚物改性沥 青防水卷材	大于 1 000 卷抽 5 卷, 每 500~1 000 卷抽 4 卷, 100~499 卷抽 3 卷, 100 卷以下抽 2 卷, 进行规格尺寸和外观 质量检验。在外观质量检验合格的卷 材中, 任取一卷做物理性能检验	剥离、边缘不整齐, 胎体露白、未浸透,	拉力,最大拉力时延 伸率,低温柔度,不 透水性
2	合成高分子防 水卷材	大于 1 000 卷抽 5 卷, 每 50~1 000 卷抽 4 卷, 100~499 卷抽 3 卷, 100 卷以下抽 2 卷, 进行规格尺寸和外观 质量检验。在外观质量检验合格的卷 材中, 任取 -卷做物理性能检验	折痕、杂质、胶块、 凹痕,每卷卷材的接头	断裂拉伸强度, 扯断伸长率, 低温弯折, 不透水性

/-t- +

				续表
序号	材料名称	抽样数量	外观质量检验	物理性能检验
3	有机防水涂料	每 5t 为 ·批, 不足 5t 按 ·批抽样	均匀黏稠体,无凝胶, 无结块	潮湿基面黏结强度, 涂膜抗渗性,浸水 168h 后拉伸强度,浸 水 168h 后断裂伸长 率,耐水性
4	无机防 <i>水</i> 涂料	液体组分 水涂料 每 10t 为一批,不足 10t 按一批抽样 固体组分 结块的药		抗折强度,黏结强度, 抗渗性
5	膨润土防水材料	每 100 卷为 ·批, 不足 100 卷按 1 批抽样: 100 卷以下抽 5 卷, 进行尺 表面平整, 厚度均匀, 大树料 - 寸偏亮和外现质量检验。在外观质 - 拉破洞、破边, 无残 物理性能检验 物理性能检验		单位面积质量, 膨润 土膨胀系数, 渗透系 数, 滤失量
6	混凝土建筑接 缝用密封胶	展 2t 为一批,不足 2t 按一批抽样 黏稠液体, 无气泡,		流动性、挤出性、定 伸黏结性
7	橡胶止水带	每月同标记的山水带产量为一批 抽样	尺寸公差、开裂, 缺 胶,海绵状,中心孔 偏心;凹痕,气泡, 条质,明疤	拉伸强度, 扯断伸长率, 撕裂强度
8	赋子型遇水膨 胀止水条	人 性分质,色		硬度,7d膨胀率,最 终膨胀率,耐水性
9	遇水膨胀止水胶	水膨胀止水胶 每 5t 为 -批, 不足 5t 按 -批抽样 状物, 和凝胶		表干时间,拉伸强度, 体积膨胀倍率
10	弹性橡胶密封 垫材料	5封 每月间标记的密封垫材料产最为 · 尺寸公差、开裂,隸 批抽样 · 版,四瘾,气泡,杂 质,明疤		硬度、伸长率, 拉伸 强度, 压缩永久变形
11	遇 水膨胀 橡胶 密封垫胶料	每月回标记的膨胀橡胶产量为一批 抽样	尺寸公差、开裂,缺 胶,凹痕,气泡,杂 质,明疤	硬度、扯断伸长率, 拉伸强度,体积膨胀 倍率、低温弯折
12	聚合物水泥防水砂浆	聚合物水泥防 每 10t 为 -批, 不足 10t 按 -批抽样		7d 黏结强度, 7d 抗渗性,耐水性

4.5.6 防水工程试水检查记录

防水工程试水检查记录格式见表 4-51。

表 4-51 防水工程试水检查记录

年 月	年 月	日 年 月	日 年月 日
项目专业负责人:	项目专业负责人。"	项目专业负责人。	监理工程师:
建设单位验收结论:	施工单位检查结果:	分包单位检查结果:	监理单位验收结论:
检查结果			
试水方法			
试水部位		试水日期	
防水种类		防水等级	
施工单位		分包单位	
L程名称			

特别提示

- (1) 屋面防水工程验收时,应检查屋面有无渗漏、给水和排水系统是否通畅。可在雨 后或持续淋水 2h 后进行。设计有要求做蓄水检验的屋面,其蓄水时间不应少于 24h: 有防 水要求的建筑地面,在防水材料铺设后,必须做蓄水实验 蓄水深度应为20~30mm,24h 内无渗漏为合格
 - (2) 根据实际蓄水检验情况进行全数检查。可分别按楼栋门或楼层填写
- (3)"试水方法"栏:应注意特殊部位蓄水检查方法。如厕浴间管根处、地漏、屋面细 部构造等

推荐阅读资料

- 1.《建设工程施工现场安全资料管理规程》(CECS 266-2009)
- 2.《 城下防水工程质量验收规范》(GB 50208 2011)
- 3.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202 2002)
- 4. 《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107-2010)



【标准规范】

任务训练

- 1、工程质量事故处理过程应提供哪些工程资料
- 2. 画出电气安装工艺流程图并添画应收集的施工记录名称
- 3. 收集电气分项工程调试方案及相关施工记录
- 4, 收集电气安装与土建配合的施工记录
- 5. 列出地面防水及节能的施工记录

4.6 施工试验及检测报告

🕰 引例

本例侧重于讨论施工试验记录与检验报告的分类、整理、使用与归档

合肥市实工程建筑面积为40000m²,地下3层、地上26层 其中控制中心部分机房增设机房专用空调机组 5层中央控制 家采用屋顶式空调机组配低速定风量单风速空调系统 其余房间均采用风冷热渠机组配风机盘管加耐风空调系统 根据使用性螺将其水系统分为高、低区增部分、1~6层为低区系统、7~26层为高区系统、水系统采用二增制。定压罐定压 水泵房、变压器家 配电 地下3层库房、储藏、走廊及电源电池审设量了机械进、损风系统 3层的 AFC 主机房设置机械排风系统、5层的中央控制室和信导设备享利用机械推测系统进行档风

本建筑的消防电梯前室和防烟楼梯间设置了机械加压防烟系统

空调房间室内设计参数见表 4-52

表 4-52 空调房间室内设计参数

		夏季				- 新风量
房间名称	序号	温度/C	相对湿度/%	温度/°C	相对湿度/%	/[m³/(h • p)]
中央控制室	1	25	≤65	20	≥35	40
 主机房	2	24	≤65	20	≥35	30
设备室	3	24	≤65	20	≥35	30
门厅	4	27	≤65	18	≥35	10
办公	5	26	≤65	20	≥35	25
餐厅	6	26	≤65	20	≥35	25
展厅	7	26	≤65	20	≥35	15

思考

1. 旅工试验记录形成的流程是什么?

- 2. 工程施工试验记录包括哪些内容?
- 3. 土建工程施工试验记录包括哪些内容?
- 4. 建筑给水排水及采暖工程施工试验记录包括哪些内容?
- 5. 建筑电气工程施工试验记录包括哪些内容?
- 6. 电梯工程施工试验记录包括哪些内容?
- 7. 通风与空调工程施工试验记录与土建工程施工试验记录有何联系?

知识链接

图 4.8 是施工资料管理网络图——施工试验及检测报告。




图 4.8 施工资料管理网络图——施工试验及检测报告

集特别提示

图 4.9 为分部工程质量验收流程图。



图 4.9 分部工程质量验收流程图

4.6.1 系统试运行记录

表 4-53 是系统试运行记录。

表 4-53 系统试运行记录

en Alexandra Alexandra	5 AN - 2 HAVE		Attention 1
门期 时间	系统运行情况	备注	值班人
(×××年6月6日~ ××××年7月6日	正常		

注:系统运行情况栏中,注明正常/不正常,并每班至少填写一次;不正常的在备注栏内扼要说明情况(包括修复日期)。

建设单位代表签名:

4.6.2 施工试验记录

施工试验记录格式见表 4-54。

值班长签名:

表 4-54 钢筋连接试验报告(范例)

编号: C6-6-016

							NO 3 4 + -		
及部位	××大学	综合模地门	宇框架梁		试件组	育号	007		
单位	××	(建筑工程	公司		试验委	托人	×××		
类型	滚	轧直螺纹边	上接		检验用	_			
妾头性能 吸	A级				代表	300 个			
连接钢筋种类及牌号		35 2	称直径	20(mm) 原材试验编号					
作	××>	· ×	5样日期	××年×月	IX E	试验日期	××年×月×日		
接头试件		母材试件			弯曲证				
抗拉强度 /MPa	断裂特征 及位置	实测面积 /mm²	抗拉强度 /MPa	弯心 直径	角	度结果	备注		
595	母材拉斯	314.2	600	- 11					
600	母材拉断	314.2	595						
605	母材拉斯	_			T				
						-			
				. 1					
				0					
					_				
	单位 类型 接头性能 及 类及障号 作 接头试件 抗拉强度 /MPa 595 600	单位 ×> 类型 滚 缓头性能 缓 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	单位 ××建筑工程 滚札直螺纹过 发头性能 A 级 及 B HRB335	单位 ××建筑工程公司 滚轧直螺纹连接 发头性能 A级 类及牌号 HRB335 公称直径 作 ××× 來样日期 接头试件 切材试件 抗拉强度 断裂特征 实测面积 抗拉强度 /MPa 及位置 /mm² /MPa 595 章材注断 314.2 600 600 章材柱断 314.2 595	章位 ××建筑工程公司 薬札直螺紋連接 菱头性能 A級 ※ 及牌号 HRB335 公称直径 20(mn 作 ××× 率料日期 ××キ×リ 接头试件 母材试件 抗拉强度 断裂特征 实測面积 抗拉强度 がMPa 及位置 /mm² /MPa 直径 595 母材払断 314.2 600 600 母材払断 314.2 595	単位 ××建筑工程公司 试验委 差型 滚轧直螺纹连接 检验员 菱头性能 A級 代表形 数 代表形 数 代表形 ※ 及牌号 HRB335 公称直径 20(mm) 作 ××× 率样日期 ××キ×月×日 接头试件 時製特征 实側面积 抗拉强度 弯心 が加Pa 及位置 /mm² /MPa 直径 角 595 幸材主断 314.2 600 600 寺材柱断 314.2 595	単位 ××建筑工程公司 试验委托人 类型 流れ直螺紋連接 检验形式 変头性能 A級 代表数量 ※ 大性能		

结论:

根据 JGJ 107-2016 标准,符合滚轧直螺纹 A 级接头性能

批准		审核	试验	
试验单位	××建筑工程公司	引试验室		
报告日期	××年×月×日			

注: 本表建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

4.6.3 砌筑砂浆试块强度统计、评定记录

砌筑砂浆试块强度统计、评定记录格式见表 4-55。

表 4-55 砌筑砂浆试块强度统计、评定记录

编号:

单位 十期 n 强度标 2.6 10.6	准值 f, /MPa 7.5 9.8	平均值 <i>j</i> 11. 10.6		1	养护方法 结构部(值 f _{2.000} 9.1 9.1	立	主体[养护 围护墙 5 f. 63
n 强度标	7.5	11.	46	最小	值 f _{2,min}	/MPa	0.7	5 f.
	7.5	11.	46		9.1			
2.6 10.6	_			11	_	13.4	5.	63
2.6 10.6	9.8	10.6	14.6	11	9.1	13.4		
	1,50							
				_		\vdash		
					_			
_				-	<u> </u>			
				-	_			
_	_			_	<u> </u>	\vdash		-
	+			_	<u> </u>	\vdash		_
	6 > 6				<u> </u>	>0.7	15 6	
				<u> </u>				
	11.46>7.					9.1>5.6	1.5	
В 50203—20	11 第 4.0.12 条	标准评定	为合格					
44 - 11		审	核			42	11.5	
	4 50203—20 批准	11.46>7.3		11.46>7.5	11.46>7.5	11.46>7.5 150203—2011 第 4.0.12 条标准计定为合格	11.46>7.5 9.1>5.6 9.50203—2011 第 4.0.12 条标准评定为合格	11.46>7.5 9.1>5.63 9.1>5.63 9.50203—2011 第 4.0.12 条标准评定为合格



【标准规范】

注: 本表建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

4.6.4 混凝土试块强度统计、评定记录

混凝土试块强度统计、评定记录格式见表 4-56。

表 4-56 混凝土试块强度统计、评定记录

编号: C6-13-013

工利	星名称		××干休所			强度等级			C30				
施二	工单位			××	工程公司	1		养护方法		标准	养护		
统	计期	×	×年×	月×E	至××至	年×月×日		结构部位		主体 1~:	5 层墙柱		
试块组费	且数、n 强度标准值 f _{m,k} /MPa			均值 /MPa	标准值 s _{f_} /MP		最小值 f _{cu,ma} /MPa		合格判定系数 み み				
1.3		30	30		46.5		5.52	8.84	\exists	36.1		1.7	0.9
	50.4	36.1	4	0.8	39.4	58	37.7	36.8	57.3	56.7	51.6		
	57.5	42.5	3	9.9			-						
觟													
组													
庭					0.0								
鱼													
MPa													
评			[団统计:	方法		□非统计方法						
定	1.0 j	f _{eu,k}	$m_{f_{col}}$	— A >	< s _{fu}	$\lambda_2 \times f_{cu}$	k	1.15 f	nujk	0.9	0.95 f _{cu,k}		
界限	36	0		31.49		27							
判定式	$m_{f_{m,k}}$	$-\lambda_1 \times s$	_{0.} ≥ 1	$0f_{cu,k}$	$f_{cu,n}$	$_{ m in} \geq \lambda_2 \times f_{ m cl}$,k	$m_{f_{\alpha\lambda}} \ge 1.1$	15 f _{ca,k}	f _{co,min} ≥	0.95 f _{ca,k}		
结果		31.49>	> 30			36.1>27							
告论: 该批	混凝土	符合 GB/	Г 5010	7 201	10 验评析	准,评定为	合格						
比准				审相	亥			统计					
设告日期				V.	×年×月	V FI							

注: 本表建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。



特别提示

《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107 2010)中混凝土强度的合格评定系数见 表 4-57。

表 4-57 混凝土强度的合格评定系数

试件组数	10 ~14	15~19	≥20	
λ_1	1.15	1.05	0.95	
d ₂	0.90	0.0	35	

4.6.5 结构实体混凝十强度检验记录

结构实体混凝土强度记录格式见表 4-58。

表 4-58 结构实体混凝土回弹——取芯法强度检验

回弹构件护	由取量小数量	同一强度等级的混凝土结构实体合格
构件总数量	量小抽样数量	问一强度等较的混凝土箱构头停台格
20 以上	企数	(1) 每个构作应选取不少15个制以、斗弹检测及、斗弹化口算;
20~150	20	(2) 对同一强度等级的混凝土,应将每个构件 5个测区中的最小
151~280	26	测区平均回单值进行排序,并在其最小的3个测区各钻取1个芯样;
281~500	40	(3)3个芯样的抗压强度算术平均值不小于设计要求的混凝土强度等级值的88%;
501~1 200	64	(4) 3 个芯样抗压强度的最小值不小于设计要求的混凝土强度等
1 201~3 200	100	级值的 80%

● 特别提示

- (1) 同一混凝土强度等级的柱、梁、墙、板。抽取构件最小数量应符合《混凝土强度 检验评定标准》(GB/T 50107-2010)中表 D.0.1 的规定, 并应均匀分布
- (2) 不宜抽取截面高度小于 300mm 的梁和边长小于 300mm 的柱。
 - (3) 楼板构件的回弹宜在板底进行。
- (4) 芯样应采用带水冷却装置的薄壁空心钻钻取, 其直径宜为 100mm, 且不宜小于混 凝土骨料最大粒径的3倍。
 - (5) 芯样试件的端部宜采用环氧胶泥或聚合物水泥砂浆补平,也可采用硫黄胶泥修补。
- (6) 应采用游标卡尺在芯样试件中部互相垂直的两个位置测量直径,取其算术平均值 作为芯样试件的直径, 精确到 0.1mm
 - (7) 应采用钢板尺测量芯样试件的高度。精确至 1mm、



- (8) 垂直度应采用游标量角器测量芯样试件两个端线与轴线的夹角, 精确到 0.1°。
- (9) 平整度应采用钢板尺或角尺紧靠在芯样试件两个端线与轴线的夹角试件端面上。 一面转动钢板尺, 一面用塞尺测量钢板尺与芯样试件端面之间的缝隙; 也可采用其他专用 设备测量。
- (10) 芯样试件应按现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》 (GB/T 50081-2002)中圆柱体试件的规定进行抗压强度试验。



4.6.6 风管漏风检测

风管漏风检测记录见表 4-59。

表 4-59 风管漏风检测记录(范例)

编号: C6-56-002

L程名称	××T.程	i.	代验日期	××年×月×日					
系统名称	送风系统	T.	作压力/Pa	中压					
系统总面积/m²	200	hi	验压力/Pa	800					
试验总面积/m²	200	、 系统	系统检测分段数 1段						
			分段实测数值						
1200×400		序号	分段表面积/m²	试验压力/Pa	实际漏风 量/(m³/h)				
ROO	×700	1	200	800	250				
	软件	2	5.0						
+		3							
	校訓 设备	4							
	汉朝	5							
系统允许漏风量/[m³/(m	² • h)] 2.71	实	测系统漏风量/[m3	/(m² • h)]	1.25				

检测结论:

检测结果符合设计要求和《通风与空调工程施工盾量验收规范》(GB 50243 2016)的规定



签	建设(监理)单位	施工单位		
字	建以(温理)半世	专业技术负责人	专业质量员	专业工长
**				

注: 本表由施工单位填写并保存。



4.6.7 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录

现场组装的除尘器壳体、组合式空气调节机组应做漏风量的检测,并填写《现场组装除尘器、空调机漏风检测记录》。

1. 除尘器安装规定

- (1) 型号、规格、进出口方向必须符合设计要求。
- (2) 现场组装的除尘器壳体应做漏风量检测,在设计工作压力下允许漏风率为5%,其中离心式漏风率为3%。
 - 检查方法: 按图核对, 检查测试记录和观察检查。
 - (3) 布袋除尘器、电除尘器的壳体及辅助设备接地应可靠。

2. 空调机组的安装规定

- (1) 型号、规格、方向和技术参数应符合设计要求。
- (2) 现场组装的组合式空气调节机组应做漏风量的检测, 其漏风量必须符合现行国家 标准《组合式空调和组》(GB/T 14294—2008)的规定。

检查方法:依据设计图核对,检查测试记录。

- 3. 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录填表要点
- (1) 工程名称与施工文件一致, 且各专业应统一。
- 【标准规范】 (1) 上任石标写廊上入日 (2) 应根据试验的情况如实填写。内容要齐全,不得漏项。应以规程规范为依据、结论要准确。
 - (3) 签字栏必须本人手签,不得打印或他人代签。
 - 4. 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录格式(表 4-60)

表 4-60 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录(范例)

编号: C6-57-003

		が約 立: たのっつ 1-00つ			
××工程	分部 □程	通风空调			
除尘	检测日期	××年×月×日			
××除尘器	型号规格	×××			
6 000	允许漏风率/%	6			
800	测试压力/Pa	1 000			
400	实测漏风量/(m³/h)	230			
	除尘 ××除尘器 6000 800	除生 检测日期			

检测记录:

除尘器组装后、漏风检测设备测试打压至工作压力 漏风量在设计允许范围内。证明安装严密

检测结论:

符合设计要求及《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243 2016)有关规定

答		施工单位			
签字栏	建设(监理)单位	专业技术负责人	专业质量员	专业工长	
**.					

注: 本表由施工单位填写并保存。



管网风量平衡记录

通风与空调工程无生产负荷联合试运转时,应分系统的,将同一系统内的各测点的风压、风速、风量进行测试和调整,并填写《管网风量平衡记录》.

- 1. 相关规定及要求
- (1) 系统各测点的实际与设计风量的相对偏差不应大于10%。
- (2)空调系统各测点调测的单线平面图或透视图,图中应标明系统名称、测点编号、测点位置、风口位置。并注明送风、回风、新风管
- (3)系统风量调整采用"流量等比分配法"或"基准风口法",从系统最不利环路的末端开始,最后进行总风量的调整
 - (4) 系统风量调整平衡后,应能从表中的数据反映出如下内容
 - ① 风口的风量、新风量、排风量、回风量的实测值与设计风量的相对偏差不大于10%
 - ② 新风量与回风量之和应近似等于总的送风量或各送风量之和,
 - ③ 总的送风量应略大于回风量与排风量之和。
 - 2. 管网风量平衡记录填写说明
- (1) 记录内容包括:工程名称、测试日期、系统名称、系统位置、测点编号、风管规格、断面积、平均风压、风速、设计风量(Qx)、实际风量(Qx)、相对差、使用仪器编号等
 - (2) 工程名称与施工文件一致、且各专业应统一
- (3) 应根据试验的情况如实填写。内容要齐全、不得漏项 应以规程规范为依据、结论要准确
 - (4) 签字栏必须本人手签。不得打印或他人代签
- (5) 管网风量平衡记录的最终目的是比较出实测风量与设计值之差 因此、采用风速-风量法则测量风压值是必须的 随着科技不断进步,测量仪器不断更新,各种风量测试仪 逐渐应用到工程中。若风量测试仪能够直接、有效、准确地测试出风口风量,则风压值一 栏可空白不填
 - 3. 管网风量平衡记录格式(表 4-61)

表 4-61 管网风量平衡记录(范例)

编号: C6-76-006

L	程名称		××工程			测试日期		××年×月×日			
系统名称			送风系统			系约	t位置		地下一层		
测点	风管规格	断面积	平	均风压/	Pa	风量/(n		m³/h)		使用仪	
编号	/(m×m)	/m²	动压	静压	全压	风速 /(m/s)	实际 (Q +)	设计 (Q ·2)	相对差	提用1X 器编号	
1	1 000× 600	0.6				5	10 800	10 000	8.0%	QY01	
2	800×400	0.32				4	4 608	4 377	5.3%	QY01	
3	500×320	0.16				3	1 728	1 615	6.25%	QY01	

44 年

Γ	程名称		C程 测试日期			××年×月×日					
系	系统名称		送风系统			系约	花位置		地下·层		
測点	风管规格	断面积	Ŧ	均风压/Pa		风量/(i		m³/h)		使用仪	
編号	八百 代恰 /(m×m)	/m²	动压	静压	全压	/(m/s)	实际 (Q*)	设计 (Q a)	相对差	器编号	
4											
施	工单位										
审核人		测定人				记录人					

注:本表由施工单位填写并保存。

4.6.8 室内风量温度测量记录

通风与空调工程无生产负荷联合试运转时,应分系统的,将同一系统内的各房间室内 风量、室内房间温度进行测量调整,并填写《各房间室内风量温度测量记录》。

1. 相关规定

各房间内的风量可在风管内或风口处测量。实测风量与设计风量的相对偏差不应大于 10%,所在房间内温度应填写风口所在房间室内温度。房间室内温度应符合设计要求及规 范规定。

2. 各房间室内风量温度测量记录填表要点

- (1) 记录内容包括: 工程名称、测量日期、系统名称、房间(测点)编号、设计风量(Q_{\aleph})、实际风量(Q_{\aleph})、相对差、所任房间室内温度等。
 - (2) 工程名称与施工文件一致,且各专业应统一。
- (3) 应根据试验的情况如实填写。内容要齐全,不得漏项。应以规程规范为依据,结论要准确。
 - (4) 相对差计算公式: $\delta = (Q_x Q_o)/Q_o \times 100\%$ 。
 - (5) 签字栏必须本人手签,不得打印或他人代签。
 - 3. 各房间室内风量温度测量记录格式(表 4-62)

表 4-62 各房间室内风量温度测量记录(范例)

编号: C6-77-007

□程名称	××	L程	测量日期	××年×月×日
系统名称	送风	系统	系统位置	地下 - 层
项目		风量/(m³/	h)	
	设计风量	实际风量	相对差	所在房间室内温度
房间(测点)编号	(Q n)	(Q ±)	$\delta = (Q_{\mathfrak{A}} - Q_{\mathfrak{A}})/Q_{\mathfrak{A}}$	
1	660	720	9.1%	25
2	680	740	8.8%	24

续表

L程名称	××	E程	测量日期	××年×月×日	
系统名称	送风	系统	系统位置	地下·层	
项目		风量/(m³/	h)		
	设计风量 实际风量		相对差	所在房间室内温度	
房间(测点)编号	(Q ±)	(Q ±)	$\delta = (Q_{\pm} - Q_{\Xi})/Q_{\Xi}$		
3	120	135	12.5%	24	
4	200	225	12.5%	26	
5	750	790	5.3%	24	
6	110	100	9.1%	24	
7	100	105	5%	25	
施工单位					
测量人		记录人		审核人	

注:本表由施工单位填写并保存。

4.6.9 防排烟系统联合试运行记录

在防排烟系统联合试运行和调试过程中,应对测试楼层及其上下两层的排烟系统中的 排烟风口、正压送风系统的送风口进行联动调试,并对各风口的风速、风量进行测量调整, 对正压送风口的风压进行测量调整,并做记录。

1. 相关规定及要求

防排烟系统联合试运行与调试的结果(风量及正压),必须符合设计与消防的规定。应 按总数抽查 10%, 且不得少于 2 个楼层。

2. 防排烟系统联合试运行记录填写说明

- (1) 因排烟系统试运行时, 只检测风速及排烟量, 表中"风压"栏可不填。
- (2) 表中"电源型式"是指电源是否为末端双路互投电源。
- 3. 防排烟系统联合试运行记录格式(表 4-63)

表 4-63 防排烟系统联合试运行记录(范例)

编号: C6-76-006

Γ	程名称		XX工程	试运行	时间	××年×月×日
试试	运行项目	防烟	(正压送风)系统	试运行	·楼层	二、三层楼梯间
风	道类别		结构风道	风机类	別型号	×××
电	源型式	22	0V 消防电源	防火(风)阀类别	自垂百叶
序号	风口尺寸	DI 1017 // / . >	风量/	(m³/h)	相对差	风压/Pa
力写	/mm	风速/(m/s)	设计风量(Q a)	实际风量(Q *)	相利左	PUMPA
1	400×200	6.53	1 800	1 881	4.5%	42
2	400×200	6.55	1 800	1 886	4.8%	43

绿 表

							狭衣
Ľ	程名称		XX工程	\neg	试运行时间		××年×月×日
i£iz	5行项目	防烟	(正压送风)系统		试运行楼层		二、三层楼梯间
凤	道类别		结构风道		风机类别型号		×××
电	源型式	220V 消防电源 防火(风)阀类别				自垂百叶	
序号	风口尺寸	Lil Silv (r (-)	风量/	(m ³ /h)		相对差	⊠.FK/Pa
カラ	/mm	风速/(m/s)	设计风量(Q ≈)	实际	风量(Q*)	相利左	/AL/III/Pa

试运行结论:

系统管路中各风润开至最大,经实测各风口风量值基本相同 相对偏差不超过5%,符合设计和《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243—2016)规定

签	建设(监理)单位	施工单位		
字	建议(批评)年位	专业技术负责人	专业质量员	专业 正长
k".				

注: 本表由施工单位填写、建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

推荐阅读资料

- 1.《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007)。
- 2.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2016)
- 3. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)
- 4. 《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107-2010)

任务训练

- 1. 填写电梯试运行记录
- 2. 列出空调系统有关试验记录
- 3. 奋划相关资料,判断已有的结构实体混凝土强度记录是否合格?
- 4. 查阅相关资料,列出室内消防系统试运行记录
- 5. 收集实际工程中防排烟系统联合试运行记录

4.7 施工质量验收资料

引例

本例侧重于讨论施工质量验收记录的分类、整理、使用及归档

德国的建筑水平堪称欧洲生态建筑的领导者。从建筑设计规划、到工程技术、材料应用技术等多方 面关注建筑城科 从外据保温、先进的门窗系统到采暖和制办方式的不断改进和创新。系统地做到了建 贫减耗.

德国邮政大厦总建筑面积 65 323m2, 高度 162.4m, 2003 年春季完工交付使用 比工程是绿色建筑、 节能建筑、牛杰建筑、可持续建筑的推测

项目选址在德国波思。位于城市与风景优美的莱茵河河畔公园之间的过渡段 地形因素影响了大厦的 外观设计,造就了它流线型的轮廓及错开的壳式造型,同时也决定了连接大厦间公共地区的交通网络。以 及护公园和大厅生近萎苗河的上部平台联系起来的许多阶梯和斜坡。

德国邮政大厦代表了一个新的办公楼设计理念 大厦分为南北两个半壳,中间错开了 7.2m 并通过 9 层的以玻璃为细板的空中花园相连。大厦采用了两组的玻璃烙电梯。不但城市和自然景观一点无念。并目 能感受到速度,空间和兴奋混合起来的鸣觉 通过工程技术的运用。大厦的"元件"同时兼有建筑、结构 和机械方面的作用,因此数量可以或到最少 这个项目获得了 2004 年度 AIA(美国建筑师联合会)国家荣 巻奖(2004 AIA Honor Awards for Architecture)。

大厦的荔塘系统具有自适应性和可重换性 建筑师通过错心的设计而非额外的技术设备来控制大厦的 环境 荔塘通过自然通风、自然采光以及太阳能智能控制系统。达到外部条件与内部舒适度之间的平衡并 使所需技术设备最少化,最终达至模拟人体皮肤良好适应性的目的 为了达到这样的效果,大厦采用了双 层玻璃幕墙 双层玻璃幕墙系统不仅实现了自然通风、隔声、防雨防风等功能。还在两层玻璃幕墙之间幔 冲空间内设置了遮阳装置 在温度调节上。空气可以从缓冲空间经过窗户或楼板边缘的特殊细部抽入、再 由高架地板内的对点器进行加热或冷却、然后在位移原理的作用下通过沉箱式外露混凝土楼板内的综合管 道系统向大厦保暖(或制冷)。

"干风中呼吸"形象抽比喻了大写戴墙空隙和核内空间的平衡的空气活动 大豐涌风系统基于大厦的 双层基端系统和整体能声概念。而非额外的态光。大魔无须使用中央机械系统。全年可以通过两个丰贵之 间的空隙实现通风 办公楼层利用这个空部作为进气口并以内部空中花园作为排气口,从而省去了送风井, 提高大厦的效率 另外,通过把进气装置分散安装在各楼层池线下的标准对流器里,大厦无须设置专门的 机械惨层 所有节省下来的费用都用在了补偿大ছ复杂的玻璃幕墙所带来的额外花费

幕墙外层玻璃后面装有风雨防护式煮阳装置。该外层玻璃采用内部系领双层低铁 Low-e 玻璃, 能保证 襄培的高诱明度 铺计减少外部收辐射及内部的可根据日子自动调节的人工照明控制系统, 大厦内部的湛 度调节可由退艇上天花板内的集成供热制冷系统实现,系统内的普通通过一个热交换器与一个地下水井连 接、为大楼提供自然制冷。无须另外使用制冷器。

根据大厦的整体设计,用户可通过对室内温度、空气质量和照明的单独控制达到理想的舒适度 大厦 的通风功能不仅减少了机械通风设备,同时还带来了1000m2的额外可租用空间 此外。由于大厦的设计 尽量利用了物下水并及夜间降温冷却靠自然冷原、因此即使在炎热的夏天。用户也能实现对各个房间温度 与风量的单独控制。这一点在一般的办公楼中并不多见 另外。由于使用了双层幕墙。40 层以上的用户 可自行决定是否需要开窗, 而目迹阳效果不会受影响

思考

- 1. 旅工质量验收记录的形成流程是什么?
- 2. 施工质量验收记录包括哪些内容?
- 3. 哪些施工物资需要检验批质量验收记录?
- 4. 节能分部工程包括哪些分项工程?
- 5. 主体结构工程包括哪些子分部工程?
- 6. 建筑装饰装修包括哪些子分部工程?

- 7. 主体结构、建筑装饰工程与建筑节能分部工程有何联系?
- 8. 建筑节能工程质量验收资料包括哪些内容?

知识链接

图 4.10 是施工资料管理网络图 -- 施工质量验收资料。



图 4.10 施工资料管理网络图——施工质量验收资料



图 4.11 是检验批质量验收流程图。




图 4.11 检验批质量验收流程图

4.7.1 检验批质量验收记录

1. 验收要求

- (1) 检验批合格质量应符合下列规定。
- ① 主控项目的质量经抽样检验均应合格。
- ② 一般项目的质量经抽样检验合格。当采用计数抽样时,合格点率应符合有关专业验 收规范的规定,且不得存在严重缺陷。对于计数抽样的一般项目,正常检验一次、二次抽 样可按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300 - 2013)中附录 D 判定。
 - ③ 具有完整的施工操作依据、质量验收记录。
- (2) 主控项目要求。主控项目的条文是必须达到的要求,是保证工程安全和使用功能的重要检验项目,是对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目,是确定该检验批的主要性能。如果达不到规定的质量指标、降低要求就有当于降低该工程目的性能指标,就会严重影响工程的安全性能;如果提高要求就等于提高性能指标,就会增加工程造价。如混凝土、砂浆的强度等级是保证混凝土结构、砌体工程强度的重要性能,所以必须全部达到要求。
 - 主控项目包括的内容主要包括如下方面。
 - ① 重要材料、构件及配件、成品及半成品、设备性能及附件的材质、技术性能等。
 - ② 结构的强度、刚度和稳定性等检验数据、工程性能的检测。
 - 一些重要的允许偏差项目, 必须控制在允许偏差限值之内。
- (3) 一般项目要求。一般项目是除上控项目以外的检验项目, 其条文也是应该达到的, 只不过对不影响工程安全和使用功能的少数条文可以适当放宽一些, 这些条文虽不像丰粹

项目那样重要,但对工程安全、使用功能、重要部位的美观都是有较大影响的。这些项目 在验收时,绝大多数抽套的处(件),其质量指标都必须达到要求,通常不得超过规定值的 150%,这样就对工程质量的控制更严格了,进一步保证了工程质量。

2. 检验批质量验收记录表类别

(1) 装配式结构工程检验批质量验收记录表格式见表 4-64(范例)。

表 4-64 检验批质量验收记录(范例)

编号: C5-26-007

	7(子 注程名	单位) 3称	山东智慧中心大	.度	分部(子 工程名		混凝土结构		分项工程 名称	装	配式结构
艙	正年	位			项目负	责人			检验批容量		19
分	包車	位位		分包单位项目 负责人			/ 检验批部位	6~	~⑦轴楼梯间		
施	i T.化	技据		松板梯框		"《混凝土结构工利 范》(GB 50					
		4	金收项目		计要求及 記范规定	最小/		11	检查记录		检查 结果
	ı	预	制构件的质量		9.2.1	(18	1	符令	合规范和设计要求		合格
	2	预制	构件结构性能实 体检验		9.2.2	1			实体检验报告		合格
上控	3		构件的外观质量 及尺寸偏差		9.2.3	3 19 符		符合	合规范和设计要求		合格
项目	4		件预留插筋预埋 线等规格和数量	0.24		19	符合设计要求			合格	
	5										
	6										
	7										
	8										
	1	7	页制构件标识		9.2.5	19			标识清晰无误		合格
般	2	预制	构件的外观质量		9.2.6	19		符合规范要求			合格
顺	3	预制	构件的尺寸偏差		9.2.7	19			符合规范要求		合格
1	4										
	5										
	施	工单位	· 检查结果						专 业 项目专业质	T. 量检查 年	长: ××× E员: ×××
	监理单位 验收结论								专业监	理工程年	呈师: ××× 月 日

4.7.2 分项工程质量验收记录

分项工程质量验收记录表格式见表 4-65。

± 4.05	ハケエロ氏号級ルコヨキ
表 4-65	分项工程质量验收记录表

40 E.

					700 3 +
	子单位)工 呈名称			分部(子分部) 工程名称	
_	工程数量			检验批质量	
	□単位			项目负责人	项目技术 负责人
分化	包单位			分包单位 项目负责人、	分包内容
序号	检验批 名称	检验批容量	部位/区段	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1					
2					
3					
4					
5					
6				3.00	
7					
8					
9					
10					
11	ļ				
12					
13					
14					
15					
	工单位 查结果			項目:	专业技术负责人: 年 月 日
Il/s a	理单位				专业监理工程师:
	H. T-19.				ARTHER LENGT

4 特别提示

相关规定及要求如下。

- (1) 分项工程质量验收合格应符合合格质量的规定。
- (2) 分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。
- (3) 核对检验批的部位是否全部覆盖分项工程的范围,有没有缺漏的部位没有验收到。
- (4)一些在检验批中无法检验的项目,在分项工程中直接验收,如砖砌体工程中的全高垂直度、砂浆强度的评定等。
 - (5) 检查有混凝土、砂浆强度要求的检验批、到龄期后能否达到规范规定
 - (6) 检验批验收记录的内容及签字人是否正确、齐全。
 - (7) 将检验批的资料统一、依次进行登记整理、方便管理。

4.7.3 分部(子分部)工程质量验收记录

分部(子分部)工程质量验收记录表格式见表 4-66。

表 4-66 分部(子分部)工程质量验收记录表

ta es

单位(单位(子单位)工程名称		子分	部工程数量		.K.	分	项工程数量			
	施工单位		-	Tr Y	项	目负责人	15.1	X1	技术	(质量)负责人	
	分包单位	1	1.	12	分包	单位负责人				分包内容	
序号	子分部 L程 名称	分项 名		检验批 数量		施工单位相	全产结果	Į.		监理单位验收	结论
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
	质量控制	削材料									
	安全和功能	检验结	吉果								_
	观感质量	检验结	果								
综合验	金收结论										
施工单	位	拟	物察单位	位		设计单	位			监理单位	
项目负	责人:	項	[目负	贵人:		项目负	贵人:			总监理工程师:	
	年 月	日		年	月	日	年	月	日	年	月日

注: 1. 地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。 2. 主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

▲ 特别提示

- 1 相关规定及要求
- (1) 分部(子分部)工程所含分项工程的质量均应验收合格。
- (2) 质量控制资料应完整。
- (3) 地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测 结果应符合有关规定
 - (4) 观感质量验收应符合要求。
 - 2. 填表说明
- (1)"分项工程"按检验批纯工先后的顺序。将分项工程名称填写上。在第二格栏内分 别填写各分项工程实际的检验批数量、即分项工程检验批数量、并将各分项评定表按顺序 附在表后。
- (2)"质量控制资料"按资料核查的要求逐项进行核查 若能基本反映工程质量情况。 达到保证结构安全和使用功能的要求,即可通过验收 全部项目通过,即可在施工单位检 查评定栏内打"√"标注合格、并送监理单位或建设单位的验收、监理单位总监理工程师 组织审查。在符合要求后。在验收意见栏内签注"同意验收"
- (3) 安全和功能检验(检测)报告。在核查时要注意、在开工之前确定的项目是否都进行 了检验:逐一检查每个检测报告。核查每个检测项目的检测方法、程序是否符合有关标准 规定:检测结果是否达到规范的要求 检测报告的审批程序签字是否完整 在每个报告上 标注审查同意 每个检测项目都通过审查。即可在施工单位检查评定栏内打"√"标注检 查合格。由项目经理送监理单位或建设单位验收、监理单位总监理工程师或建设单位项目 专业技术负责人组织审查。在符合要求后、在验收意见栏内签注"同意验收"意见
- (4) 观感质量验收 实际不单单是外观质量,还有能启动或运转的要进行启动或试运 转,能打开看的打开看。有代表性的房间、部位都应走到,并由施工单位项目经理组织进 行现场检查, 经检查合格后, 将施工单位填写的内容填写好后, 由项目经理签字后交监理 单位或建设单位验收。

4.7.4 建筑节能分部工程质量验收记录

建筑节能分部工程质量验收时须检查以下内容。

1. 设计与施工执行标准文件

经施工图审查机构审查合格,并向建设行政主管部门备案的设计文件;施 L中应有执行的标准、规范、规定及有关文件,以及节能专项施工技术方案和 施工工艺、施工技术交底等。



2. 材料及配件出厂质量证明文件、技术性能检测报告、进场验收记录

材料及配件进场时,生产厂家应提供具有中文标志的出厂合格证、型式检验报告等质量证明文件,并确认其是否与实际进场材料相符; 节能工程使用材料及配件等进场后,施工单位应进行检查,符合要求后填写"原材料(构配件)进场验收记录",并报现场项目监理部和建设单位,共同进行进场验收。

3. 材料及配件的抽检复试报告相关规定(表 4-67)

表 4-67 节能子分部或分项工程抽检复试要求

子分部或分项名称	序号	抽检复试要求
屋面保温工程	1	① 黏结剂的复试:依据现行国家标准《建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分:陶瓷砖胶粘剂试验方法》(GB/T 12954.1—2008)的规定进行抽样 复试 ② 保温或隔热材料的复试
		② 复合保温·编体和外墙外保温等材料进场后应以 300m³ 为一批进行 检验,不足 300m²也应按一个批计算,每批抽检不应少于3 组对其密 度、压缩(10%)强度、困燃(自熄)性、导热系数、尺寸稳定性等项目进 行抽检复试
外墙外保温工程	2	② 聚苯板薄抹灰外墙外保温系统产品必须提供其有效的耐候性试验 报告及系统性能检测报告
		③ 黏结剂的复试依据现行国家标准进行抽样复试
		③ 7层以上建筑节能工程外墙保温板的黏结强度、锚栓的拉拔强度的抽栓报告
		⑤ 节点与细部加强层(网格布、钢网、钢板网)的耐碱度和抗拉强度的 复试
外门窗、幕塢及 玻璃工程	3	进入现场的外门窗、幕墙应进行抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗 油性能和保温性能等级等项目的抽检复试,确认符合设计及规范要求 后才能使用在工程上
地面保温工程	4	隔热材料、浇喷材料进场后进行验收,并对其密度、压缩(10%)强度、 导热系数、阻燃性进行抽样检验及复试

4. 各分项的隐蔽验收记录

根据发生项目按有关规定及要求填写"隐蔽工程检查验收记录",包括如下内容。

- (1) 屋面保温工程。
- (2) 外墙保温 L程。
- (3) 门窗及玻璃安装工程。
- (4) 幕墙 L程。
- (5) 非采暖公共间保温工程。
- (5) 非米暖公共同节(6) 地面保温工程。
- 5. 各检验批、分项、子分部的验收记录
- (1) (子分部)分项 L程质量验收记录表格式见表 4-68(范例)、表 4-69。

表 4-68 建筑节能分部工程质量验收表(范例)

工程:	名称	山东智	慧建筑中心大厦	结构多		框剪结构	层数	19
施工	单位	单位 山东智慧建筑公司			负责人	合格	质量部门 负责人	×××
分包	分包单位 /				负责人	/	分包技术 负责人	/
序号		分項	工程名称	验收约	古论	监理	L程师签字	备注
1		墙体	节能工程	合本	各	7	×××	
2		幕墙	节能 1.程	合布	各)	×××	
3		门窗	「节能 I.程	合和	各		×××	
4		屋面	节能工程	合本	\$	ZM 3	×××	
5		地面	节能 工程	合本	各	;	×××	
6		供暖	节能 工程	合木	各	;	×××	
7		通风与?	空调节能工程	合木	各	,	×××	
8	空		统的冷热源及管网 能工程	1 3	格 ×××			
9		配电与原	照明节能工程	合本	合格 ×××			
10		监测与	空制 节能 工程	合相	3 -	×××		
11		地源热泵换	热系统节能工程	合本	合格 ×××			
12		太阳能光差	热系统节能工程	合木	合格 ×××			
13		太阳能	光伏节能工程	全格 ×××			×××	
		质量控制	资料	合格		×××		
	外墙	节能构造现	场实体检验	合格		xxx		
	外質	行密性现均	汤实体检测	合布	各	,	×××	
		系统节能性	能检测	合木	各	,	×××	
验收统	结论		合格					
其他	参加验	收人员:	×××					
	分包自	单位: /			项目经理:/			
	施工自	位: 山东	智慧建筑公司		项目经	哩: ×××	××年××月	××Н
收单	设计单	单位:中国	智慧建筑设计公司		项目负	责人:×××	××年××J	月××日
	监理(建设)单位:	山东智慧监理公司			工程师: 位项目负责/	人): 年月日	1

表 4-69	分项工程质量验收汇总表

	L程名称			检验批赞	女量 一
1	设计单位			监理单	位
j	施工单位		19	頁目经理	项目技术负责人
	分包单位		分包	单位负责人	分包项目经理
序号	检验批部位、	区段、系统	施工卓	单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12			1		
13				1	
14				100	
15					
施工单位	位检查结论:			验收结论:	
	琐	目专业质量(技	术)负责人		监理 L程师, (建设单位项目专业技术负责/

(2) 节能 L程屋面检验批质量验收表格式见表 4-70(范例)。

表 4-70 节能工程屋面检验批质量验收(范例)

I.程名称 L		络称	山东智慧建筑中心	大厦 分项	大厦 分项工程名称		验收 部位	是面份	R温隔热	
崩	三工年	位	山东智力	慧建筑公司 专业工长 ××			××	项目经理	××	
	.执行 称及:	「标准 編号	⟨ ặ	建筑节能工程	施工质量	企收规范》(GB	50411—2	2007)		
分	包单	位	/		分包马	目经理	/ 施	工班组长	××	
			验收规范规定		施」	单位检查评定	记录	监理(建设) 记3		
	ı	保温降	馬热材料品种、规格	第 7.2.1 条	抽	查 7 处,全部	合格			
	2		性能复验	第 7.2.2 条	核查质	核查质量证明文件及进场复验 报告,合格				
Æ	3		性能复验	第 7.2.3 条	抽	样送检,全部包	今格	1		
控	4	保	温陶热层的做法	第 7.2.4 条	抽	至10处,全部	合格	1		
項	5			第 条				核查质量记		
E	6			第条				场检查	: 台格	
	7			第 条						
	8			第条				1		
	9			第 条						
	10			第 条						
_	1	保温	温隔热层松散材料	第 7.3.1 条	抽	在10处,全部	合格			
般	2			第 条						
项	3			第条						
目	4			第条						
		4位检查 2结果	项目专业质量标	全查员: ×× :负责人)××				年 月	Ħ	
监理		设)单位 结论	监理工程师: >	<×× Y项目专业技	术负责人)	: ×××		年 月	Ħ	



推荐阅读资料

- 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)
- 2.《建设工程质量管理条例》, 2000年中华人民共和国国务院令第279号
- 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)

任务训练

- 1. 列出节能分部工程所包括的分项工程。
- 2,填写墙体节能工程质量验收记录
- 3. 填写门窗节能工程质量验收记录
- 4. 遗写层而节修工程质量验收记录。
- 5. 填写采暖节能工程质量验收记录。



🖒 引例

本例侧重讨论竣工验收资料的分类、整理、保管与移交

息 思考

- 1. 竣工验收资料形成流程是什么?
- 2. 竣工验收资料包括哪些内容?
- 3. 竣工胎收资料涉及的单位有哪此?
- 4. 钢结构工程包括哪些分项工程?
- 5. 钢结构构件制作与安装中有哪些施工记录?
- 6. 钢结构工程安全和功能检验资料有哪些?
- 7. 钢结构分部工程与钢筋混凝土结构分部工程质量验收资料的相同之处有哪些?

知识链接

图 4.12 是施工资料管理网络图——竣工验收资料。



图 4.12 施工资料管理网络图——竣工验收资料

▲ 特别提示

图 4.13 是分部工程质量验收流程图。

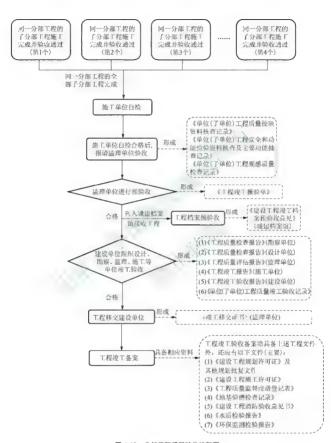


图 4.13 分部工程质量验收流程图

4.8.1 单位(子单位)工程竣工预验收报验表

1. 工程竣工报告

建设工程质量施工单位(竣工)报告的封面及资料格式见表 4-71 和表 4-72。

表 4-71 建设工程质量施工单位(竣工)报表封面

	建设工程质量施工单位(竣工)报告			
工程名称:	400			
施工总承包单位:		年	月	日

表 4-72 工程质量自查情况表

序号	项目	验收项目情况	验收结论
1	质量控制资料	共	
2	分部工程	共项, 自查项, 符合强制性标准及设计要求项	
3	主要建筑材料、构配件自检	共项, 自检复试符合要求	
4	安全、功能检查(检测)报告	地基基础	
5	住宅工程抗裂措施落实情况	落实项目符合要求项	
6	观感质量自检情况	应得分,实得分,得分率	
7	使用功能自检措施		
公司生产	产部门意见 (公章)	公司质量部门意见 (公章)	
此口	程我单位按合同约定及设计文件	牛要求进行了精心施工,并于 年 月	日全部完成.

此工程我单位按合同约定及设计文件要求进行了精心施工,并于_____年____月____日全部完成,经单位自查该工程质量达到竣工要求,现工程已具备验收条件。

施工单位负责人	项目经理签名	
监理单位意见	总监理 L程师签名	

2. 工程质量验收证明书(地基、基础、主体)

口程质量验收证明书(地基、基础、主体)的封面及资料格式见表 4-73 和表 4-74。

表 4-73 工程质量验收证明书(地基、基础、主体)的封面

	工程质量验收证明书(地基、	基础、	主体)	
单位工程名 建筑面积:	称:			
结构类型、	层数:			
施工单位名	称:			
XXI	市建设 L程质量监督管理总站5	监制		

表 4-74 工程质量验收情况表

		及 474 工程 灰墨 拉 权	
	勘察单位:		
	项目负责人(签字):	技术负责人(签字)	for the second
			年 月 日 勘察单位(公章)
	设计单位:		侧景平压(公里)
T.	设计项目负责人(签字):		
程	311 312121 (= 1)·		年 月 日
各			设计单位(公章)
方意	施工单位:	1100	
见	项目经理(签字):	总工程师(签字):	年 月 日
	71 F1 F10 - 20 (200 4) -		施工单位(公章)
	监理单位:		
	总监理工程师(签字):		年 月 日
			监理单位(公章)
	单位(建设单位)意见:		
i	核工程(地基、基础、主体)部位引	俭 收程序和内容严格按有关法律、法规:	和验收标准进行,验收结果:
项目负	责责人(签字):		
			年 月 日
			建设单位(公章)

4.8.2 单位(子单位)验收记录

1. 单位(子单位)工程质量竣工验收记录

单位(子单位) L程质量竣工验收记录是指单位工程完成后,施工单位经自行组织人员进行检查验收,质量等级达到合理标准,并经项目监理机构复查认定质量等级合格后,向建设单位提交竣工验收报告及相关资料,由建设单位组织单位工程验收的记录。

2. 单位(子单位)工程质量验收合格应符合的规定

- (1) 单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格。
- (2) 质量控制资料应完整。
- (3) 单位(子单位)工程所含分部工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验 资料应完整。
 - (4) 主要使用功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。
 - (5) 观感质量验收应符合要求。
 - 3. 单位(子单位)工程质量竣工验收记录

表格形式见表 4-75。

表 4-75 单位(子单位)工程质量竣工验收记录

工程名称		-结构类型		ils		层數/建筑面积				
施「	施工单位		· 技术负责人		V/AXI		开工日期			
项目	负责人		1	项目技术负责	[人 1	XIL		完工	完工日期	
序号		项目。	1-	验收记录			验收结论			
1	分部工程验收			共 分部, 分部	经查符合设	计及标	 作规定			
2	质量控制资料核查		共 项,经核查符合规定 项							
3	安全和使用功能			共核查 项项,符合规定 项	,符合规定 项,经		共抽查 理符合规			
4	观感质量验收				查项,达到"好"和"一般"的 项,经返修处理符合要求的 项					
	,									
参	建设	建设单位 监		理单位	施工单位	Ĭ	设计单	单位	勘察单	位
加验收单	(公 项目负 年)		总监测	(公章) 理工程师: 月 日	(公章) 项目负责/ 年 月		(公) 项目负: 年 月	责人:	(公章) 项目负责。 年 月	

注:单位工程验收时,验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

4.8.3 质量控制资料核查记录

单位(子单位) 口程质量控制资料核查记录格式见表 4-76(范例)。

表 4-76 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(范例)

-	程称	山东智慧建筑中心大厦		施工单位	山东	智慧建筑	公司	
序	项				施工单位		监理	単位
号	月	资料名称	份数	ŧ	该查意见	核查人	核查意见	核查人
1		图纸会审记录、设计变更通知 单、工程洽商记录	12	设计变更、	洽商记录齐全		合格	
2		L程定位测量、放线记录	76	定位测量准	确、放线记录齐全		合格	
3		原材料出厂合格证书及进场 检验、试验报告	160	水泥、钢筋 厂合格证及	、防水材料等有出 复试报告		合格	
4	建筑	施工试验报告及见证检测报告	钢筋连接、混凝土抗压强度试			合格		
5	Lj	隐蔽工程验收记录	121	隐蔽工程检查记录齐全			合格	
6	结构	施工记录	183	地基验槽、钎探、预检等记录 齐全			合格	
7		地基、基础、主体结构检验及 抽样检测资料)	20	基础、主体经监督部门检验, 其抽样检测资料符合规范要求			合格	
8		分项、分部工程质量验收记录	57	质量验收符合规范规定			合格	
9		工程质量事故调查处理资料		无工程质量	事故	li	合格	
10		新技术论证、备案及施工记录	15	大体积混凝	上施工记录齐全		合格	1
1		图纸会审记录、设计变更通知 单、工程治商记录	5	治商记录齐	全、消楚		合格	
2	给	原材料出厂合格证书及进场 检验、试验报告	63	合格证齐全	、有进场检验报告		合格	
3	水排	管道、设备强度试验、严密性 试验记录	7	强度试验记	录齐全符合要求		合格	
4	水与	隐蔽工程验收记录	36	隐蔽工程检查记录齐全			合格	
5	供	系统清洗、灌水、通水、通球 试验记录	55	灌水、通水等试验记录齐全			合格	
6	100	施工记录	38	各种预检记	录齐全		合格	
7		分项、分部工程质量验收记录	14	质量验收符	合规范规定		合格	
8		新技术论证、备案及施工记录	5	各种记录齐	全		合格	

续表

	程称	山东智慧建筑中心大厦		施工单位	山东	智慧建筑	公司	
序	項				施工单位	监理单位		■単位
号	月	资料名称	份数	1	亥查意 见	核查人	核查意见	核查人
1		图纸会审记录、设计变更通知 单、工程洽商记录	3	治商记录齐	全、清楚		合格	
2		原材料出厂合格证书及进场 检验、试验报告	16	合格证齐全	有进场检验报告		合格	
3	通风	制冷、空调、水管道强度试验、 严密性试验记录	19	制冷、空调	、水管道记录齐全		合格	
4	与	隐蔽 I.程验收记录	26	隐蔽 1.程检	 在记录并全		合格	1
5	空调	制冷设备运行调试记录	38	各种调试记	录符合要求		合格]
6	(ha)	通风、空调系统调试记录	62	通风、空调	系统调试记录正确		合格]
7		施工记录	38	预检记录符	合要求		合格]
8		分项、分部工程质量验收记录	19	质量验收符	合规范规定		合格	1
9		新技术论证、备案及施工记录	3	各种记录齐		合格	1	
1		图纸会审记录、设计变更通知 单、工程洽商记录	4	洽商记录齐	全、清楚		合格	
2		原材料出厂合格证书及进场 检验、试验报告		材料、主要设备出厂合格证书 齐全、有进场检验报告			合格	
3	建	设备调试记录	155	设备调试记录齐全		l i	合格	1
4	C	接地、绝缘电阻测试记录	78	接地、绝缘电阻测试记录齐全符合要求			合格	
5	4	隐蔽工程验收记录	19	隐蔽工程检	查记录齐全		合格	1
6		施工记录	29	各种预检记	水产全	li	合格	1
7		分项、分部工程质量验收记录	9	质量验收符	合规范规定	ĺ	合格	1
8	1	新技术论证、备案及施 [记录	2	各种记录齐	全	l	合格	1
ı		图纸会审记录、设计变更通知 单、工程洽商记录	3	治商记录、 齐全	竣工图及设计说明		合格	
2		原材料出厂合格证书及进场 检验、试验报告	26		出厂合格证及技术 有进场检验报告		合格	
3	磐	隐蔽工程验收记录	33	隐蔽工程检			合格	1
4	能	施工记录	57	各种预检记	录齐全	li	合格	1
5	建	系统功能测定及设备调试记录	26	系统功能调试记录齐全			合格	1
6	筑	系统技术、操作和维护手册	5	有系统技术操作和维护手册			合格	1
7		系统管理、操作人员培训记录	9	有系统管理	操作人员培训记录		合格	1
8		系统检测报告	33		告齐全符合要求		合格	1
9		分项、分部工程质量验收记录	27	质量验收符			合格	1
10		新技术论证、备案及施 [记录	10	各种记录齐			合格	1

名称		山东智慧建筑中心大厦	\square	施工单位		智慧建筑	公司		
序	瑙				施工单位		监理	监理单位	
号	目	资料名称	份数	4	亥查意见	核查人	核查	核查人	
1		图纸会审记录、设计变更通知 单、工程洽商记录	6	治商记录、 齐全	竣工图及设计说明		合格		
2		原材料出厂合格证书及进场 检验、试验报告	18		出厂合格证及技术 有进场检验报告		合格		
3	建	隐蔽工程验收记录	12	隐蔽 工程检	查记录齐全		合格	1	
4	筑	施工记录	36	各种预检记	录齐全	i	合格	1	
5	节能	外墙、外窗节能检验报告	7	外墙、外窗 符合要求	节能检验报告齐全		合格		
6		设备系统节能检测报告	9	设备系统节 合要求	能检测报告齐全符		合格		
7		分项、分部工程质量验收记录	11	质量验收符	验收符合规范规定		合格		
8	新技术论证、备案及施工记录		3	各种记录齐	全	l	合格	1	
ı		图纸会审记录、设计变更通知 单、工程洽商记录	2	安装中无设	计变更		合格		
2		设备出厂合格证书及开箱检 验记录	7	设备合格证	齐全, 有开箱记录		合格		
3	电	隐蔽工程验收记录	11	隐蔽工程检	查记录齐全		合格	1	
4	梯	施工记录	27	各种施工记	水齐全		合格		
5		接地、绝缘电阻试验记录	30	电阻值符合	要求。记录齐全		合格]	
6		负荷试验、安全装置检查记录	19	检查记录符	合要求		合格		
7		分项、分部工程质量验收记录	19	质量验收符	合规范规定	l i	合格		
8		新技术论证、备案及施工记录	2	各种记录齐	全		合格]	

全特别提示

(1)本表由施工单位按照所列质量控制资料的种类、名称进行检查并填写份数,然后提交给监理单位验收。



- (2) 单位(子单位)工程质量控制资料是单位工程综合验收的一项重要内容,是单位工程 包含的有关分项工程中检验批主控项目、一般项目要求内容的汇总表、
- (3) 本表其他各栏内容均由监理单位进行核查, 独立得出核查结论 合格后填写具体 核杏意见, 如"齐全", 具体核杏人在"核杏人" 栏答字,
 - (4) 总监理工程师在"结论"栏里填写综合性结论。
 - (5) 施工单位项目经理在"结论"栏里答字确认

4.8.4 安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

单位(子单位) 口程安全和功能检验资料核查及 主要功能抽查记录格式见表 4-77(范例)。

表 4-77 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录(范例)

	.程 ·称			施工单位		
字号	项目	安全和功能检查项目	份数	核介意见	抽查结果	核查 (抽查)人
ı		地基承载力检验报告	5	检验报告齐全符合要求	合格	
2		桩基承载力检验报告	7	检验报告齐全符合要求	合格	
3		混凝上强度试验报告	11	试验报告齐全符合要求	合格	
4		砂浆强度试验报告	9	试验报告齐全符合要求	合格	
5		主体结构尺寸、位置抽查记录	17	抽查记录齐全	合格	
6		建筑物垂直度、标高、全高侧 量记录	6	记录符合测量规范要求	合格	
7		屋面淋水或蓄水试验记录	3	试验记录齐全	合格	1
8	建筑	地下室渗漏水检测记录	6	检查记录齐全	合格	1
9	現与结	有防水要求的地面蓄水试验 记录	21	厕浴间防水记录齐全	合格	
10		抽气(风)道检查记录	3	检查记录齐全	合格	
11	13	外窗气密性、水密性、耐风压 检测报告	9	"三性"试验报告符合要求	合格	
12		幕墙气密性、水密性、耐风压 检测报告	11	"三性"试验报告符合要求	合格	
13		建筑物沉降观测测量记录	5	记录符合要求	合格	1
14		节能、保温测试记录	7	保温测试记录符合要求	合格	1
15		室内环境检测报告	8	有害物指标满足要求	合格	
16		上壤氧气浓度检测报告	2	检验报告齐全符合要求	合格	1

续表

	安全和功能检查项目	份数	核查意见	抽查结果	核查 (抽查)人
_	给水管道通水试验记录	20	通水试验记录齐全	合格	(41-1-1-7)
514		26	压力试验记录齐全	合格	
	P生器具满水试验记录	27	满水试验记录齐全	合格	
水与	消防管道、燃气管道压力试验 记录	33	压力试验符合要求	合格	
供	排水干管通球试验记录	19	试验记录齐全	合格	
睃	锅炉试运行、安全阀及报警联 动测试记录	6	测试记录齐全	合格	
通	通风、空调系统试运行记录	7	符合要求	合格	
JXL.	风量、温度测试记录	9	有不同风量、温度记录	合格	
-	空气能量回收装置测试记录	9	测试记录符合要求	合格	
3,3	活净室洁净度测试记录	5	测试记录符合要求	合格	
调	制冷机组试运行调试记录	6	机组运行调试正常	合格	
	建筑照明通电试运行记录	6	试验记录齐全	合格	
	灯 具 周定装置及悬吊装置的 载荷强度试验记录	11	符合要求	合格	
建	绝缘电阻测试记录	17	试验记录符合要求	合格	
筑电	剩余电流动作保护器测试记 求	9	记录齐全符合要求	合格	
4	应急电源装置应急持续供电 记录	7	检验记录齐全	合格	
	接地电阻测试记录	12	测试记录齐全符合要求	合格	
	接地故障回路阻抗测试记录	12	测试记录齐全符合要求	合格	
智	系统试运行记录	7	系统运行记录齐全	合格	
能	系统电源及接地检测报告	5	检测报告符合要求	合格	
建筑	系统接地检测报告	5	检测报告符合要求	合格	
建筑	外墙节能构造检查记录或热 工性能检验报告	7	检验报告符合要求	合格	
节能	设备系统节能性能检查记录	3	检查记录齐全符合要求	合格	
电	运行记录	6	运行记录符合要求	合格	
梯	安全装置检测报告	5	安检报告齐全	合格	
	· 水排水与供暖 通风与空调 建筑电气 智能建筑建筑节能电	给 聚气管道、散热器压力试验记录 卫生器具满水试验记录 沿附管道、燃气管道压力试验记录 清附管道、燃气管道压力试验记录 排水下管道珠试验记录 通风、空调频试记录 通风、空调频试记录 通风、空调频试记录 通风、空调频试记录 通风、空调频试记录 设施间向设置测试记录 对具则正装置及悬积 对具则正装置及悬积 数符塑度试验记录 到余电流动作保护器测试记录 对果则可通电试运行记录 对果则可通电过运行记录 对果则可通电过运行记录 对果则可通电试记录 额余电流动作保护器测试记录 键单阻测测试记录 接地战阵回路阻抗测试记录 接地战阵回路阻抗测试记录 系统线电阻测试记录 系统线电阻测试记录 条统线电阻测试记录 条统线电阻测试记录 条统线电源及各级 定定 章能 数符单比较 数符单比较 和 和 和 和 和 和 和 和 和	给 被 (等)	会 被	会 被

注: 抽查项目由验收组协商确定。

特别提示

- (1) 本表由施工单位按所列内容检查并填写数份后,提交给监理单位。
- (2) 本表其他栏目由总监理工程师或建设单位项目负责人组织核查、抽查并由监理单 位填写 如条件具备,应在分部工程验收时进行 分部工程验收时凡已经做过的安全和功 能检测项目、单位工程竣工验收时不再重复检测。只核查检测报告是否符合有关规定
- (3) 施工验收对能否满足安全和使用功能的项目进行强化验收, 对主要项目进行抽查 记录。填写该表。抽查项目由验收组协商确定。
- (4) 监理单位经核查和抽查合格, 由总监理工程师在表中"结论"栏填写综合性验收 结论。并由施工单位项目经理签字确认安全和功能的检测

4.8.5 观感质量检查记录

单位(子单位)工程观感质量检查记录见表 4-78(范例)。

表 4-78 单位(子单位)工程观感质量检查记录(范例)

T. F	星名称	山东智慧建筑	[中心大厦		施工单位	山东智慧建	设公司
序号		项目		抽查质	登状况		质量 评价
1		主体结构外观	共检查 15 点,	好14点,	一般 1点,	差 0 点	好
2		室外墙面	共检查15点,	好13点,	-般2点,	差0点	好
3		变形缝、雨水管	共检查 15点,	好14点,	一般 1 点,	差0点	好
4	建	屋面'	共检查10点,	好8点,	-般2点,	差 0 点	好
5	筑	室内墙面	共检查 20 点,	好17点,	-般3点,	差0点	好
6	与结	室内顶棚	共检查10点,	好5点,	-般5点,	差0点	好
7	构	室内地面	共检查10点,	好8点,	-般2点,	差0点	好
8	1.3	楼梯、踏步、护栏	共检查15点,	好12点,	-般3点,	差0点	好
9		门窗	共检查 20 点,	好17点,	-般3点,	差0点	好
10		雨罩、台阶、坡道、散水	共检查10点,	好8点,	·般 2 点,	差0点	好
1	给	管道接口、坡度、支架	共检查10点,	好9点,	·般1点,	差0点	好
2	水	卫生器具、支架、阀门	共检查10点,	好7点,	·般 3 点,	差0点	好
3	排	检查口、扫除口、地漏	共检查10点,	好5点。	-般5点,	差0点	好
4	水与供暖	散热器、支架	共检查 10 点,	好 点,	·般 点,	差0点	好

徒長

××年×月×日

L程名称	山东智慧建	筑中心大厦		施工单位	山东智慧建设	00000000000000000000000000000000000000
序号	项目		抽查质	量状况		质量评价
1	风管、支架	共检查15点,	好13点,	-般2点,	差0点	好
2 通	风口、风阀	共检查 15 点,	好13点,	·般 2 点,	差 0 点	好
3 5	风机、空调设备	共检查 15 点,	好13点,	-般 2 点,	差0点	好
4 🜣	管道、阀门、支架	共检查 15 点,	好13点,	-般 2 点,	差0点	好
5 调	水泵、冷却塔	共检查10点,	好9点,	·般 1 点,	差0点	好
6	绝热	共检查 15 点,	好13点,	一般 2 点,	差0点	好
1 建	配电箱、盘、板、接线盒	共检查 12点,	好11点,	般0点,	差0点	好
2 筑	设备器具、开关、插座	共检查 12 点,	好11点,	般 0点,	差0点	好
3 电	防雷、接地、防火	共检查 12点,	好 11 点,	一般0点,	差0 点	好
1 智能	机房设备安装及布局	共检查 10 点,	好10点,	·般 0 点,	差0点	好
2 錠	现场设备安装	共检查 10 点,	好10点,	→般0点,	差0点	好
1	运行、平层、开关门	共检查 10、点,	好9点,	一般 1 点,	差0点	好
2 棉	层门、信号系统	共检查 10 点,	好9点,	一般 1 点,	差 0 点	好
3	机房 1.	、 共检查5点,	好9点,	- 般 1 点,	差0点	好
and self-self-self-self-self-self-self-self-	综合评价			&F		

- ××年×月×日
- 注: 1. 对质量评价为差的项目应进行返修。 2. 观感质量现场检查原始记录应作为本表附件。

特别提示

- (1)本表由总监理工程师组织参加验收的各方代表,按照表中所列内容,共同实际检查,协商得出质量评价、综合评价和验收结论意见。
- (2) 工程质量观感检查是工程竣工后进行的一项重要验收工作,是对工程的一个全面检查 GB 50300 2013 规定,单位工程的质量观感验收,分为"好""一般""差"3 个等级,检查的方法、程序及标准等与分部工程相同,属于综合性验收。
- (3)参加验收的各方代表,经共同检查确认没有影响结构安全和使用功能等问题,可共同商定评价意见 评价为"好"或"一般"的项目由总监理工程师在"检查结论"栏内填写验收结论。
- (4)如有被评价为"差"的项目,属不合格项,应返工修理,重新验收时在"抽查质量状况栏"中填写具体数据。




推荐阅读资料

- 1.《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013)。
- 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)。
- 3.《城市消防规划建设管理规定》、1989年实施

任务训练

- 1. 列出钢结构工程竣工验收资料
- 2. 列出钢结构工程中的分项工程、
- 3. 填写钢结构构件制作与安装中的旅工记录
- 4. 列出钢结构工程安全和功能检验资料
- 5. 分析钢结构分部工程与钢筋混凝土结构分部工程质量验收资料的异同点

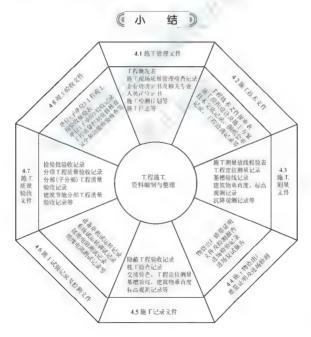

能力拓展

- 1. 收集分包单位资质报审表,并分析监理单位相关资料,找出联系点。
- 2. 收集某分项工程见证试验检测汇总表。尝试汇总子分部工程。
- 3. 拟建一别墅, 试完成施工资料归档的目录。
- 4. 分析归纳智能建筑工程洽商会涉及哪些部门和人员,如何规范填写文字
- 5. 收集建筑工程环境保护管理中关于危险源的识别与危险规避知识
- 6. 填写《技术交底》系列表。
- 7. 收集著名建筑物沉降观测数量。分析观测技术的进程
- 8. 整理一套小型建筑工程测量资料
- 9. 验收(判断)某钢结构吊装记录是否符合规范规定
- 10. 根据实际工程填写室内给水管道及配件安装质量验收表
- 11. 根据实际工程填写排水设备安装质量验收表
- 12. 根据实际工程填写室外供热管道及配件安装验收表
- 13 列出讲场物资会格证明资料汇总表
- 14. 收集工程质量事故中涉及施工物资的案例。
- 15 列出工程后晋事故处理过程应提供的工程资料
- 16. 画出电气安装工艺流程图并添写应收集的施工记录名称
- 17. 收集电气分项工程调试方案及相关施工记录
- 18. 收集电气安装与土建配合的施工记录
- 19. 对应章前学习要求。填写学习效果自我检测记录表

学习效果自我检测记录表

层次	I de la como		1
領域	10X		
理论认知	1 第	丛川	综合
岗位技能	模仿	施用	创造
职业情感	激情	心境	热情

20. 学习过程中,不仅要注重沟通表达能力训练,团队合作学习,更要加强个人工程 实践经验的积累 伴随着理论知识学习,自觉及时记录课后实践将促进职业能力的提升

课后实践记录表

实 践 分 项	时 间	段	实 践 要 点	见证人及联络方式
L地考察			L程名称、 L程所在地	
沟通能力训练			沟通对象、沟通内容、沟通效果	
内业资料管理			收集、分类、整理、立卷、归档	
小组合作学习			分工负责情况及合作成效	
实践中遇到的问题			视具体情况填写,着眼于发现问题、 分析问题及解决问题	
其他				

第5章 工程竣工验收 资料编制与整理

学习要求

	资料员应知	资料员应会	职业素养	
1.	1.程竣工验收文件的1要内容	1. 会进行工程竣工验收文件归档		
2.	厂程竣工验收文件的编制要求	2. 会整理竣工图	培养严谨、求真、务实的	
3.	工程竣工验收文件的形成程序	3. 会建立工程竣工验收文件台账	T作 松度、水具、分头的	
4.	T.程竣工验收文件的归档要求	4. 能够安全管理工程竣工验收文件	1.11. 1879.	
5.	T.程竣工验收文件的安全管理	5. 能够规范移交工程竣工验收文件		



学习性工作任务

工程背景

山东智慧建筑中心大厦应用多项建筑新技术、新工艺、倾力打造节能、环保、绿色建筑 其建筑层数 为地下三层、地上十六层、建筑面积 22 780m'、工程造价 22 780 万元 2016 年 2 月 26 日开工建设、2017 年 7 月竣工安付、成为当城智慧建筑标志性学习交流中心。

工作准备

- 1. 每组档案盒5套、A4纸、口取纸及其他零星装订工具若干。
- 2. 工程施工验收空白表格齐全。
- 3. 每组工程图纸一套。
- 4. 复印归档的工程竣工资料一套。
- 5. 工程资料管理软件1~3套。

工作任务

结合工程背景提供的信息,模拟资料员、完成以下任务。

- (1)依据建设工程文件归档规范,对境工图和工程境工始收文件进行分类,可出目录、并整理在相应档案盒内。
 - (2) 以小组为单位,分工合作完成单位工程基建文件,要工图和工程竣工验收文件的习书和移交

教学建议

该任务是本课程学习的启动导向、餐师在进行课程整体设计和单元设计时要具.4处理。根据本校教学 时间安排, 是活布置单元学习任务 建设学生分割学习、贯彻以餐师为主导、学生为主体、工作任务为导 肉、项目为载体、理论与实践相结合、学中做和微中学的职业教育教学理念,按照资讯、决策、计划、实 旅,许任, 反馈的教学专僚, 稍很教学实施活动

△ 引例

费那提供近期在本地区域建档案馆备案的典型境就工程档案实物资料·套 作为学生学习的范本,供学生观摩、分析、讨论、学习。

建筑工程资料是建设工程合法身份与合格质量的证明文件,是工程竣工交付使用的必备文件,也是对工程进行检查、验收、维修、改建和扩建的原始依据。

息 思考

- 1. 竣工图和工程竣工验收文件包括哪些内容?
- 2、竣工图和工程竣工验收文件涉及的相关方有哪些?
- 3. 工程影音资料包括哪些载体?
- 4. 工程竣工验收及备案资料与施工资料、监理资料组券有何联系与区别?
- 5. 竣工验收文件形成的流程是什么?

⚠ 推荐阅读资料

- 1. 《建设工程文件归档整理规范》(GB/T 50328-2014)
- 2.《枝术制图 复制图的折叠方法》(GB/T 10609.3-2009)
- 3. 《建筑工程资料管理规程》(IGI/T 185-2009)



5.1.1 竣工图的内容及作用

1. 竣工图的概念

设计单位在施工图设计阶段完成之后,最终将施工图交付给建设单位通过招投标所选择的施工单位组织实施。施工单位在施工过程中难免会因为原材料、工期、气候、使用功能、施工技术等因素的制约而发生变更、修改。因此,工程竣工后,就必须由各专业施工技术人员,按有关设计变更文件和工程洽商记录,遵循一定的法则进行改绘,使竣工后建筑实体的图和物相符。经过这样改绘的,真实反映建筑实体施工结果的图样称为竣工图。

房屋建筑工程竣工图包括:建筑竣工图、结构竣工图、装饰装修竣工图、电气工程竣工图、给排水工程竣工图、采暖工程竣工图、通风工程竣工图、空调工程竣工图、燃气工程竣工图等。

2. 竣工图的内容

竣工图应按单位工程,并根据专业、系统进行分类和整理,包括以下内容。

- (1) 工程总体布置图、位置图, 地形复杂者应附竖向布置图。
- (2) 建筑竣工图、幕墙竣工图。
- (3) 结构竣 [图、钢结构竣 [图。
- (4) 建筑给水、排水与采暖竣工图、通风空调竣工图。
- (5) 建筑电气竣工图、燃气竣工图、消防竣工图。
- (6) 电梯竣工图、智能建筑竣工图(综合布线、保安监控、电视天线、火灾报警、气体 灰火等)。
 - (7) 地上部分的道路、绿化、庭院照明、喷泉、喷灌等竣工图。
 - (8) 地下部分的各种市政、电力、电信管线等竣工图。

3. 竣工图的作用

竣 [图是 [程竣 [档案资料的重要组成部分, 其作用在于如下内容。

(1) 竣工图是进行管理维修、改扩建的技术依据。

竣工图是进行新建、改建、扩建、工程管理维修的技术依据。工程项目在开始建设时,一般要通过查阅原工程竣工图或实地调查,来了解周围工程的概况。特别是在敷设地下管线或进行隐蔽工程维修时,一定要通过竣工图来掌握原地下管线的走向、管径、标高和转折点、交叉点的详细位置。因使用功能上的需要进行改建、扩建就必须通过竣工图弄清楚它的基础及结构形式,如该楼是框架结构还是砖混结构,对于砖混结构要拆除某砖墙就必须考虑此墙是承重墙还是非承重墙,基础是否能再承受扩建或加层后的荷载等,否则盲目地拆除重墙或者加层增加楼房自重都是非常危险的,必将造成重大安全隐患。另外,随着生产的发展、居民生活水平的提高和建筑物使用年限的延长,必将对原有建筑的电线电缆、给排水管线等进行维修增容,因而也必须通过定整准确的竣工图来获得原有的管线走向、位置、管沟大小等,从而做好此项工作。

(2) 竣工图是城市规划、建设、管理等工作的重要依据。

随着城市现代化程度的不断提高,地下管线密如蛛网,各种隐蔽工程越来越多,在城市规划、建设、管理工作中,特别是在城市的地下建筑和地下管线空间的规划中,完整准确的竣工图是必不可少的基础资料。例如,有管线位置变更而没有改绘标注,新的管线又规划在同一位置,施工时经常发生挖断光缆、电力电缆、输水管线等事故,造成经济损失和人员伤亡。因此,必须借助于竣工图来合理地安排新建地下建筑物和地下管线的布置,协调新旧建筑物之间、工程项目计划与城市规划之间、各类管线之间的相互关系,以实现城市规划、建设管理的有序进行。

(3) 竣工图是司法鉴定裁决的法律凭证。

竣工图是对工程质量及安全事故纠纷处理的重要技术依据,对于一个重大的工程质量 事故的技术鉴定,首先要对工程图纸进行核对,检查施工单位是否严格按图施工,有变更 的部位是否给过设计同意,签字手续是否完备,其次才是对设计计算、原材料是否合格、 施工过程是否符合规范要求的检查。

(4) 竣工图是工程决算的依据。

竣工图能准确定位己完成的工程量,复核认定己完工程量的真实性,正确判定变更项目的合理性和合规性。

(5) 竣工图是抗震、防灾、战后恢复重建的重要保障。

5.1.2 竣工图的编制要求及绘制规定

1. 竣工图的类型

根据工程的实际情况和绘制竣工图的方法不同,可以把竣工图的类型分为以下4种。

- (1) 利用施工蓝图改绘的竣工图。
- (2) 在硫酸纸图上修改晒制的竣 □图。

- (3) 重新绘制的竣工图。
- (4) 用 CAD 绘制的竣工图。

2. 竣工图的编制要求

- (1) 竣工图的编制应按照单位工程并根据专业的不同、系统地进行分类和整理。
- (2) 按照施工图施工没有变动的工程,由竣工图编制单位在施工图(干净的蓝图)的图答 附近的空白处、加盖竣工图章、并由相关人员亲自签署好姓名。
 - (3) 一般性的图纸变更、编制单位可根据设计变更依据、在施工图上直接改绘。
- (4) 结构形式、丁艺、平面布置、项目等发现的重大改变或变更部分不能在原施厂图 上改绘的、应重新绘制竣工图、加盖竣工图音。重新绘制的图纸必须有图名和图号、图号 可按原图编号。
- (5) 用于改绘竣工图的图纸,都必须是新蓝图或绘图仪绘制的白图,不得使用图图 成复印的图纸。
- (6) 各专业竣工图必须编制图纸目录,作废的图纸在目录上杠掉,补充的图纸必须在 目录上列出图名和图号、加盖竣工图章和由相关人员亲自签署姓名。
- (7) 竣工图必须符合有关制图标准的要求,绘制的竣工图必须准确、清楚、完整,能 够直实地反映工程实际情况。

3. 竣工图的绘制规定

竣工图的绘制规定主要有以下几个方面。

- (1) 按图施工没有变动的,由竣工图的编制单位在原施工图上加盖、签署"竣工图" 印章后,即可作为竣工图。
- (2) 在施工中虽有一般性设计变更, 但能将原施工图加以修改、补充即可反映工程实 际情况,并符合技术图样改绘方法的,可不重新绘制竣工图,由编制单位负责在原施工蓝 图上修改,加盖修改专用章和加盖、答署"竣工图"印章后,即可作为竣工图,或在修改 部位说明设计变更单编号,同时在图的空白位置汇总标出设计变更的各编号,附上设计变 更通知单和施工说明等,经施工单位或设计单位与工程实际核对无误,加盖"竣工图"印 意后,即可作为竣工图。该方法节约人力物力,简单易行,是一种编制竣工图行之有效的 方法。这种方法适用于工程变更不大、经过修改后就能反映工程实际情况时使用。
- (3) 结构形式改变、工艺改变、平面布置改变、项目改变或其他重大修改的,以及图 面变更面积超过 35%的,不官在原施工图上修改、补充内容,应重新绘制竣工图,经施工 单位或设计单位与工程实际核对无误后,按原图编号,末尾加注"竣"字,或在新图图标 内注明"竣工阶段",加盖"竣工图"印章后,方可作为竣工图。
- (4) 引进工程的竣工图、应在外商提供的最终版施工图上按实际修改、经外商审核后 加盖"竣工图"章,方可作为竣工图。竣工图章的基本内容应包括:"竣工图"字样、施工 单位、编制人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、现场监理、总监。竣工图章 尺寸为 50mm×80mm, 如图 5.1 所示。






图 5.1 竣工图章样式(单位: mm)

\$特别提示

绘制竣工图应注意的几个问题

- (1) 未采用或全改的施工蓝图不归档, 但应修改设计目录
- (2)有变更的施工图按照前面规定的改绘方法修改后,必须经过施工单位的技术负责人和审核人校对审核,再送监理单位经总监理工程师和现场监理审阅无误后,加盖规定的竣工图章并签字后视为竣工图
- (3) 竣工图章必须使用不易褪色的红色印泥盖在图标栏的上方空白处或者其他空白处。当图面内容饱和时盖在图签的背面。
- (4) 在蓝图上改绘竣工图, 各专业图样都必须相应地修改, 使各个专业的衔接关系相 互吻合。
- (5)不得把洽商纪要或附图贴在原设计图上作为竣工图,也不许把洽商纪要原封不动地抄在原图上,应该函图的,一定要用图形符号、线条表达清楚,便于直观看图 画图所使用的图形图识符号必须符合国家制图标准,禁止徒手绘图。
- (6) 編绘竣工图所使用的图样必须是新驅制的蓝图,反差要明显 计算机出图必须清晰,不得使用计算机出图的复印件 使用的墨水必须是碳素墨水,字体要求仿宋体或者楷体字,严禁草字、错别字。
 - (7) 编绘的内容不要出图框线、图样封面、目录均加盖竣工图章。
 - (8) 在施工蓝图上改绘竣工图、严禁刮改、涂抹、要能反映设计原貌。
- (9) 凡修改处,必须注明变更的依据、出处 例如,此处变更见×年×月×日变更第 ×备。

知识链接

改绘竣工图主要有以下的几种方法。

- (1) 杠改法 具体做法是用细实线划去不需要的条款或需要变更的部分。该方法适用 于钢筋型号改动,尺寸改动或有关文字说明需要取消的条款的修改
 - (2) 叉改法。该方法适用于在图面上局部取消部分的修改。
- (3) 补图法 补图法有两种情况,一种是原图补图:另一种是指定图号补图 原图补 图就是直接在原图上画上需要增加的内容。当需要增加处空白图面不够时,可以采用结点 引出法, 画到本张图的其他空白处 当本张图需要补充的地方空白图面不够时, 可以用结 点引出符号引补到该专业图样的其他张页上 补图法适用于在蓝图上局部增加的图幅不大 的情况下使用.
- (4) 注改法(加写说明法) 该方法适用于设计说明、材料做法等能用一句话说明问题的 变更, 要求语句精练、逻辑条理清楚

5.2 竣工验收与备案文件

工程竣工验收应具备的条件

工程项目的竣工验收是全面检查合同执行情况, 检验工程施工质量的重要环节。建设 项目是否符合规划设计要求以及工程项目质量和技术资料进行全面审查验收工作,取得竣 工合格资料、数据和凭证。如果工程项目已达到竣工验收标准,就可以进行竣工交接。

1. 工程竣工验收应具备的条件

建设单位在收到施工单位提交的《工程竣工报告》(表 5-1), 并具备以下条件后, 方可 组织勘察、设计、施工、监理等单位有关人员讲行竣工验收。

- (1) 完成工程设计和合同约定的各项内容。
- (2) 施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法 规和工程建设强制性标准、符合设计文件及合同要求、并提出工程竣工报告。工程竣工报 告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。
- (3) 对于委托监理的工程项目,监理单位对工程进行了质量评估(表 5-2),具有完整的 监理资料、并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位有 关负责人审核签字。

- (4) 勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知 书进行了检查,并提出质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人和勘察、 设计单位有关负责人审核签字。工程勘察质量检查报告见表 5-3,工程设计质量评估报告见 表 5-4。
 - (5) 有完整的技术档案和施工管理资料。
- (6) 有 L程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告,以及 L程质量 检测和功能性试验资料。
 - (7) 建设单位已按合同约定支付工程款。
 - (8) 有施工单位签署的建筑工程质量保修书:建筑工程质量保修书示例见表 5-5。
- (9) 对于住宅工程,进行分户验收并验收合格,建设单位按户出具《住宅工程质量分户验收表》。
 - (10) 建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。
 - (11) 法律、法规规定的其他条件。

表 5-1 工程竣工报告(范例)

工程名称: 山东智慧建筑中心大厦 编号: E1-001

建筑面积	22 780m ²	建筑层数	地下3层,地上16层
工程地点	智慧路 267 号	L程造价	9889万元
建设单位	山东智慧建筑中心"	勘察单位、	中国智慧勘察公司
设计单位	中国智慧建筑设计公司	监理单位	山东智慧监理公司
施工单位	山东智慧建设公司	1617	

建设单位:山东智慧建筑中心

- 本单位确认,
- 一, 完成工程设计和合同约定的各项内容:
- 二、建设行政主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕;
- 三、对工程质量进行了全面检查,工程质量符合有关法律、法规和工程建设控制强制性标准,符合设计文件及合同要求,工程质量达到合格标准(见附件单位工程质量综合评定表);
 - 四、技术资料完整,主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告齐全;
 - 五、已签署工程保修书(验收时送贵单位);
 - 六、其他:

本单位认为工程已具备竣工验收条件。请你单位办理相关手续、于××××年7月17日进行竣工验收

施工单位:山东智慧建设公司 项目经理(答名)×××

企业技术负责人(签名)××× 法人代表(签名)×××

××××年7月11日

总监理 工程已具备竣工验收条件,同意于××××年7月17日进行竣工验收 工程师 签署 意思

表 5-2 工程质量评估报告(范例)

工程名称: 山东智慧建筑中心大厦

编号: E1-002

建筑面积	22 780m ²	建筑层数	地下3层,地上16层
工程地点	智慧路 267号	工程造价	9889万元
建设单位	山东智慧建筑中心	勘察单位	中国智慧勘察公司
设计单位	中国智慧建筑设计公司	监理单位	山东智慧监理公司
施工单位	山东智慧建设公司		

监理组织和实施:

施工现场设立了监理部、总监理工程师×××、总监理工程师代表×××、专业监理工程师×××、 ×××、监理员×××、·····、施工现场不少干?名监理人员、本工程实行了会讨程施工监理

监理技术资料:

《监理规划》1份、《监理细则》16份、《见证取样和送检方案》21份、《监理工通知单》17份、《会 议纪要》17份、《监理月报》17份

施丁单位质量行为:

质量保证体系较健全、按照设计及施工质量验收规范要求组织施工。对施工过程经检查要求整改的 施工质量问题进行了认真整改,最终达到了《建筑工程施工质量验收统一标准》要求的合格工程

材料构配件、设备质量:

质量保证、控制资料齐全。均为合格产品 本单位工程质量保证、控制资料共计 277 份、其中 25 项安全和功能检测资料均为会格。

工程实体质量:

本工程所含分部工程共10个,均评定为合格工程,其中分项工程共66个验收评定为合格工程;检 验批 278 个验收评定为合格、观感质量符合要求。质量等级验收评定为合格

单位 L程综合评价:

所含分部工程的质量验收合格,质量控制资料完整;所含分部工程有关安全和功能检测资料完整, 主要功能的抽脊结果符合相关专业质量验收规范规定:观感质量符合要求,故本单位工程验收为合格工 程、并同意交付使用、请业主组织验收

监理单位(盖章) 总监理工程师: (签名)××× 法人代表: (签名)×××

表 5-3 工程勘察质量检查报告(范例)

工组分秒.	山东智慧建筑中心大厦	

编号: E1-003

Γ	程名称	山东智慧建筑中心大厦	工程用途	办公	
建	筑面积	22 780m²	结构类型	框剪	
桩	基类型 预应力管桩 基础类型 筏板基础		筏板基础		
勘	察单位	中国智慧勘察公司	监理单位	山东智慧监理公司	
施	工单位	山东智慧建设公司	桩基分包单位	无	
	勘察执行标	准: 岩土工程勘察规范	•	•	
	勘察主要成	果: 查明场址地质条件			
	建议采用桩基: 预应力管桩 实际采用桩基: 预应力管桩				
勘察	桩基荷载试验情况: 极限承载力×××kN				
耐聚 质量 检查	施工关键阶	段核查意见:进行了地质验槽,实员	永工程地质条件与勘	察报告相符	
情况	勘察质量检	·查意见:实际工程地质条件与勘察相	及告相符		
	勘察项目负	责人: (签名)××× 、〈 \ '\\	技术负责人: (签名) ×××	
	法人必当.	(答名)×××(单位公童)	VAI B	期,2017年7月12日	

表 5-4 工程设计质量评估报告

工程多	称	山东智慧建筑中心大厦	工程用途	办公
建筑面	1积	22 780m²	结构类型	框剪
设计单	位	中国智慧建筑设计公司	监理单位	山东智慧监理公司
施工图	宇批意见	符合规范要求	结构使用年限	50 年
施工单	位(总包)	山东智慧建设公司	主要分包单位	/
	法律、法规	·执行情况:符合要求	•	
	强制性条文	.执行情况:符合要求		
	单位资等级	1、设计人员资格和质量控制情况	: 符合要求	
设计	设计深度:	符合要求		
及い	建筑平面布	·置和建筑外观是否符合设计:符	合设计要求	
冷 杏	施工关键部	(位核查意见:符合设计要求		
情况	设计项目负	责人:(签名)××× 技术负寸	責人: (签名)×××	
	法人代表:	(签名)××× (单位公章)	日期:	
				2017年7月12

表 5-5 建筑工程质量保修书

编号: E1-005

一、工程质量保修范围和内容

发向人, 承向人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程盾号管理条例》和《房屋建筑工程盾号保修办 法》, 经协商一致, 对山东智慧建筑中心大厦(工程全称)签订工程质量保修书

承向人在盾等保修期内, 按照有关法律, 法规, 规章的管理规定和双方约定, 承担本工程盾等保修 责任

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外 墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、绘排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他 项目。具体保修的内容,双方约定如下:

1、质量保修期

双方根据《建设工程后号管理条例》及有关规定、约定本工程的盾景保修期如下。

- (1) 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
- (2) 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;
- (3) 装修工程为2年:
- (4) 由气管线、绘排水管道、设备安装工程为了车。
- (5) 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期:
- (6) 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年:
- (7) 其他项目保修期限约定如下:

盾号保修期自工程站工验收合格之日起计算

三、质量保修责任

- (1) 属于保修范围 内空的项目 承负人应当在拉到保修通知之日起 7 天内派人保修 承负人不存 约定期限内派人保修的、发包人可以委托他人修理。
 - (2) 发生紧急抢修事故的、承包人在接到事故通知后、应当立即到达事故现场抢修
- (3) 对于涉及结构安全的质量问题、应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定。立即向当地 建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修 方雷、承包人实施保修
 - (4) 质量保修完成后、由发包人组织验收

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项:

本工程质量保修书、由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署、作为施工合同附件、 其有效期限至保修期滿

发包人(公章): 承包人(公章):

法定代表人(签字): ××× 法定代表人(签字): ××× ××××年××月××日 ××××年××月××日

知识链接

工程质量保证书

建设工程实行质量保修制度 建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时,应当向建设单位出具质量保修书 质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

建筑工程的保修范围应当包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土 建工程,以及电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目;保修的期 限应当按照保证建筑物合理寿命年限内正常使用 建筑物在合理使用寿命内必须保证地基 基础和主体工程质量 建筑工程竣工时,屋顶、墙面不得留有渗漏、开裂等质量缺陷

建设工程的保修期,自竣工验收合格之日起计算 保修期的起始日是竣工验收合格之 日,是指建设单位收到建设工程竣工报告后,组织设计、施工、监理、勘察、设计等有关 单位进行竣工验收、验收合格并各方签收竣工验收文本的日期

房屋建筑工程在保修范围和保修期限內发生质量缺陷、施工单位应当履行保修义务 对在保修期限和保修范围內发生质量问题的,一般应先由建设单位组织勘察、设计、 施工等单位分析产生质量问题的原因、确定保修方案、由施工单位负责保修 但当问题严 重和紧急时,不管是什么原因造成的、均先由施工单位履行保修义务,不得推诿 对引起 质量问题的原因则实事求是,科学分析,分清责任、按责任大小由责任方承担不同比例的 经济赔偿。

这里的损失,既包括因工程质量问题造成的直接损失,即用于返修的费用,又包括间 接损失,如给使用人或第三人造成的财产或非财产损失等

5.2.2 工程竣工验收的程序

工程竣工验收·般分为两个阶段进行。

1. 竣工初验收的程序

当单位工程达到竣工验收条件后,施工单位应在自查、自评工作完成后,填写单位工程竣工验收报审表,并将全部竣工资料报送项目监理机构、申请竣工验收。总监理工程师应组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行全面检查,对检查出的问题,应替促施工单位及时整改。对需要进行功能试验的项目(包括单机试车和无负荷试车)、监理工程师应督促施工单位及时进行试验,并对重要项目进行督促、检查,必要时请建设单位和设计单位参加;监理工程师应认真审查试验报告单并督促施工单位搞好成品保护和现场清理。

经项目监理机构对竣工资料及实物全面检查、验收合格后,由总监理工程师签署单位 工程竣工验收报审表,并向建设单位提出质量评估报告。

2. 正式验收的程序

建设单位收到《工程竣工报告》后,应由建设单位(项目)负责人组织勘察、施工(含分 包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人和其他有关方面的专家组成验收组、制定验收方 零,并在工程竣工验收7个工作目前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督 该工程的工程质量监督机构。建设单位应按下列要求组织竣工验收。

- (1) 建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各 个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。
 - (2) 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
 - (3) 实地查验工程质量。
- (4) 对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面做出全面评价,形 成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

参与 L 程竣 L 验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时,应 当协商提出解决的方法,或请当地建设主管部门或工程质量监督机构协调处理,待意见。 致后, 重新组织工程竣工验收。

单位工程由分包单位施工时,分包单位对所承包的工程项目应按规定的程序检查评 定, 总句单位应派人参加。分句下程完成后, 应将下程有关资料交总句单位。在一个单 位工程中,对满足生产要求或具备使用条件,施工单位已预验,监理工程师已初验通过 的子单位工程, 建设单位可组织进行验收。有几个施工单位负责施工的单位工程, 当其 中的施工单位所负责的子单位工程已按设计完成,并经自行检验,也可组织正式验收, 办理交工手续。在整个单位工程进行全部验收时, 己验收的子单位工程验收资料应作为 单位工程验收的附件。

在竣工验收时, 对某些剩余工程和缺陷工程, 在不影响交付的前提下, 经建设单位、 设计单位、施工单位和临理单位协商、施工单位应在竣工验收后的限定时间内完成。建设 工程需验收合格后、方可交付使用。

5.2.3 工程竣工验收报告与验收证书

1. 工程竣工验收报告

工程竣工验收合格后,建设单位应当及时提出《工程竣工验收报告》(表 5-6)。《工程 竣 厂验收报告》 主要包括工程概况,建设单位执行基本建设程序情况,对工程勘察、设计、 施工、监理等方面的评价,工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式,工程竣工验收意 见等内容。

《工程竣工验收报告》还应附有下列文件。

- (1) 施工许可证。
- (2) 施工图设计文件审查意见:
- (3) 监理单位出具的工程质量评估报告,勘察单位出具的工程勘察质量检查报告,施 [单位签署的建筑 [程质量保修书。
 - (4) 组人员签署的工程竣工验收意见。
 - (5) 法规、规章规定的其他有关文件。

表 5-6 单位工程竣工验收报告(范例)

L程名称: 山东智慧建筑中心大厦

编号: E1-006

建筑面积	22 780m ²	建筑层数	地下3层, 地上16层
L程地点	×××	工程造价	9 889 万元
建设单位	山东智慧建筑中心	勘察单位	中国智慧勘察公司
设计单位	中国智慧建筑设计公司	监理单位	山东智慧监理公司
施工单位	山东智慧建设公司		

验收组成员(姓名、单位、职务或职称、专业)

	验收组职务	姓名	工作单位	职务	职称(专业)
ĺ	验收组组长	×××	山东智慧建筑中心	项目负责人	工程师(土建)
1	-D 60 14	×××	山东智慧监理公司	总监	监理工程师
	副组长	×××	中国智慧建筑设计公司	总工	一级建筑师
组成员		×××	山东智慧建设公司	技术负责人	一级建造师
	验收组其他	×××	山东智慧建设公司	~ 項目经理	一级建造师
	成员	×××	山东智慧建筑中心`	业主代表	工程师
		×××	山东智慧监理公司	监理工程师	工程师(安装)

验衣情况(验收程序、验收标准、分组情况、验收内容、检查方式):

- 1. 脸收程序
- (1) 建设单位主持验收会议。
- (2)建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同股约情况和在工程建设各个环节执行法律、 法规和工程建设强制性标准情况。
 - (3) 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料
 - (4) 验收组实地查验工程质量
 - (5) 专业验收组发表意见。验收组形成工程竣工验收意见并签名
 - 2. 验收标准

国家的强制性标准,现行质量检验评定标准、施工验收规范、经审查通过的设计文件及有关法律、 法规、规章和规范性文件规定

- 3. 分组情况
- 分土建、水电(消防、设备)安装、工程资料审查三个验收组
- 4 验收内容

由建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家进行工程验收, 对工程实物 及技术资料进行全面检查

5 检查方式

屋面、地下室、室外工程:全方位检查

室内:楼梯全查。一、三、五、九、十二、十五、十六层

检查情况已有记录和查验人签字

对安装质量和各管理环节等方面做出全面评价。形成验收人员答署的工程竣工验收意见

续表

	25.4%
验收专家组	且评定意见
技术资料 审核情况	技术资料完整,该工程质量保证资料、隐蔽验收记录、检验批验收记录、分项分部工程 验收记录均与工程同步且详实齐全
现场实体 检测情况	根据工程实际情况对现场实体工程质量进行了全面检查和部分检测,核查工程安全和功能检验资料均符合质量验收标准 符合有关方面的法律、法规和工程建设强制性标准、符合设计文件及合同要求
观感质量评价	工程观感质量共检查 15 项、每项抽查 5~10 个点,均能满足质量验收标准。观感质量各分部均评定为好(观感质量检查评价方法应符合下列规定;检查标准;每个检查项目的检查点 按"好""一般""墨"给出评价、项目检查点 95%及其以上达到"好",其余检查点达到一般的为一档,取 100%的标准分值;项目检查点,"好"的达到 80%及其以上但不足 90%,其余检查点达到"一般"的为一档。取 85%的标准分值;检查方法;现察辅以必要的量测和检查分部(子分部)工程质量验效记录,进行分析计算]
验收专家约	
E.程质量 验收结论	演工程建设、监理、勘察、设计、施工单位的相关管理行为及勘察、设计、施工、设备 安装盾童符合有关法律、法规和国家施工质量验收规范;符合合同及设计文件要求;工程资 料完整、真实、有效 同恋验收
专家组 签字	

2. 竣工验收证明书格式(表 5-7)

表 5-7 竣工验收证明书

施工许可证与	ī:			纠	号:
L程名称	d	鏡面积	层数	工程地点	
结构类型	T	2程造价		开工日期	
AIII, E	,	- (LAE ()		竣工日期	
工程内容 及检查情况					
				验收日期:	年 月 日
	建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
验收意见	项目负责人:	总监理 口程师:	项目负责人:	项目负责人:	单位负责人:
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章

3. 工程质量验收证明书

工程质量验收证明书(地基、基础、主体)的封面及资料表格形式如图 5.2 所示。

图 5.2 竣工验收证明书

5.2.4 竣工验收备案

1. 竣工验收备案程序

- (1) 单位工程竣工验收 7 日前,建设单位到设立在承接监督该工程的监督站工程竣工 验收备室管理部门领取《建设工程竣工验收备室表》。同时、建设单位将竣工验收的时间、 地点及验收组名单和各项验收报告报送负责监督该项厂程的质量监督部门、准备对该厂程 竣工验收进行监督。
- (2) 自 厂程竣 厂验收合格之目起 15 个 厂作目内, 建设单位将《建设厂程竣工验收备案 表》一式两份和竣工验收备案文件报送工程竣工验收备案管理部门,经备案工作人员初审 验证符合要求后,在表中备案意见栏加盖"备案文件收讫"意。
- (3) 工程质量监督部门在工程竣工验收合格后 5 个工作目内,向工程竣工验收备零管 理部门报送《丁程质量监督报告》。
- (4) 各家管理机构负责人审阅《建设工程竣工验收备家表》和各家文件、符合要求后、 在表中各案管理部门处理意见栏填写"准予该工程竣工验收备案"意见。加盖"工程竣工 验收备案专用章"。监督管理费结算完毕后,备案管理部门将备案表一份发给建设单位,一 份备案表及全部备案资料和《工程质量监督报告》留存档案。
- (5) 建设单位报送的《建设工程竣工验收备案表》和竣工验收备案文件如不符合要求 的, 备案工作人员应填写《备案审查记录表》, 提出备案资料存在的问题, 双方签字后, 交 建设单位修改。
- (6) 建设单位根据规定对存在的问题进行整改和完善,符合要求后重新报送备案管理 部门备案。
- (7) 备案管理部门依据《工程质量监督报告》或其他方式发现在工程竣工过程中存在 有违反国家建设工程质量管理规定行为的,应当在收讫工程竣工验收文件 15 个工作日内, 贵今建设单位停止使用,并重新组织竣工验收。建设单位在重新组织竣工验收前,工程不 得自行投入使用, 违者按有关规定处理。
- (8) 建设单位采用虚假证明文件办理竣工验收备案, 工程竣工验收无效, 贵令停止使 用, 重新组织竣工验收, 并按有关规定进行处理。
- (9) 建设单位在工程竣工验收合格后 15 日内未办理工程竣工验收备案, 青今其限期改 正, 并按有关规定处理。

2. 竣工验收备零流程图

竣工验收备案流程如图 5.3 所示。

3. 建设工程竣工验收备案表

建设 L程竣 L验收备案表填写说明见表 5-8。






图 5.3 工程竣工验收备案流程表

表 5-8 建设工程竣工验收备案表填写说明

项目名称	序号	内 容
封面	1	L.程名称: 四封面名称
	2	工程地址:填写邮政地址,写明区(县)街道门牌号码
JHI (FIL	3	工程规模: 建筑工程填写坡工建筑而积, 市政、公用等工程填写工程实际造价时超出规划允许偏差而积时, 要补办规划手续, 并附上补办的规划手续
	1	工程名称: 同封面名称
	2	工程地址:填写邮政地址,写明区(县)街道门牌号码
	3	工程规模:建筑工程填写按工建筑面积,市政、公用等工程填写工程实际造价时超出规划允许偏差面积时,要补办规划手续,并附上补办的规划手续
	4	工程类别: 公用或民用等
第一页	5	结构类型: 混合、框架、剪力墙、钢结构等
宛 · 风	6	规划许可证号:按工程规划许可证号码填写
	7	施工许可证号:按工程施工许可证号码填写
	8	监督注册号:按工程质量监督注册登记表的号码填写
	9	单位名称和负责人;建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位的名称均 用法人单位名称,负责人即法人代表的姓名。监督部门填写监督室、站名称;负责人 填写室、站负责人的姓名

续表

切自名称	沙安	PA E
	10	备案理由:在建设单位处加盖法人单位公章,负责人处法人代表签字
第一页	11	报送时间:填写《建设工程竣工验收备案表》和工程验收备案资料初步验收符合要求 的日期
		表内的竣工验收意见: 拗察单位意见、设计单位意见、施工单位意见、监理单位意见, 均要有结论性评语,如: 合格、良好、优秀
	ı	勘察单位意见:如某工程地基为我院勘察,勘察报告标号为×××××××、经 验槽槽成上质为××土,与勘察报告相符。基底局部处理意见见治商××××号,同 意竣工验收
ANY TE	2	设计单位意见:如某工程为我院设计,现己施工完毕,经检查施工符合设计图样和工程洽商要求,同意竣工验收
第二页	3	施工单位意见:如某工程已按设计图样及变更冷商和施工合同完成,符合国家施工验 收规范及标准,工程质量等级自评为合格。同意波 [验收
	4	监理单位意见:如某工程为我公司监理,该工程能工符合设计图样及变更治商和国家 能工验收规范及标准,工程质量等级为合格,同意竣工并验收
	5	建设单位意见:如果工程经我单位组织勘察、设计、施工、监理单位共同检查,满足 设计要求,符合国家规范及标准要求,工程质量等级为合格,同意竣工验收。 以上各栏中签字可以是单位负责人,也可以是项目负责人,签字后加蓝公章
	ı	竣工验收备案文件清单: 由建设单位提供
	2	份数栏: 由建设单位填写
	3	验证情况: 由备案经办人员填写,符合要求的加盖"符合要求"章
	4	备注栏: 由备案经办人员填写
第三页	5	备案意见:由备案室备案经办人填写备案文件收讫的日期,加盖"备案文件收讫"章
	6	备案管理部门负责人,由备案室主任签字
	7	经办人:由备案室备案经办人签字
	8	日期: 备案管理部门负责人签字的时间, 备案以此日期为准
	9	公章:加盖备案管理部门竣工验收备案专用章
第四页	1	备案管理部门处理意见:由备案室主任签署问意备案的意见后,填写日期,加盖工程 竣工验收备案专用章

总体要求: (1)《建设工程竣工验收备案表》一律用钢笔、墨笔填写。

- (2) 字迹清楚,字体 Ľ整。
- (3) 所有签字栏,一律由本人手写签字,不得代签。
- (4) 所填内容必须真实、准确,不得随意涂改

4. 竣工验收备案文件

竣工验收备案文件说明见表 5-9。

表 5-9 竣工验收备案文件说明

项目名称	序号	说明
规划许可证及其他规 划批复文件	I	地方城市规划管理部门颁发的《建设工程规划许可证》
施工图、设计文件审查 报告	2	施工图审查机构审查
L程质量监督手续	3	由地方建设工程质量监督机构或区(县)监督机构、专业监督机构办理的 《工程质量监督注册登记表》
工程施工许可证或开 工报告	4	地方建设上管部门颁发的《建筑工程施工许可证》。按照国务院规定的权限和程序批准开工的为开工报告
公安消防部门出具的 认可(批准)使用文件	5	由地方消防部门对该工程的消防工程验收合格后签发的《××地方建筑 工程消防验收意见书》或批复报告
环保部门出具的认可 (准许)使用文件	6	工厂、车间、住宅小区、商店、宾馆、饭店等依据《建设项目环境保护 管理办法》,由地方环境保护局出具《环境影响报告书》或批复报告
E生部门出具的认可 (准许)使用文件	7	公共或民用建筑工程中,涉及生活饮用水的项目,要有卫生防疫部门出具的《水质检验报告》
质量合格文件	8	1. 勘察部门对地基及处理的验收文件。《隐蔽工程检传记录》中的地基等收记录,建设、勘察、设计、监理、施工单位签字要齐全,无未完事项 2. 单位工程验收记录。由建设单位组织勘察、设计、监理、施工单位在工程效工验收合格后签署的《单位工程验收记录》各方签字要齐全,身加高单位公拿提供原件) 3. 单位工程质量评定文件。依据《建筑工程施工质量验收统一标准》,施工单位自评记录。包括《单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录》《单位(子单位)工程观感质量检查记录》及室内环对检测报告等 4. 监理部门签署的《竣工移交证书》。依据《建设工程监理规程》,由起设、监理单位共同办理竣工移交手续、《竣工移交证书》的总监理工程师和建设单位代表签字,双方加盖公章
地基与基础、结构工程 验收记录及检测报告	9	包括《基础结构工程验收记录》《主体结构工程验收记录》。建设、设计、 监理、施工单位四方签字齐全,并加盖单位公章。按照国家规范要求, 进行检测的应提交检测报告。例如复合地基要有《复合地基检测报告》; 工程因质量问题实施的检测,备案时要有检测报告
工程竣工验收报告	10	设计单位、勘察单位、监理单位提供的《工程质量评估报告》;施工单位提供的《工程质量检查报告》;施工单位提供的《工程竣工报告》;途辽单位提供的《单位工程竣工验收报告》,以上报告要经项目负责人签字,并加盖公章
L程质量保修书	11	按照《建设工程质量管理条例》(国务院 2000 年 279 号令), 建设单位利施工单位共同签署《房屋建筑工程质量保修书》, 其内容包括: 质量保价范围、质量保修期、质量保修责任、保修费用和其他
住宅质量保证书	12	住宅质量保证书由建设单位编写,其内容包括: L程在正常使用条件下建设工程的最低保修期限

续表

项目名称	序号	说明
住宅使用说明书	13	住宅使用说明书由建设单位编写,应当对住宅的结构、性能和各部位(部件)的类型、性能、标准等做出说明,并提出使用注意事项。一般应当包括开发单位、设计单位、施工单位、监理单位、结构类型、装修、装饰注意事项。上水、下水、电、燃气、热力、通信、消防等设施配置的说明,有天设备、设施安装预留位置的说明和安装注意事项。门、窗类型及使用注意事项。配电负荷、承值增、探温墙、防水层、阳台等部位注意事项的明,其他需说明的问题。住宅中的设备、设施、生产厂家另有使用说明书的。应附于《住宅使用说明书》中
其他文件	14	凡属需要说明、报告的其他事项,不能归到前 13 项资料中的,可归纳在 "其他文件"

各室文件要求,

- (1) 所有备案文件应由建设单位收集、整理、符合要求后由建设单位报送备案。
- (2) 备案文件要求真实、有效,不得提供虚假证明文件。
- (3) 备案文件要求提供原件。如为复印件应注明原件存放单位、复印人签名、日期,并加盖建设单位公
- 章。复印件应清晰、整洁, 无黑斑、歪斜等缺陷。
- (4) 文件规格尺寸为 A4(297mm×210mm), 左部预留尺寸 30mm, 上部预留尺寸 25mm

知识链接

在正常使用条件下、建设工程的最低保修期限如下

- (1) 地基基础工程和主体结构工程、为设计文件规定的该工程的合理使用年限
- (2) 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、保修期限为5年
- (3) 供热与供冷系统。保修期限为2个采暖期、供冷期
- (4) 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程、保修期限为2年
- (5) 墙面、顶棚抹灰层脱落、保修期限为 | 年; 地面空鼓开裂、大面积起砂、保修期 限为1年。
 - (6) 门窗翘裂、五金件损坏、保修期限为1年
 - (7) 管道堵塞、保修期限为2个月。
 - (8) 供热与供冷系统和设备保修期限为2个采暖期、供冷期。
 - (9) 卫生洁具保修期限为1年。
 - (10) 灯具、电器开关保修期限为6个月。
 - (11) 其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。

5.2.5 建设工程竣工验收备案证书

建设工程竣工验收备案证书的格式如图 5.4 所示。

地上16层,地下3层

结构类型: 框架-剪力墙结构,

9 889 万元 22 780m²

厂程详细地点:智慧路267号

期; 2016年2月26日 期, 2017年7月12日

公际开工日 实际竣工.日

山东智慧监理公司中国智慧勘察公司

监理单位: 勘察单位:

1.程竣工实况

山东智慧建筑中心大厦

下起 全縣: 工程造价; 建筑面积:

×市建筑工程竣工验收备案证书

××建××年××号

法律、法规和工程建设强制性标准,工程竣工验收备案文件收讫。 你单位建设的山东智慧建筑中心大厦工程建设符合国家有关 山东智慧建筑中心: 文件齐全,

惟予备案。 特发此证

××年××月××年 (发证单位)

设计单位: 中国智慧建筑设计公司 施工中位: 山东跨越建设公司 建筑单位驻工地负折人: 季×× 监理单位驻工地负折人: 季×× 项目岭建; 季××、项目监督工地负责人: 加×× 项目的建署下程向: 聚××

各案给办人, 祖xx

2.本证书中省建筑厅认定的各级工程竣工验收备案部门核发,证 (住建部3号令) 机发, 作为1.程竣1.验收备案的法律凭证, 任 《房屋建筑工程和山政基础设施工程竣工验收备案管理办法》 (国务院279号令) **将复印件需给原核发单位加盖公章,否则无效。** 1.本业系根据《建设工程质量管理条例》 何单位和个人不得翻印。 各注:

3.本证书所列内容,均应用钢笔、签字笔认真填写或用打印机打

不得涂改。

工程竣工验收备案证书 图 5.4

5.3 竣工决質文件

5.3.1 竣工决算的概念及内容

1. 竣工决算的概念

竣工决算是建设工程经济效益的全面反映,是项目法人核定各类新增资产价值,办理 其交付使用的依据。通过竣工决算,一方面能够正确反映建设工程的实际造价和投资结果; 另一方面可以通过竣工决算与概算、预算的对比分析、考核投资控制的工作成效、总结经 验教训、积累技术经济方面的基础资料、提高未来建设工程的投资效益。

工程竣工决算是指在工程竣工验收交付使用阶段,由建设单位编制的建设项目从筹建 到竣工验收、交付使用全过程中实际支付的全部建设费用。竣工决算是整个建设工程的最 终价格, 是作为建设单位财务部门汇总固定资产的主要依据。

竣工决算是由建设单位编制的反映建设项目实际造价和投资效果的文件。

2. 竣工决算的内容

竣工决算的内容应包括从项目策划到竣工投产全过程的全部实际费用。竣工决算的内 容包括竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程造价对比分析等四个 部分。其中竣工财务决算说明书和竣工财务决算报表又合称为竣工财务决算,它是竣工决 算的核心内容。

5.3.2 竣丁决算的依据与编制格式

1. 竣工决算主要依据

竣工决算的编制依据主要有:

- (1) 经批准的可行性研究报告及其投资估算书:
- (2) 经批准的初步设计或扩大初步设计及其概算书或修正概算书:
- (3) 经批准的施工图设计及其施工图预算书。
- (4) 设计交底或图纸会审会议纪要:
- (5) 招投标的标底、承包合同、工程结算资料:
- (6) 施工记录或施工签证单及其他施工发生的费用记录:
- (7) 竣工图及各种竣工验收资料:
- (8) 历年基建资料、财务决算及批复文件;
- (9) 设备、材料等调价文件和调价记录:
- (10) 有关财务核复制度、办法和其他有关资料、文件等。

2. 竣工决算书的编制格式

竣工决算书编制格式

- P1: 封面详见图 5.5。
- P2: 目录详见图 5.6。

P4: 竣工决算编制说明详图(略)。

竣工决算书汇总表中的工程内容中的每·项的"×××建设工程(结)算书"并附带其依据,如施工合同、桩孔检查记录、工程量签证单、会议记录、钢筋明细表等资料。

图 5.5 工程竣工决算书封面

目录	
1.竣工决算书汇总表 主体工程 6m外超深基础 增加建筑面积和树材补差价 现场签证增减工程	
2.竣工决算编制说明	

图 5.6 工程竣工决算书目录

表 5-10 竣工决算书汇总表

P.	项目名称	结算依据 (计量计价)	结算价格	行注(附)
1	主体 工程			
2	6m 外超深基础			
3	增加建筑面积和钢材补差价			
4	现场签证增减工程			
5	设计变更增减 □程	·		
建设单位: (公章) 法人代表: 现场代表: 预算编制人:(盖造价员章)		施工(单位): (公章) 法人代表: 现场代表: 预算编制人:(盖造价员章)		
审核人:		审核人:		

5.3.3 竣工决算与竣工结算的关系

- (1) 竣工决算是建设单位在全部工程或某一期工程完工后编制的,它是反映竣工项目 的建设成果和财务情况的总结性文件。它是办理竣工工程交付使用验收的依据,是交工验 收文件的组成部分。竣工决算包括:竣工工程概算表、竣工财务决算表、交付使用财产总 表、交付使用财产明细表和文字说明。
- (2) 竣工结算就是指工程完工、交工验收后,施工单位根据原施工图预算,加上补充 修改预复向建设单位办理竣工工程价款结算的文件。它是调整工程计划、确定和统计工程 进度、考核基本建设投资的效果、进行工程成本分析的依据。
- (3) 竣工决算与竣工结算的主体是不同的,竣工结算是施工单位和建设单位之间的经 济关系,竣工决算一般是建设单位自身的经济事务。

工程决算是国家基本建设中的一个重要程序,是对所完成的各类大小工程在竣工验收 后的最后经济审核;包括各类工料、机械设备及管理费用等。



项目竣工决算审计与工程结算审核的区别

I. 两者依据不同

竣工决算审计依据《审计法》和审计署发《基本建设竣工决算审计工作要求》进行, 主要审查概(预)算在执行中是否超支,超支原因,有无隐匿资金;隐瞒或截留基建收入和 投资包干结余。以及以投资包干结余名义分基建投资之类的违纪行为。等等、

工程造价审计主要是根据国家有关法规和政策,依据国家建设行政主管部门颁发的工程定额、工程消耗标准、取费标准以及人工、材料、机械台班价格参数、设计图纸和工程实物量,工程造价的确认和控制进行有效的监督检查 在工程项目实施阶段,以承包合同为基础,在竣工验收后综合施工资更,工程签证。

2. 两者法律效力不同

审计机关和被审计单位是一种审计行政法律关系。审计机关的审计监督只对被审计单 位产生法律效力,对其他单位不产生连带法律约束力。凡对建设单位投资项目进行的审计 结果,对施工单位的涉价结算不具有约束力。

工程造价中的工程结算审核,是以施工承包合同为基础,以承发包双方发生的实物交 易为依据,按照国家或地方施工工、料、机消耗标准进行核算,对双方有约束力 其工程 结算审核结果可作为双方结算的法律依据。

3. 两者的目的不同

审计的目的是加强对公有削投资者资金进行有效的控制,减少投资者滥用职权裁留资金,转移资金于小金库、造成建设资金流失,其职能是一种监督行为

工程造价审核是运用科学、技术原理和经济法律手段,解决工程建设活动中工程造价的确定与控制,从而达到提高投资效益的经济效益目的的行为,是确定造价的实施过程和行为。

4. 两者从业人员不同。

审计以会计师、审计师为主;而工程造价审核以工程经济和工程技术人员为主 目前国家正在实行注册造价工程师制度,今后的工程造价审核,将以造价工程师为主

5.3.4 施工决算文件与监理决算文件

1. 施工单位的工程决算文件

施工单位的决算文件包括:材料、人工、机械费相关的原始合同、预算、结算文件 及相关审批、原始单据(即图纸、合同、报告、清单、工程洽商单、设计变更单等)皆要 附上。

1) 施工单位报审表(通用)

施工单位报审表(通用)常见格式见表 5-11。

表 5-11 施工单位报审表(通用)

L程名称:	××学院实验实训楼	

致: ×× 监理协会建设监理中心

我方己完成保温外窗的安装 工作,经自检合格,请予以审查或验收。

附件:□隐蔽工程质量检验资料

□检验排质量检验资料

团分项 工程质量检验资料

□施工试验室证明资料

口其他

施丁项目经理部(盖章)××建筑工程有限公司

项目经理或项目技术负责人(签字)××

××年×月×日

编号: B7-012

审查或验收意见:

经核查工程质量记录和现场检查。保温外窗安装合格、同意验收

项目监理机构(善意) 专业监理工程师(签字)×× ××年×月×日

- 注:本表一式两份,项目监理机构、施工单位各一份。
- 2) 工作联系单

工作联系单常见格式见表 5-12(范例)。

表 5-12 工作联系单(范例)

L程名称: ××学院实验实训楼 致: ××监理协会建设监理中心

编号: C1-005

××年6月7日上午9:00 由于你单位监理工程师的口头指令造成施工现场工程量的增加(附计算单); 望派员于××年6月8日上午8:00 现场确认

> 发文单位: ××建筑工程有限公司 负责人(签字)××

> > ××年6月7日

3) 工程项目总造价表

工程项目总造价表常见格式见表 5-13(范例)。

表 5-13 工程项目总造价表(范例)

「程名称有, ××××厂房和办公楼

序号	单项工程名称			金额/元
1	建筑工程			$\times \times \times$
2	厂房签证			×××
3	室外签证			×××
4	:次施 [部分			×××
5	钢结构		2/4	×××
6	厂房电气		1.102	×××
7	厂房给排水	. 1	110	×××
8	办公楼电气			×××
9	办公楼给排水			×××
10	绿化 II程	100		×××
	投标总价			×××

2. 监理单位的工程决算文件

监理决算文件,上要包含在整个T.程项目实施过程中,对单项工程、单位工程竣工决 算监理审查资料,以及按照监理合同规定,监理单位与委托方的合同所结算文件。

其中监理审核竣工决算文件见表 5-14。

表 5-14 单位工程竣工决算监理审查表

监[]审字第 号

□程名称:				
施工单位:				
审核意见: (1) 工程质量:由上海多姆设计工程有限公司承包施工的工程; 文件及施工验收规范要求。 (2) 工程资料:全套工程资料 A/B/C/D/E(见目录)。 施工资料符合归档编制要求,建设给予办理坡工决算工作,建				设计
表生以下的古写真 1890的要求、是以出了为少年及上以并上下,是专业监理工程师; 总监理工程师(代表):	以中世知] 灰义为	CLUM	171-1-0	
	时间:	年	月	日

编号:



工程结算审核是一项具体, 宏辟目技术性强的工作, 它包括工程量计算的核 实、奈用预算单价的审核、各类费用计取的审核、材料差价文件及有关规定执行 的审核。

宙核工程结算应注意的问题如下。

- (1) 认真审核容易出现重复计算的工程项目 在工程项目进行审核时,由于 角度不同。施工单位在结算中会列出许多类似多计重算的项目。这就要求在审核 工程结算附一定要執承并选懂施工图纸 认直执行工程器计算规则及有关规定 掌握定额中各分部分项所包含的内容。剔出结算中重复计算的费用。以保证工程 结算的直索
- (2) 深入施工现场、了解实际情况、询问变更执行情况、使其工程结算真正 反映出其工程的实物量价值
- (3) 必须查验施工单位资质证、弄清其取费类别、掌握费用定额及规定的计 笪规则 准确无误协审核工程绘算中的各项费用
- (4) 审核容易疏忽的项目 在工程量计算规则中有许多知减条文, 审核时一 定要注意。

1) 竣工结算审核意见书

工程竣工结算审核意见书是指总监理工程师签发的工程竣工结算文件或提出 的工程竣工结算合同争议的处理意见。其内容主要有合同工程价款、工程变更价 款、费用索赔合计金额、依据合同规定施工单位应得的其他款项, 工程竣工结算 的价款总额,建设单位已支付工程款、建设单位向施工单位索赔合计金额、质量 保修金额、依据合同规定应扣除施工单位的其他款项,建设单位应支付金额等。

结算审查应在工程竣工报告确认后依据施工合同及有关规定进行,审查程序 应符合《建设工程监理规范》(GB 50319-2013)规定。

2) 常用表格

部分省市在竣工结算审核意见书中常用部分表格格式见表 5-15~表 5-20。

建设单	单位						咨询类	型		
施工車	单位						专业			
L程名	ら称:									
序号	单位	工程名称	合同价/元	送审价/元	审定价/元	柞	亥增額/元	核减	额/元	核增核减率/%
	合计	L .				Г				

表 5-15 工程结算审定单

续表 审定总价金额大写 备 注 咨询企业(章): 建设单位(章): 施工单位(章): 项目负责人(签字盖章): 经办人: 经办人: 签发人: 签发人: 签发人: 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

表 5-16 工程项目总价表

日期:

年 月 日

工程名和	₩:				100	第 页	共 (
序号	单项工程名称	合同价/元	送审价/元	审定价/元	核增额/元	核減額/元	备注
1							
2							
3				01			
4							
5			3.30				
6							
7							
/	合 计						
经办人	100		项目负责人(签字盖章)			
					H	期: 年	月 F

注:核增核减额=审定价-送审价。

表 5-17 单位工程费用表

工程名	5称:				第	页	共	页
序号	项目名称	合同价/元	送审价/元	审定价/元	核増額	/元	核減额	元
1	分部分项工程费措施项目清单费其他项目							
2	清单费、规费							
3	劳动定额测定费劳动保险费							
4	安全监督费							
5	税金							
/	合 计							
经办人	项目	负责人(签字	'盖章)					
				日期:	4	-	月	H

表 5-18 措施项目清单增减表

工程名标	Mi:					第	页 其	 页
序号	项目名称	合同价/元	送审增减价/5	市 审定增减价/元	核增核减额/元	核增	亥滅原因	因说明
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
/	승 计							
经办人			Ŋ	i目负责人(签字盖i	崖)			
					日期:	: 4	= 月	日 日

表 5-19 主要材料、设备增减表

		*才米斗						单价/元		6.00		
序	***	名称	等特殊要求	卡兴	合同量	达甲 排削	中庭	合同价	选单 讲演价	甲廷 財解价	原因说	
1												
2						10						
3												
4												
5												
6												
7												
	经办人					项目:	负责人(名	签字盖章)			
									日期:	年	月	В

表 5-20 工程造价审核核对纪要

				第	页	共	页
	L程名称						
ŧ	核对时间		核对地点				
参	建设单位		•				
hu	施工单位						
人	监理单位						
员	审价机构						

续表

 主 要 内容

 签 名

 建设单位:
 施工单位:

 监理单位:
 市价机构:

 记录 人;



工程竣工决算的步骤

- (1)收集、整理、分析原始资料 从建设工程开始就按编制依据的要求,收集、清点、整理有关资料,主要包括建设工程档案资料,如设计文件、施工记录、上级批文、预(决)复文件。
- (2) 对照、核实工程变动情况,重新核实各施工单位、单项工程造价 将竣工资料与 原设计图纸进行查对、核实,必要时可实地测量,确认实际变更情况;根据经审定的施工 单位竣工结算等原始资料、按照有关规定对原概(預)算进行增减调整,重新核定工程造价
 - (3) 编制竣工财务决算说明书。力求内容全面、简明扼要、文字流畅、说明问题
 - (4) 填报竣工决算报表
 - (5) 做好工程造价对比分析
 - (6) 清理、装订好竣工图。
 - (7) 桉国家规定上报, 审批、存档。

特别提示

审计部在收到工程决算10天内应按照上级有关文件的规定,结合公司的规章及结算方式进行审查,发现问题及时与工程部门联系,做到基建开支合理、准确 审查后的工程决算应及时返回工程部,办理与施工单位结算事宜。

固定资产的转移工作由公司财务部负责在一个月内尽早办理。


施工单位应准备的决算资料——料、工、费相关的原始合同、预算、结算文件及相关 审批、原始单据等 即图纸、合同、报告、清单、资质说明、费用单据等等,都应预先准 备出来。

工程影音资料

工程影音资料包括:建设工程未开工前的原貌、竣工新貌照片,建设工程开工、施工、 竣工的音像资料。

建设工程未开工前的原貌、竣工新貌照片, 其中建设工程未开工前的原貌、竣工新貌 照片由建设单位收集、提供。

建设工程开工、施工、竣工的音像资料由建设单位、施工单位、监理单位及相关利益 方收集,最后统一由建设单位报送备案。

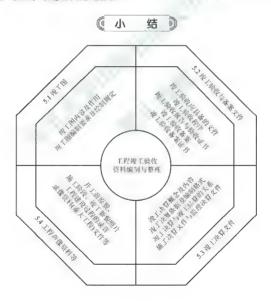

能力拓展

- 1. 依据章前学习要求,画出竣工图、工程竣工验收资料的组成结构图。
- 依据资料员的岗位职责要求,进行竣工图、工程竣工验收资料的收集、整理并接规范移交。
- 3. 依据竣工图、工程竣工验收资料形成的流程图,复制并添画出工程前期和竣工期间,建设单位应归档的文件名称。
 - 4. 对应章前学习要求, 填写学习效果自我检测记录表。

学习效果自我检测记录表

屋次 领域		* *			
理论认知	了解		返用	综合	
岗位技能	模仿		应用	创造	
职业情感	激情		心境	热情	

5. 学习过程中,不仅要注重沟通表达能力训练,强化团队合作意识,更要加强个人工程实践经验的积累 伴随着理论知识学习,自觉记录课后实践将促进职业能力提升

课后实践记录表

实践分项	时 间 段	实 践 要 点	见证人及联络方式
工地考察		1.桁名称、 1.程所在地	
沟通能力训练		沟通对象、沟通内容、沟通效果	
内业资料管理	15-	收集、分类、整理、立卷、归档	
小组合作学习		分工负责情况及合作成效	
实践中遇到的问题		视具体填写, 着眼于发现问题、分析 问题及解决问题	
其他			

第6章 工程资料管理现代化



学习要求

资料员应知	资料员应会	职业素养
1.	2 合分析工程资料的任息流程	1. 具备及时收集信息处理信息等 信息应用能力 2. 培养工作保密意识 3. 提高团队协作能力,提高有效 交流能力

学习性工作任务

工程背景

日照职业技术学院是国家教育部批准的山东第一所职业技术学院、学院建设了以光境为主于线的千兆校园网、专门铺设光线到日照电信局、使用光道被国网的高速宽带上网方式、实现办公自动化 2003年、学院发展级模扩大、在日照大学破建设 93.67km²的新校区 新校区建设面积 35 万 立方米,投资 5 亿 多元人民币、计划用 4 年时间分:期完成(图 6.1) 一期工程 5 万 立方米,教学楼已于 2004年 8 月 完成并交付使用、分析总结一期工程的情况、意识到只有切实版好信息管理工作、才能保证项目的有关人员及对获得各的解码信息、在如基础上才能够进一步做好成本管理、进度管理、质量和安全管理、合同管理等各项管理工作、最终达到优质、低价快速地定成工程项目管理目标。

建设工程项目的管理与控制贯穿于工程建设的全过程,要完成此项工作,业主和管理部门必须对建设 中产生的大量工程数据进行处理、统计、分析和评价,以便使业主和管理部门及时了解工程的完成情况, 掌握工程的境度,辅助业主进行决策,利用计算机对工程数据进行处理,统计及查询 建立信息管理系统, 已成为我国建筑工程管理现代化建设的重要组成部分。

工作准备

- 1、以小组为单位、准备相关工程图4
- 2. 工程资料管理软件
- 3. 工程档案。

工作任务

结合工程背景提供的信息。模拟建设工程资料员。完成以下任务。

- (1) 依据现代的工程资料管理行业标准。 画出业主方资料管理的信息流程图。
- (2) 以小组为单位。分工合作完成信息管理的组织结构图。
- (3) 选择一个单位工程,建立职业健康安全管理资料的信息流程图。
- (4) 收集智能建筑工程资料台账,分析与普通建筑工程资料的区别。
- (5) 列出工程质量后评价的资料清单。

教学建议

教·布在进行本章教学时,可参考引例妄排学习任务,也可根据本地工程实际,灵活希置训练任务 建 议每一节学习都采用任务驱动方式,学习从分组协作为宜 分组合作学习不仅能分工协作完成分项工程或 分部工程的资料整理,更有助于学生进行沟通表达能力,合作解决问题等核心职业能力引练

组织教学实施过程中:主要引导学生充分利用互联网、广泛收集有关工程资料管理的软件、智能建 级及现代化管理资料,使学生在收集信息、处理信息、使用及保管理信息过程中学会工程资料的现代 化管理。





图 6.1 新校区建设项目分期示意图

6.1 信息化与工程资料管理

○ 引例

从 1851 年开始, 在历届世博会上, 信息、通信技术一直是非常热门的展示项目, 上海世博会也不免 外 上海世博会事务协调局信息化部公布, 上海世博会实际建设信息化项目达 43 个, 投资约 10 亿元

在世博信息化建设中围绕安全可靠、展示创新亳点、整合先进的信息化理念,综合利用主流信息技术, 持续注重推进 [T技术创新

世博信息化主要体现在如下方面。

- (1) 集约化建设方式和智能网技术 园区通信基础设施以集约化方式建设,实现高度共享,电信的城市完纤网、EPON、IPv6 和东方有线的光纤加 HFC 接入和运营商普遍采用的智能网技术等,为"三网合一"和解决信象高速分路"最后一千米"等难题进行实践性慎索
- (2) 无线宽带技术 重点普及以固产标准TD-SCDMA 为主的 3G 技术应用、同时录用 WIFI(无线探真) 加 MASH 技术、提供宽带接入服务、将保证无线信号的更宽增盈和高进传输 同时在同区内建设 TD-LTE 实验网络、为组织者、媒体记者、各方嘉高牌客提供丰富的移动信息服务。可在开阳后现场体验 TD-SCDMA 的演进技术。
- (3) RFID 和传感网技术 護技术已广泛应用于世博会的门票、物流配送、展馆预约、证件管理、电子 车榫等请多方面 中国移动将在全球首次推出内置 RFID 模块的手机电子门票、并和交通银行在园区内提 保手机电子安付、将提供手机票和手机安付功能、充分展现信息技术给日常生活带来的便捷
- (4) 互联网运用技术 网上世籍会籍借助与联网的 FLASH/Web3D 和CDN 分发、SOA 架构技术等、 把世鄉的理念、精神以及世傳会的內容後到全球; 覆盖全国范围的 CDN(內容分发)网络。可以完全海是国 内外用台对于同十世極的访问
- (5)多媒体技术 虚假技术综合演播厅远用虚拟伤弃技术将园区建设规划、展馆建设、大型活动的 方案从抽象化、符号化转变为形象化、可视化、与科学决策、活动组织、远营指挥提供了直观生动的演示平台。
- (6)智能视频处理技术 高清視频图像处理、人像识例、图像信号智能调用等多项信息技术将大量用于本层世博会的客流引导系统、车载系留气球监测系统、视频监控系统等,通过智能视频分析和智能视频 益程, 使查控系统成为主动、智能化的识别工具、自动提取关键信息、为组织者提供管示、有效提升相关 系统的服务能级和响应效率
- (7) 电子地图和定位导航技术 在传统导航功能的基础上、更加注重智能化、个性化和多功能化、利用高精度电子地图和共用的GIS 平台、为园区的车辆和工作人员提供多种定位导航服务
- (8) 轉大型活动的信息化管理 为逐而大型活动的组织管理需求、充分借鉴舆运经验。针对世博会畴点、综合运用 GIS 技术、基于恒置的信息发布技术、与参方案数字化技术等、形成数字化的综合运行管理、为大型活动的管理、服务提供信息化支撑 尤其值得一提的是特大型活动的信息化管理完全由国内自主研发,建设和保障。

另外,因因能源与环境监测信息系统所使用的操作系统、数据库、GIS、中间件等全部为自主知识产权的国产软件产品。是国家科技部核高基项目。



思考

- 1、工程资料管理采用信息化手段。工作有什么变化趋势?
- 2. 信息化管理工程资料过程中,有哪些工作必须采用手工方式?

6.1.1 信息化与数字城市

1. 信息化的含义

信息化,在我国港台地区习惯称为资讯化。它是一个外来的概念,最先起源于20世纪 60 年代的日本。西方普遍使用"信息社会"和"信息化"概念开始于20 世纪70 年代后期。

目前,我国比较一致的看法是:信息化是指社会经济的发展从以物质与能量为经济结 构的重心, 向以信息与知识为经济结构的重心转变的过程。在这个过程中, 不断地采用现 代技术来装备国民经济各部门和社会各领域,从而极大地提高社会劳动生产力。

2. 数字城市

在信息的浪潮席卷全球的今天,信息化水平已成为衡量一个国家和地区经济社会发展 综合实力和文明程度的重要标志。城市作为一个地区的政治、经济、文化和信息的中心, 是人类文明的辐射源和聚集地。故眼未来、凡能积极迎合全球信息化泡潮的城市将令得到 *读的发展,如果错失信息化带来的发展机调,就有被排挤到潮流边缘的危险。城市县现 代产业高度集聚的地区。城市作为经济发展的一个高级阶段的代表,在国民经济和社会生 活中占有重要的地位。

数字城市,又称网络城市、智能城市、信息城市。它综合运用 GIS、遥感、遥测、网 络通信、数据库、多媒体及虚拟现实等先进信息技术对城市的基础设施、功能机制进行全 方位的数字采集和处理,具有对城市地理、资源、生态环境、人口、经济、社会等复杂系 统支撑的强大功能,能用干重大决策的效果预演和对未来发展的规划预测。数字城市,以 "人"为主导地位,通过城市信息化更好地把握城市系统的运动状态和规律,对城市的人、 空间与环境之间的复杂关系进行调控、实现系统优化、使城市更加有利于人类的生存与可 持续发展。

数字城市建设是一个系统工程, 涉及城市生活的方方面面, 需要政府各个职能部门通 力合作,同时也为各个政府职能部门提供现代化的信息工具,对全面提高信息化水平、工 作效率和决策水平有巨大的推动作用。当前,我国已有包括北京、上海、广州等几十个大、 中城市提出了各自的数字城市建设方案,并投资启动了相关的项目。数字城市的建设、给 城市的政治、经济、文化和人民生活带来新的发展机遇,为城市未来的发展插上了腾飞的 翅膀。

广义的"数字城市"概念,是指诵讨建设宽带多媒体信息网络、地理信息系统等基础 设施平台、整合城市信息资源、实现城市经济和管理信息化。城市信息化的目标、是以城 市为主体,在政治、经济、文化、科技、教育和社会生活各个领域广泛应用现代信息技术, 提高城市管理水平和运行效率、提高城市的生产力水平和竞争力、完善城市服务功能、促 讲经济和社会协调发展, 加快城市现代化讲程。建设数字城市就是积极利用现代高科技手

段, 充分采集、整合和挖掘城市各种数据信息资源,建立面向政府、企业、社区与公众的 信息服务平台、信息应用系统和政策法规保障体系,为城市的可持续发展以及城市规划、 建设、管理和服务水平的提高提供支撑和保障。

6.1.2 信息化与电子政务

1. 国家信息化与信息化小区

我国的国家信息化就是在国家统一规划和组织下,在农业、工业、科学技术、国防及 社会生活的各个方面应用现代信息技术,深入开发,广泛利用信息资源,加速实现国家现 代化的进程。

我国信息化体系由6个要素组成,即信息资源、信息网络、信息技术应用、信息技术 和产业、信息化人才队伍、信息化政策法规和标准规范。这个体系是根据中国国情确定的, 与国外提出的国家信息基础设施有所不同,具体可解释如下。

- (1) 信息资源是经济和社会发展的战略资源,它的开发和利用是国家信息化的核心任务,是国家信息化建设取得实效的关键。
 - (2) 信息网络是信息资源开发利用和信息技术应用的基础。
 - (3) 信息技术应用是国家信息化建设的主阵地,集中体现了国家信息化建设的效益。
 - (4) 信息技术和产业是国家信息化立足于自主发展的支柱。
 - (5) 信息化人才队伍建设是国家信息化的成功之本,对其他各要素有着决定性的影响。
 - (6) 信息化政策法规和标准规范是国家信息化快速、有序、健康发展的保障。

信息化小区是指通过对小区的信息基础设施的统 规划建设,使小区用户能以多种媒体(如电话、传真、电视、计算机等)和多种方式(如图文、声音、视频图像等)获取小区内外的信息,进行信息交换和资源共享,具有较高信息交互水平的住宅小区。这些信息基础设施包括小区综合布键系统、小区通信网络、小区计算机局域网、小区 CATV 网等。

宽带社区是指在生活小区内使用宽带网络。通过宽带综合接入与 CHINANET(中国公用计算机互联网)连接或与公司的 VPN(Virtual Private Network)虚拟专用网络连接,住户就可以通过宽带网络与办公室连接,实现在家办公。同时,还可以实现网上医疗、视频点播(VOD)、交友聊天、网上购物、网上炒股等。互动宽带社区还可以提供小区智能化住宅的所有服务,实现可视对讲、消防报警、煤气泄漏监控、三表(水表、电表、煤气表)抄送等服务。

2. 中国信息化水平现状

从国家信息化测评中心的统计结果看,我国在信息网络建设、信息技术应用和信息资源开发方面,取得了长足的进展。以信息化带动工业化,实现跨越式发展的战略正显示出越来越强大的生命力。

(1) 信息化快速发展,信息产业贡献巨大,信息化己改变国家工业化面貌。通过发展 信息和通信技术产业,改变国家的工业化面貌,"以信息化带动工业化"战略正在得到实践 检验。

中国改革开放以来,在国家的高度重视和支持下,信息通信业实现了跨越式发展,取得了举世瞩目的成就,中国的电话网迅速由百万级、千万级扩展到亿级。信息技术革命带



来的产业革命已经改变了中国工业化的面貌,近10年来。这一产业年增速已突破32%,高 于同期全部工业年均增速近18个百分点,是40个工业行业中发展最快的,成为中国工业 第一支柱产业。

(2) 我国在推进信息化方面的工作中取得的新进展。随着"金卡""金税""金关"等 金字号的信息化重点工程的建设,政府和企业等有关部门通力合作,共同开发,积极推广 银行卡、社保卡及配套产品,为国家经济运行、经济安全提供了先进的作业手段和技术保 障。企业信息化建设不断深入,涌现出联想、海尔、斯达等一批典型企业,起到了很好的 示范带头作用。信息技术推广应用工作深入开展,利用信息技术和网络技术改造传统产业 取得了积极成果。信息资源开发水平讲一步提高,电子商务、远程教育、远程医疗、电子 娱乐及电子政务等新的应用得到广泛开展。

3. 中国电子政务

从 20 世纪 90 年代开始, 伴随着信息技术, 特别是网络技术的飞速发展, 信息化成为 各国普遍关注的一个焦点。在国家信息化体系建设中,政府信息化又成为整个信息化中的 关键,中央确定的方针是"政府先行。带动信息化"。

电子政务是指国家机关在政务活动中全面应用现代信息技术、网络技术以及办公自动 化技术等进行办公、管理和为社会提供公共服务的一种全新的管理方式。在中国、电子政 条包括各级行政机关系统的政务工作信息化, 也包括执政党以及国家权力机关、司法机关、 政协等机构的政务工作信息化。政府信息化是人们在日常工作中经常使用的一个概念。它 是相对于国民经济信息化、社会信息化、企业信息化等来使用的。

中国电子政务试点示范工程主要是在国务院关于政务信息化带动企业信息化和社会信 息化的工作方针指导下,针对全球范围内的电子政务建设浪潮以及我国加入 WTO 的大背 景而提出的,于2001年底启动。

中国电子政务试点示范工程的总体目标是:依托国家互联网络基础设施,建立典型部 门和地区间的安全与业务支撑环境、开展关键电子政务应用、初步形成上下关联、信息共 享、规范标准的全局性示范应用系统。

要积极推动企业信息化、促进数控系统、工业过程控制、CAD/CAM/CAPP(计算机辅 助设计/制造/工艺流程)、MIS(管理信息系统)、MRP(制造资源计划)、ERP(企业资源计划)、 CIMS(计算机集成制造系统)、EC(电子商务)等在企业中的广泛应用。将信息技术与管理技 术和制造技术相结合,在企业产品开发、生产、销售和服务的全过程中,通过信息集成、 过程优化、资源配置,实现物流、信息流、资金流的集成和优化,提高企业市场应变能力 和竞争能力。

随着经济全球化步伐的加快,知识经济时代的到来,西方国家的信息技术和网络技术 在社会组织、企业组织以及公民个人家庭中得到了广泛应用,从而推动了电子政务的发展。 并取得了重要讲展。在中国, 加快政府信息化和电子政务步伐的意义还在于如下方面。

(1) 加快政府信息化的步伐, 有利于应对"入世"带来的挑战。首先, 加入世贸组织, 对政府公共政策的制定产生了深刻的影响。"入世"后,一方面我国政府制定的经济政策要 按照国际惯例使本国国内经济政策透明化,并与世贸组织成员国经济政策协调一致;另一 方面。即使我国以发展中国家的身份加入世贸组织、其国内经济政策也必须遵守世贸组织



成员国共同认可的基本原则和约定。这就意味着,我国传统的制定公共政策的一些方式方法很难继续下去,而必须作相应的调整和改革。

其次,加入世贸组织后,对政府的公共服务也提出了前所未有的挑战。"入世"后,企业与企业、人才与人才的竞争的背后,实际上还有一个政府管理之间的竞争问题。而政府管理的竞争主要表现在政府提供的公共服务方面。这就是说,政府服务不但要体现办事高效、廉洁以及具备较高的透明度,而且在保护本国国民的利益等方面还必须有新的举措。

最后,加入世贸组织对政府管理方式产生深刻的影响。像以往那种政府过多地对市场 进行干预,过多地运用行政权力,以及目前我国各级政府过多的行政审批、暗箱操作、透 明度低等传统的管理方式,都必须随之改变,并运用现代信息手段,管理社会和经济。

(2)推进政府信息化,建设电子化政府,可以改善政府的公共服务,提高服务质量从 政府管理的角度来看,电子网络政府的建立,使政府可以通过网络,向社会及时、准确地 传递信息。这就从根本上改变了以往政府公共服务技术手段落后的问题,大大提高政府提 候服务的效率,克服官僚主义等弊端。还可以保证公共服务的公正性和公平性,真正做到一根同仁。

从接受服务的对象来看,电子网络政府的建立,为他们获取政府提供的各种服务提供了更加便利的条件。政府可以通过网络,提供"当站到底式"和"7×24"小时的服务,这就使过去必须要到多个部门去办理的事情,在政府提供的网络窗口,很轻松地得到办理,而且还不受时间和空间的限制,使企事业单位、公民个人有可能在足不出户的情况下,就可以获得满意的服务。

(3) 推进政府信息化, 建设电子化政府, 可以实现资源共享, 大大降低行政成本。电 于网络政府的建立以及政府管理中通过信息技术、办公自动化以及网络技术的普遍应用, 可以把一定区域, 乃至全国的行政机关连接在一起, 使信息、知识、人力以及创新的方法、 管理制度、管理方式、管理型念等各种资源, 真正实现共享, 提高包括信息资源在内的各种资源利用的效率。有效地利用政府内部和外部资源, 提高资源的利用效率, 对改进政府 治理, 降低行政管理成本具有十分重要的意义。

知识链接

1. 信息化浪潮的兴起与发展

1993年9月,美国克林顿政府做出了一项重大决策,决定放弃原来共和党政府实施的 "星珠大战计划和新一代高能加速器计划,实施一项新的面对 21 世纪全球经济发展的战略 发展计划,即振兴"国家信息基础设施"(National Information Infrastructure, NII)行动纲领 计划。该计划内容是:不迟于2015年,投资 4000 亿美元,建立起一个联结全美几乎所有 家庭和社会机构的光纤通信网络,以传送声音、数据、图像或文字等信息,服务范围包括 教育、卫生、娱乐、商业、食融和科研等,并将采取风向交流形式,使信息消费者同时成 为信息的积极提供者 继 NII 行动计划后,1994年9月美国政府又提出了建设"全球信息 基础设施"(Global Information Infrastructure, GII)的倡议,意在将各国的 NII 联结起来,组 成世界信息高速公路,实现全球信息共享。

1995年2月,西方七国集团在比利时首都布鲁塞尔召开了有关 GII 专题的部长级会议,

会上确定了促进积极竞争, 鼓励私营部门投资, 确定行动准则框架, 保证大众进入信息社 会网络、保障提供与进入网络的普遍性。加强公民机会均等的原则。促进文化、语言等多 样化、承认世界范围内合作的必要性并给予发达国家特别的关注等八条基本原则。

1995年5月,亚太经济合作组织(Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC)在韩国汉 城召开了 17 国通信和信息产业部长会议,发布了"APEC 信息基础设施汉城宣言": 1996 年 4 月,来自五大洲的专家学者和政府要员聚集北京,召开了信息基础设施国际会议,共 同研计举世关注的"信息基础设施"问题。

当前, 信息化浪潮发展最主要的一个方向就是互联网 互联网是信息化的基础和核心。 各个行业都在加紧准备或正在向信息网络化方向发展 面对全球新的信息化浪潮和挑战, 欧洲和日本随美国之后、紧追不舍 发展中国家也在积极努力,研究和制定各自的信息化 战略与对策,并采取有效的措施,加快发展信息产业和信息经济的步伐,一个以信息化律 设为中心的社会经济发展新浪潮正在全球蓬勃兴起

2. 信息化重点建设工程

(1) 余桥工程 国家公用经济信息网工程,即余桥工程 它是国家公用经济信息通信 网的简称,是计算机和通信相结合的公用计算机信息通信网,是国民经济信息的一项重要 基础设施。

会桥工程建设的主要项目有, 全桥地面骨干网项目; 金桥卫星通信网项目; 金桥无线 移动数据用户接入网项目: 金桥光纤城城用户接入网项目: 金桥网络电话/传真项目: 金桥 Internet 信息服务项目: 国有大型企业综合信息网技术改造项目

- (2) 金关工程 建立对外经济贸易信息网工程、即金关工程 它是利用现代电子信息 技术, 加快我国外贸业务信息化、科学化、自动化管理的二项重要工程 该工程的目的就 是要推动海关报关业务的电子化,取代传统的报关方式以节省单据传送的时间和成本 2001 年, 金关工程正式启动
- (3) 金卡工程 银行自动化支付系统及电子货币工程、即金卡工程 金卡工程就是为 实现各种银行卡蹄系统跨地区联网交易,推广卡其专付应用而实施的社会化系统工程
- (4) 金税工程 建设全国增值税专用发票的计算机交叉稽核网络系统,实施以加强增值 税管理为主要目标的金税工程 1994年3月底,金税工程试点正式启动 它由增值税计算机 交叉稽核系统、增值税专用发票防伪税控系统和税控收款机系统组成
- (5) 教育信息化 1999 年 6 月, 教育部对教育信息化工作进行了全面的部署, 提出了 推进全国教育信息化发展的十项重要工作、并宣布开始实施现代远程教育工程

教育部提出从 4 个方面推动教育信息化工作,一是发展现代远程教育;二是推动教育 的改革和发展: 三是培养信息化人才: 四是发展信息产业

为了加快教育信息化建设、教育部将对"十二五"期间的教育信息化进行全面部署。 并研讨推进教育信息化的有关政策等。以调动地方、社会、企业、高校以及政府部门的积 极性, 加快教育信息化的发展速度 特别是要对西部的教育信息化采取倾斜政策, 争取国 家投入,对中小学进入 CERNET(中国教育和科研计算机网)实行免费,尽快缩小东西部的 差距。



6.1.3 工程资料管理软件

1. 应用及意义

建筑工程资料管理工作长久以来一直以工作量大、涉及面广,对应各种规范标准种类繁多,表格形式多样繁杂而著称。为了适应现代建筑工程的发展,提高工作效率,提升管理质量,应运而生了许多建筑工程资料管理软件,这些软件以现行的施工验收规范、标准及其强制性条文为基础,参照国家及地方的有关法律、法规和行政规章制度,遵循建筑工程文件材料的自然形成规律,全面地、系统地提供了工程资料管理的内容及有关表格样式,能够形成完整的、规范的工程档案资料,使资料管理人员更好地完成工程文件整理、归档工作、和极发奖档率等和在项目管理中的作用。

当前整个建筑行业中工程资料的填制与管理是一个比较薄弱的环节。填制手段落后,效率低下; 节写工具不合要求,字迹模糊;资料管理混乱,漏填、丢失现象严重。目前,工程资料的制作与管理,无法满足建筑工程档案整理办法的基本要求,而且制约了施工企业的进一步发展。

针对这一相对滞后的环节,目前市场上出现了大量的资料制作与管理软件,如《品茗施工资料制作与管理软件》《建筑工程资料管理系统》《恒智天成建筑工程资料管理软件》等,这些软件都具有自动计算、智能评定功能,凡是需要计算及判断的项目,系统自动计算并给出判断。各表格表头数据可以自动生成,如"工程名称""施工单位"等通用信息,一个工程只需输入一次,一劳永逸。

这些软件的开发,彻底改变了过去落后的手工资料填制方式,极大地提高了资料员的 工作效率,并且制作的资料样式美观,归档规范,给施工资料的制作与管理带来了一场新 的技术革命。

特别提示

文件管理—信息管理—信息化管理

文件管理是项目信息管理的重要存在方式,信息管理比文件管理包含更多的内容 首先,信息存在方式多种多样,文件只是其中的一部分,还有很多信息无法或不适合用文件的方式表达。例如,项目经理在向员工传达"必须按期完工"的信息时,不一定要用文件表达,可以是几句话、几个动作;项目经理和业主之间的一些未成熟的沟通,未必可以以信件的形式记录或表达。项目信息是对项目管理活动具有参考价值的一切数据、资料的总称。项目信息的形式主要有:个别谈话、集体口头协议、书面资料、其他媒介形式(音像、电话等),信息的内容和形式多过文件 信息管理主要指信息的收集、传递、加工、处理,与文件管理要假、但内容和方式更加多样化。

信息管理渗透到项目管理的方方面面,比文件管理更具有广泛性 信息的收集是否及 时、正确,传递是否及时、保真,将影响到项目的决策和项目内外对项目的评价与反映, 关系到项目的成败 抽象地讲,项目管理过程,就是一个物质流和信息流相互作用的过程, 从这个意义上讲, 信息管理并不是新概念, 而是同项目管理同时并存的, 只是越来越多的研究者意识到信息管理的重要性, 而特別从项目管理中剩离出来的.

随着计算机、网络和多媒体技术的普及,物质流的信息化程度和信息的保真程度越来越高,处理速度越来越快,对信息流的分析处理能力越来越强,同时通过信息流监督和控制物盾油。

2. 建筑工程资料管理软件功能的认识

建筑工程资料的编制与管理是建筑工程施工管理工作中的一项重要组成部分。施工资料是工程建设及竣工验收的必备条件,也是对工程进行检查、维护、管理、使用、改建和扩建的原始依据。为此住建部与各省市建设部门曾多次强调要做好资料管理工作,并明确指出;任何一项工程如果资料不符合标准规定,则判定该项工程不合格,对工程质量具有否决权。

然而,当前整个建筑行业中建筑工程资料的编制与管理恰恰是一个比较薄弱的环节。 编制手段落后,效率低下,书写工具不合要求,字迹模糊,管理混乱,漏填、丢失现象严重。目前,施工资料的编制与管理,无法满足建筑工程档案整理归档的基本要求,而且制约了施工企业的进一步发展。

建筑工程资料管理软件就是根据《建筑工程施工质量验收统·标准》《建设工程文件归档规范》,并结合各省市的工程资料管理标准或规程及其施工质量验收规范的标准用表等,分别编制适合各省市具体情况的软件系统。建筑工程资料管理软件的应用彻底改变了过去落后的手工资料填制方式,极大地提高了资料员的工作效率,并且制作的资料样式美观,归档规范。

目前建设工程资料管理软件有杭州品茗科技有限公司研发的品茗施工资料软件、北京 筑业新技术有限责任公司开发的工程资料管理系统、中国建筑科学研究院建筑工程软件研 究所开发的 PKPM 建筑工程资料管理软件、上海神机妙算软件有限公司开发的神机妙算工 程资料管理系统等。资料管理软件大都具有以下功能。

- (1) 自定义工程概况信息。按照质量表格填写要求, ·次性定义工程概况信息, 所有 表格中有关信息自动填写完成, 大大减少了表格填写工作量。
- (2)自动显示规范条文及填表指南。人性化的资料填写辅助工具,实时查阅表格填写 指南及相应规范条目,根据规范要求实时指导填写符合规范要求的数据。
- (3)专家评语模板。质量验收规范纽专家编制表格填写的规范结论,降低手工表格填写的工作量,保障表格填写符合规范要求。
- (4)自动判定监测点。根据规范要求,监测点自动进行判定是否符合规范要求,并可扩充至50个监测点。
- (5) 权限管理。根据规范要求可实现表格填写权限的全面分配,做到工程项目中各尽 其职。
- (6) 图形及文件插入。自由插入各种图像及 CAD 工程图,支持扫描仪输入,配备数码设备输入支持。
 - (7) 汇总和组卷。自动进行分项、分部(子分部)、单位工程汇总统计,自动生成有关各



方及城建档案馆所需案卷。

- (8)数据传递与表格打印。数据可实时通过磁盘、电子邮件等途径与参建各方进行交换,所见即所得的打印功能、能输出精致等观的标准立件表格。
- (9)技术资料库。收录了强制性条文原文、大量施工规范及施工工艺、通病防治等资料,设置施工技术交底模板;适用于全国的多种地方版本,可根据需要在全国各地进行资料底切缔。

3. 品茗施工资料软件

品茗施工资料软件是杭州品茗科技有限公司研发的一套建筑行业施工现场资料管理软件,其采用了最新的建筑工程施工质量验收检查用表和建设工程(施工阶段)监理工作基本 表格等建设工程质量监督站规定的规范的建筑施工原量标准样式,是一套新版《建筑工程 施工质量验收规范》的配套软件,并且涵盖了施工现场所需的所有资料,包括检验批资料、 质量保证资料、工程管理资料、安全资料、监理资料等。

品茗施工资料软件能快速实现表格填写、打印输出、多类型汇总统计、资料表格库管理(修改、添加模板文件)、工程备份及恢复等操作,同时又兼容 Word、Excel,满足不同的施工资料编制与管理的需要。软件的主要功能介绍如下。

(1) 软件进入。

安装好品茗软件后,运行软件,显示软件登录界面,默认用户名 Admin、密码 admin。如图 6.2 所示。使用者也可以管理员身份登录,通过"工程"下的"用户管理"创建或更改用户名及密码来保护工作成果(图 6.3),随后在填写相关信息形成针对唯一工程的资料。软件管理上界面如图 6.4 所示。



图 6.3 用户管理



(2) 软件操作四步骤。"

软件可通过"新建工程 工程概况录入 资料填写一打印输出"操作即可快速建立一 张资料表格。

步骤一;新建工程。首次打开软件,单击工具栏中《新建工程》按钮,弹出窗口如图 6.5 所示,单击【下一步】进入【工程概况】界面。



图 6.5 新建工程界面



步骤 :: 工程概况的输入。如图 6.6 所示,在右边信息库中输入相应的工程概况信息, 将左侧所列项目信息全部完成后,单击【完成】按钮,完成工程新建,进入工程的主界面。 此时主界面内自动生成新建项目结构树;品 若软件在模板区提供了一套填写规范、表格齐 全的示例工程,方便用户在实际工作中参考,如图 6.7 所示。



图 6.6 工程概况界面




图 6.7 新建工程后的主界面



步骤 :: 资料填写。

① 表格创建, 在主界面内, 选择【新建表格】选项, 如图 6.8 所示。在新建表格窗体 中, 选择要创建的分部、子分部, 这时该子分部下的检验批及相关技术配套用表和监理用 表都已经列出, 在右边验收部位框输入相关的验收部位 名称, 洗中要创建的检验批表格, 如需同时创建施工技术配套用表,单击施工技术配套用表插页,输入表格名称。选中技术 用表后,输入后可以切换到其他分部、子分部、分项节点及其他的通用表格结点上,重复 新建步骤,完成后单击【确定】,表格即创建完毕。上述步骤操作好以后,一个新的工程创 建完毕,效果如图 6.9 所示。



图 6.9 创建好的工程界面



特别提示

用户可以通过右键的全选或者反选来快速选表,如图 6.10 所示。



图 6.10 快速洗表示例

② 麦格编辑。

工程建好后可以单击右键菜单的【展开】按钮,如图 6.11 所示,展开当前工程下所有



图 6.11 展开表格示例界面

的表格,选择要编辑的表格,双击,表格出现 在右边编辑区域内,如图 6.12 所示,可以在右 边的编辑区域进行表格编辑、修改。

对表格的文字输入、学习数据生成、示例 数据导入、检验批评定,都通过表格编辑栏的 按钮操作。

也可以多张表格同时打开进行多表编辑, 选中要编辑的表格,一张张双击添加到右边的 编辑框即可。表格编辑完毕后,双击表格名称 保存退出。也可以单击表格编辑的保存按钮保 存。多表一起保存的话,可以右键选择【保存 所有页】,也可以选择工程工具栏中的【保存】 选项来快速地进行多表保存,如图 6.12 所示。




图 6.12、表格编辑界面

步骤四:打印输出。当表格编辑完以后,要打印输出。打印方式有两种:普通打印和 快速打印.

- ① 快速打印: 如果我们要打印单表,可以直接单击快速打印,如图 6.13 所示。不需 要设置、即可直接打印输出、是否打印成功可以查看软件的状态栏显示信息。
- ② 批量打印: 如果要多表打印,可以选择要打印的节点,例如子分部: 混凝土工程, 再单击操作工具栏上的【快速打印】按钮右侧的下拉箭头,在弹出的【打印管理】对话框 中单击【批量打印】,进行批量打印,如图 6.14 所示。



图 6.13 快速打印

- (3) 统计汇总功能。
- ① 表头信息自动导入, 无需手动填写。按照质量资料表格填写要求, 一次性定义工程 概况信息,所有表格中相关表头信息自动填写完成,减少了表格填写的工作量,如图 6.15 所示。



图 6.14 批量打印

草位(子草位)工程:	5称	杭州品苕科技大厦14楼				
分部(子分部)工程:	a称 主体结构分部-混凝土结构子分部	验收部位		言梁板梯		
施工单位	浙江品茗建设集团	项目经理	1			
分包单位			分包项目经理			

图 6.15 表头信息自动导入示例

- ② 每增加一张检验批表,会自动生成相应的监理报审类用表,无需选中,如图 6.16 所示。
- ③ 对于实测项目,单击表格上的【数据生成】按钮,此时对应单元格中就会出现相应 的学习数据内容,并自动生成一般项目超偏数据,打上超偏符号△,如图 6.17 所示。





图 6.16 监理报审举用表




图 6.17 数据生成界面

④ 填好的实测数据需要进行评定,单击表格编辑条上的【评定】按钮,选择施工单位 评定,系统给出评定结果,如图 6.18 所示;以混凝土评定为例,在用户将试块设计强度及 试块强度值等相关信息输入完成后,单击【混凝七评定】按钮就可以判定该组强度值是否 合格,如图 6.19 所示。



← → 19 x/4. 施工评定 BCDEF **岩理研究** L M W O P Q R S T U V V X Y Z AB AC AD AE 26 3 3 55 4 盘卷钢筋调窗后应进行力学性能和新量值 第5.3.4条 受力问筋 音长 度方向的 争尺寸(mm) 15 ±10aa 章起何助的弯折位置 (表) ± 20aa 18 籍筋外酶尺寸 (ma) ± 5 mm 专业工长(第工员) 19 施工班组长 20 21 平控师目全部会辖,一般师目满足根范规定要求 施工单位 检查评定结果 场目专业新疆检查员:

图 6.18 评定功能




图 6.19 混凝土评定

- ⑤ 分部(子分部)、分项 L程汇总表: 为规范 L程质量检验 L作,加强施 L L序的质量 控制,确保分部、分项 L程的质量检验 L作能够真实反映施工质量,所以要对分部、分项 L程进行评定。具体操作为: 先将要汇总的检验批表格都填写完毕: 再右击【主体验收与 统计汇总类】选项,在弹出的快捷菜单中选择【分部汇总】选项,完成分项、分部汇总表, 如图 6.20 所示。
 - (4) 导入外部文件。

可以将原有的 Word、Excel 表格等外部文件导入软件。首先选中要导入表格所在文件 的节点,再右击,选择导入文件,导入文件可以在软件中进行整理、新律、编辑等操作。

- (5) 自建表格在软件上就可以新建 Word、Excel 表格。
- (6) 工程备份、表格异地操作。很多用户在实际操作过程中会遇到工程异地操作的情况,软件通过导入导出和生成只做过的表格这两个功能来解决这一问题。
- (7)填表说明。涵盖所有的施工技术资料表格及填表说明;涵盖建设工程施工现场所需用表的全部表格及相应的使用说明。填表说明针对每张表格。右击可随时查看。
- (8) 快速添加相似表格。相似表格可以快速生成,可以一次一张,也可以一次多张。 如图 6.21 所示, 右击, 选择【快增加】选项。
- (9)资料数据共享。可以将整个工程或者单张、部分表格导入导出,在不同的电脑上 实现资料数据的共享。
 - (10) 电子签名。可以直接将使用者的签名
 - 以电子格式插入到表格签字栏内。
 - (11) 资料库。资料库包括施工资料编制与管理过程中所需的标准规范、图库、方案素材。




图 6.20 分部汇总

图 6.21 快增加

推荐阅读资料



- 1.《智能建筑设计标准》(GB/T 50314-2015)
- 2.《智能建筑与城市》、金磊、中国建设报(1995年9月19日)
- 3.《有头脑的房子——21世纪的建筑》,邱连璋、编著 科学技术文献出版社
- 4.《日光与建筑译文集》、肖辉乾、林若慈、等译 中国建筑工业出版社
- 5.《建筑环境心理学》,常怀生,编译。中国建筑工业出版社
- 6.《建競和建筑设备的节能》。(日)中原信生、著 龙惟定、周祖颖、颢平、吴钟大、译 巢庆临、校 中国建筑工业出版社

任务训练

- 1. 调奋当地建筑单位采用信息化管理工程资料的软件
- 2. 在网络上收集目前的工程资料管理软件名目
- 3. 尝试在学习机上安装一款工程资料管理软件

6.2 建筑工程管理现代理念与实践



3 引度

表 6-1 是香港菜中资企业一个项目的"明智减废计划"

表 6-1 * ××××项目明智减废计划及实施效果(2001/12-2002/12)

序号	目 的	目标	措 施	效果	结论
I	尽量将泥土运 往公众卸泥地	≥70%	在分包合同中明确要求;建立泥头车回票制度	78%	达到 目标
2	控制钢筋损耗	≤5%	修改图纸中的钢筋搭接位置;采用螺纹对接; 采购规格与图纸相符	3%	达到 目标
3	控制混凝土损耗	≤3.2%	准确计算混凝土用量; 准确计算尾数; 多余 混凝土用丁零星或临时工程	2.6%	达到 目标
4	控制洁具损耗	≪4%	注意搬运、存储、安装时要小心;逐件验收; 避免返工	未进行	达到 目标
5	控制	≤5%	严格验收; 小心搬运、存储; 避免返工	4%	达到 目标
6	控制纸张用量	A4 纸 400 包	尽量采用电子文档;尽量采用传阅方式;双 面用纸	520 包	未达 目标
未达目标项目的原因		项目 6 i 补充说明	未达目标, 主要原因是设计图纸质量有问题, 需有	要增加许多。	小图予以



息 思考

者察附近工程建设现场、收集工协管理资料、分析以下问题。

- 1. 工物文明施工体现在哪几方面?
- 2. 管理措施中涉及职工健康安全的有哪几条?
- 3、工地现场安全设施有哪些?
- 4. 旅工过程中环保管理投入有多少?
- 5. 施工现场是否采用全面一体化管理体系?

6.2.1 全面一体化管理

1. 全面一体化管理概述

全面一体化管理是指组织(企业)在其所有领域内以质量、环境、职业健康安全为核心, 以全面质量管理理论为基础,依据国际管理标准框架,融合其他管理要求,通过建立一体 化管理体系,优化整合协调一致管理,其目的是使顾客满意及员工、相关方受益而达到长 期成功的管理途径。

全面一体化管理是当今企业管理的发展潮流,实施全面一体化管理,可以为建设工程 项目实施提供良好的管理环境。 厂程监理企业不仅应审查工程承包单位的一体化管理体系, 而且应建立自己的一体化管理体系、追求直越结效管理。

2. 狭义的一体化管理体系

狭义的一体化管理体系又称为"三标一体化管理体系"。它是组织依据三大标准建立的 质量、环境、职业健康安全的一体化管理体系,其目的是满足顾客、社会、员工及组织的 相关方要求,用于第二方评价认定(如业主)或第三方审核认证注册,这基对组织管理体系 的最基本要求。/ 1

3. 广义的一体化管理体系

广义的一体化管理体系亦称全面一体化管理体系。它是在狭义一体化管理体系基础上 的发展。其目的在于组织绩效改讲。追求卓越、满足顾客、社会、员工及组织相关方的期 望。广义一体化管理体系是对组织一体化管理的较高要求。

4. 编制一体化管理体系文件的前提条件

组织编制·体化管理体系文件至少应具备以下条件。

- (1) 初步确定了组织的方针目标。
- (2) 基本确定了管理体系的主要过程及其需要开展的主要活动。
- (3) 明确了组织结构设置或调整的方案。
- (4) 己完成组织职能的再分配。

5. 一体化管理体系文件的编制程序

一体化管理体系文件的编制应在体系分析的基础上进行。管理体系的分析可以看做是 管理体系的方案设计,而管理体系文件的编制则相当于管理体系的详细设计。

(1) 建立管理体系时的文件编制顺序。组织(企业)新建立一体化管理体系时,管理体系 文件一般按管理手册(含管理方针)、程序文件、工作指导书和记录的顺序进行编制。也可



在分析管理体系的基础上,列出体系文件总表,然后根据实际需要,先编制急用的程序文件和工作指导书,最后再完善管理手册及其他文件。实际上,管理体系文件的编制顺序不是一成不变的,必要时可同步交替编制管理体系文件。

(2) 整合管理体系时的文件编制顺序。多数组织(企业)是在原有管理体系文件的基础 上,编制一体化管理体系文件。因此,在着手编制一体化管理体系文件之前,首先应完成 两项工作:一是在调查规行管理体系文件的基础上,制订一体化管理体系文件的编制计划; 是制定一体化管理体系文件的编写指南或范例,规定管理体系文件的体例及格式。

6.2.2 建筑工程项目管理信息化

1. 建筑工程管理信息化

建设工程项目管理信息化是指在建设工程项目管理涉及的各方 上体及各个阶段广泛应用信息技术、开发信息资源,以促进建设工程项目管理水平不断提高的过程。由于信息技术的渗透性强、发展快,以及工程项目自身的复杂性,建设工程项目信息化的内涵极为丰富,并处于不断地发展变化之中。建设工程项目信息化具有信息收集自动化、信息存储电子化、信息交换网络化、信息检索工具化及信息利用科学化等特征。

建设工程项目信息化不仅意味者利用信息设备替代手工方式的信息处理作业,更重要 的是提高建设工程项目的经济效益和社会效益,以达到工程项目建设增值的目的。

2. 建设工程项目管理信息化发展现状

近年来,信息技术在建设工程项目管理中的应用得到长足发展。部分大型企业建立了信息网络,并将其作为建设工程项目信息交流和管理不可缺少的工具。有的企业开发应用了建设工程项目管理信息系统,有少数工程项目管理中应用了监测和自动控制技术,更多的企业则在建设工程项目管理工作中使用了各类专业软件,如建设工程投标报价软件、进度计划管理软件、合同管理软件、材料管理软件等。

具体而言,信息技术在建设工程项目管理中的应用体现在以下几个方面。

- (1) 基于互联网数据库技术的应用。应用诸如 Oracle、DB2 等数据库, 开发建设工程项目管理信息系统; 对工程项目进展过程中产生的海量信息,包括文字、图形文档和声音、视频资料实现有效存储和快速查询。
- (2) 项目信息门户 PIP(Project Information Portal)的应用。PIP 为 L程项目建设各参与方 提供项目全寿命期管理中所需要的大部分信息,如项目编码、权限管理、费用管理、进度管理、质量管理等。
- (3)自动控制技术的应用。对建设工程项目费用、进度、质量影响因素进行量化,将 系统行为和形态、数学模型和物理模型及其时空表现模式有机地结合起来,建立系统仿真 模型并求解,然后进行纠偏校正,实现工程建设目标的有效控制。
- (4) 先进监测系统的应用。采用摄像监视系统、覆盖整个施 L现场,用以监视施 L现场安全、消防等工作,既降低了施 L现场的管理难度,又提高了项目管理效率。
- (5)虚拟现实(VR)技术的应用。应用虚拟现实技术可以建立工程项目的多维信息感知模型,创造特定的工作方式和环境来解决需要花费大量人力、财力和精力才能解决的工程



项目管理实际问题。虚拟现实技术的应用,使工程项目管理者获得一个先进的认识世界和 改造世界的工具。

3. 建设工程项目管理信息化的意义

建设工程项目管理信息化的意义主要体现在以下几个方面。

- (1) 可以加快项目信息交流的速度。利用信息网络作为项目信息交流的载体,可以大 大加快项目信息交流的速度,减轻项目参建各方管理人员日常管理工作的负担,使人们能 够及时查询 厂程进展情况, 及时发现问题, 及时做出决策, 从而提高 厂作效率。同时, 项 日管理信息化能够为各项目参维各方提供完整、准确的历史信息,方便浏览并支持这些信 息在计算机上的粘贴和复制, 可以减少传统管理模式下大量的重复抄录下作, 极大地提高 项目管理工作的效率。
- (2) 可以实现项目信息共享和协同工作。利用公共的信息管理平台,既有利于项目参 建各方的信息共享和协同工作, 又有利于项目参建方组织内部各部门、各层级之间的信息 沟通和协调。在信息共享环境下通过自动地完成某些常规的信息发布,可以减少项目参与 人之间的信息交流次数,并能保证信息传递的快捷、及时和通畅。这样,不仅有助于提高 项目管理工作效率,而且可以提高项目管理水平。___
- (3) 可以实现项目信息的及时采集。建设工程项目管理信息化能够适应项目管理对信 息量急剧增长的需要,允许实时采集每天的各种项目管理活动信息,并可以实现对各管理 环节进行及时便利的督促与检查,从而促进项目管理工作质量的提高。
- (4) 可以存储和分析项目全部信息。实现建设工程项目管理信息化,可以将项目的全 部信息以系统化、结构化的方式存储起来。甚至可以对已积累的既往项目信息进行高效的 分析,从而为项目管理的科学决策提供定量的分析数据。
- (5) 可以促进项目风险管理水平的提高。由于建设工程项目的规模、技术含量越来越 大,以及现代市场经济竞争激烈等特点,使得工程项目的建设风险越来越大。项目风险管 理需要大量的信息,而且需要迅速获得并处理这些信息。现代信息技术给项目风险管理提 供了很好的方法、手段和工具,建设工程项目管理信息化能够大大提高项目风险管理的能 力和水平。

6.2.3 职业健康安全管理

1. 国际劳工组织与施工安全

国际劳工组织保护工人免受"职业给他们带来的疾病和伤害",是国际劳工组织宪章 赋予该组织最基本任务之一。因为国际劳工组织是把政府、雇主和工人代表组织到一起 的机构,也就是把直接关系到预防下伤事故和职业病的大多数人组织在一起。这样的组 织结构有明显的优越性, 使它的活动方式更加符合实际, 并在某种国际水平上确定现实 的工作重点,促使国际劳工组织的决定能在工作场所得以实现。为了帮助各成员国制定 和执行各自的安全和保健措施,消除和减少职业危害,国际劳工组织开展了多种多样的 活动, 见表 6-2。



序号	国 家 活 动	国际劳工组织的活动
1	立法	公约、建议书和在起草法律方面提供咨询
2	规章制度	规章制度的样本、实践的样板和技术指导
3	技术和医疗检查	手册、指南、技术出版物和资料服务中心
4	安全和保健机构的咨询	研究基金、训练班、讨论会、代表会、技术指导和合作、资 料服务中心
5	为雇主提供情报的活动及专家培训	座谈会、出版物
6	工人教育	座谈会、出版物、直观教具

表 6-2 国际劳工组织如何帮助各国开展职业安全和保健的活动

1988 年 6 月 20 日国际劳工组织全体大会第 75 届会议分别通过了 1988 年施工安全与卫生公约和 1988 年施工安全与卫生建议书,作为对 1937 年制定的建筑安全公约和建议书的修订。到 1993 年已有匈牙利、捷克、伊拉克、墨西哥、挪威、危地马拉等 7 个国家批准了此项公约。后又有泰国、马来西亚、韩国等国家和地区批准实施该公约。

施工安全与卫生公约的目的,是在一切施工活动中采取预防性的保护措施,防止各种事故和职业病,保护工人的安全和健康,公约规定了采取上述预防和保护措施的行动领域。公约适用于一切建筑施工活动,即建筑工程、土木工程、吊装及拆除工作,包括一切建筑工地从场地准备到项目竣工的所有工序及运输。公约规定,批准公约的各成员国应与最有代表性的雇主组织和工人组织商量应采取的措施,以使本公约各项规定付诸实施。公约特别规定了要通过法律、条例、标准或其他适当的方法(包括培训),使公约各条款实施,并使之持续有效。

特别提示

国际劳动公约与建议书

当一个成员国批准了某项公约之后,此项公约要对该成员国具有约束力,就必须保证 实施其条赦及规定。建议书则是对政策、立法和实践提供指导,其所涉及的范围比公约要 大、或者处理那些不要求承担正式义务的问题,不需要成员国的批准。它提出了总的或技 本性的指导方针,并且往往是相应公约的补充,其目的是在某些领域指导成员国制订有关 国家政策。这些国际劳动公约的重要性在于其实际效果。为了确保公约义务的实施,国际 劳工组织建立了监督程序 即批准了某项公约的国家,必须就其在法律和实践中对实施公 约的情况定期提出报告,雇主组织和工人组织也有权提供情况,专家委员会对这些报告进 行审议,审议结果将在每年一次的国际劳工大会的一个三方委员会上进行讨论。对于建议 书和公约未得到批准的成员国,国际劳工组织可要求成员国政府提出报告,说明该国的立 法和国家管理是否与这些标准相一致,如不一致,成员国政府提出报告,说明该国的难

2. 职业健康卫生与安全及环保管理相关条款

现在建筑工程承包商已意识到职工健康安全及现场环保管理的重要性。其中职业健康 卫生与安全及环保管理相关条款见表 6-3。

表 6-3 职业健康卫生与安全及环保管理相关条款

序号	项 目 条 款				
2.3	施上应该保证在现场的雇主人员配合承包商工作, 并遵守有关安全和环保规定				
4.1	承包商应对其现场作业以及施工方法的安全性和可靠性负责				
4.8	向承包商提出安全施工的规定				
4.14	承包商应避免施工过程中对公众等产生不必要的或不当的干扰				
4.18	承包商应采取一切适当措施,保护现场内外环境				
4.22	承包商有责任处理好现场安保				
4.23	承包商应使现场和工程井井有条,处于清洁和安全的状况				
6.4	承包商应遵守所有适用于承包商人员的相关劳动法,并且要求其雇员遵守所有适用的法律				
6.5	除正常工作时间以外,为保护生命和财产,或为工程安全,承包商可以加班工作,但应事先通知 工程师				
6.7	承包商应采取合理的预防措施,维护承包商人员的健康和安全				
6.11	承包商应始终采取措施,保持人员、现场和财产的安全和安定				
7.6	工程师可指示承包商实施因意外等原因引起的,为工程安全急需的任何工作				
10.4	地表需要复原,尤其有绿化方面规定的时候				
11.7	缺陷通知期内,基于安保原因,雇主可对承包商的进入权进行合理限制				
15.2	由雇主终止合同后,承包商撤离现场时,应尽力保护生命及财产安全				
16.3	合同终止生效后,承包商应按工程师的指示保护生命、财产或工程的安全				

知识链接

表 6-4 是国际劳工组织提出的施工安全与卫生公约主要内容。

表 6-4 国际劳工组织提出的施工安全与卫生公约主要内容

頭目	厅与	車 見 内 喜
雇主的责任	1	国家法律应要求雇上有义务遵循工作场所的安全与卫生规定,全面提供安全和卫生的工作场所
	2	雇上应落实国家法律或条例规定的安全和卫生措施,在保证职工安全与卫生方面承担责任与义务
	3	在工人有紧急危险时,雇主应立即采取措施停止作业,并适当疏散工人
Ľ K	1	在执行规定的安全与卫生措施方面与雇主尽可能地密切合作
	2	注意自己的安全与卫生,也要注意可能由于自己 I.作中的行为或疏忽而影响他人的安全与卫生
的	3	使用供他们支配的设施,不滥用为保护他们自身或其他人而提供的任何东西
贵 任	4	向直接管理人员或工人安全代表报告认为可能造成危险而自己又不能适当处理的任何 情况
	5	遵守规定的安全与卫生措施
E人 的权 利和 义务	1	C人有权利和义务在任何工作场所,在他们所控制的设备和工作范围内参与确保安全施工的工作,并对己采用的可能影响安全与卫生的程序发表意见
	2	工人有权在有充分理由认为环境对其安全或卫生构成严重威胁时离开险境, 并有责任立即通知管理人员
	3	在信息和培训方面,工人应充分而适当地;获得他们在工作场所可能会遭遇到的安全与 卫生方面危险的信息;获得就预防和控制这些危害以及人身保护措施的指导和培训
雇主 和工 人之	1	应按照国家法律和条例规定的方式、采取精施保证雇主和工人之间的合作,以促使施工 工地的安全与卫生。为了确保雇上和工人有维线地进行合作,建议书建议应根据国家法 律和条例,或上管当局的规定、采取以下措施;设立代表雇上和工人的安全卫生委员会, 排账下规定的权利和责任
间的	2	选择或指定工人安全代表,并赋予规定的权利和责任
合作	3	由雇主指定具有一定资历和经验的人员来实施及督促安全与卫生工作
	4	培训安全代表和安全卫生委员会成员
国家政策 工作场所安全	1	各成员国应根据国家条件与惯例,并与最有代表性的原上组织和工人组织协商、制定、实施和定期申查有关职业安全、卫生工作规定的国家政策。政策的目的是在合理及切实可行的范围内,把工作环境中危险因素减少到最低限度,以防上来源于工作、与工作有关或在工作过程中发生的事故和对健康的危害
	2	在制定国家政策时应明确规定公共机关、雇上、工人或其他有关人员在有关职业安全、 卫生和工作环境方面的职能和所负担的责任
	1	施工中大多数工伤事故原因是高处坠落或材料设备造成的物体打击。混乱不堪的作业现场往往是造成此类事故的上要原因。因此公约对于工作场所安全提出以下规定; 成 采取一切适当的预购事故的措施,以确保所有工作场所安全,消除妨碍工人安全和卫生的危险
	2	应提供和保持进出所有工作场所的安全通道,在适当地方加以标记
	3	应采取 ·切适当的预防措施。保证建筑工地的人员或其附近的人员免遭工地可能发生的 ·切危险

续表

					续表		
项目	序号	主 姜 内 容					
	3	3-1		施工工地应建立和实施施工现场管理计划,包括以下规定;材料和设备的适当存放;定期清除废物与垃圾			
		3-2		在不能用任何其他办法保护 Γ 人避免从高处坠落的情况下,应安装和保持合适的安全网或安全挡布,并应提供和使用合适的安全带			
		3-3		雇 E 应加强对工人的培训和教育,使工人能正确使用劳保工具。劳保工具及防护 服应符合有关部门指定的标准,尽可能考虑人类工程学原理			
		3-4		施工机械设备应由合格人员逐个检查,保证安全。国家法律和条例应考虑由于设 计时未考虑人类工程学原理而设计的机械、设备和系统所引起职业危害的事实			
	4			臂工人遵守脚手架、提升设备和传送设备、土方运输和材料装卸设备等固定装置及 设备的安全使用规定			
	5	应广	立广泛宣传几种危险作业(高空作业、水下作业、拆除作业等)的安全生产规定				
	6		育工人遵守挖掘工程、整井、土方工程、地下工程和隧道、结构框架及模板、围堰 箱的安全生产规定				
		应教	育工人	\連守f	顶防电气伤害的规定		
		7-1	· t7	·切电气设备与装置应由合格人员施工、安装与维修			
E. 作	7	7-2		施工前和施工期间采取适当步骤查明工地中的地下、地面上空任何通电的电缆或 电器所在位置,并防止其对工人造成危险			
场		7-3	在建	筑工地	辅设和维修电缆或电器,应遵守国家级的技术规则和标准		
所		创建	创建安全的劳动环境				
安全	8	8-1		长管当局应按照国家法律或条例在规定的时期内监测工作环境,并对工人的健康 状况做出评估			
			对于	对于使用有害于工人健康的化学、物理或生物物质,应该做如下处置			
				让使用者了解有毒物质对健康的危害及正确使用方法,因此建议书做如 建议			
				(a)	主管当局应建立情报系统,根据全世界的科研成果,向建筑师、承包商、雇 上和 T人代表提供关于在建筑业中因使用有害物质而伤害健康的情报		
		8	8-2		(b)	建筑业所用产品的生产厂家和商人,在提供产品的同时,应提供与其 产品有关的危害健康的情报,以及应采取的预防措施	
		(1)	(1)	(c)	在使用含有害物质的材料与清除和处理废物时应按照国家法律或条 例严格保障 L人和公众的健康,保护环境		
					(d)	凡采用新的产品、设备或工作方法时, 应特别提醒工人注意安全与卫生, 并注意必要的培训	
					(e)	有害物质应有明确的标志,应贴上标签说明有关的特点和使用方法, 应按国家法律或条例以及有关当局的规定对有害物质进行处理	
				(f)	主管当局应当确定哪些有害物质禁止在建筑业使用		

结套

					续表			
项目	序号				主 要 内 容			
				接触	有害于工人健康的化学、物理或生物物质时,公约规定了以下预防措施			
				以避免接触				
				(a)	尽可能以无害或危害较小的物质取代有害物质			
		8-2	(2)	(b)	采取适用于装置、机械、设备或加工过程的技术措施,以密闭使用化 学物质			
	8			(c)	在不可能遵守上述(a)或(b)时,采用其他有效措施,包括使用个人防护用具及防护服			
	8	8-2	(1)	员问点	关危险气体所采取的措施应当包括事先有书面证明或取得有资格的人 8或通过任何其他形式的文件,以表明可进入可能有危险气体的场所, 级行特定的手续后方可进入这些场所			
			(2)		片局应为有接触离子辐射危险,特别是在核能 E业中从事维护、改造和 建筑的工人,制定并执行严格的安全条例			
		8-3	施工工地上,在工人可能经过的每一个工作场所和任何其他地方均应提供充分和适用的照明,需要时提供手提式照明设备					
[个人	防护月	品、	方护服、福利设施、急救设施			
工作场所安全	9	9-1	即多使。。总因用检。环身。当。原。	在情个戴求用在,保、采时护上用身;要不下队人外人多 工修其用户护上用身;要求工作,是不是一个人,并不是一个人,并不是一个人,并不是一个人,并不是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,	品及防护服。 规划及作业设计阶段考虑到了所有预防措施,进行建筑施工时,在大			
		9-2	建筑件的	重要组	工作艰苦,体力劳动繁重,环境既危险又脏乱。福利设施是良好工作条 1成部分。良好的福利设施不仅能改善工人福利,而且也能提高作业效 1建议书对此提出以下规定及建议			

项目	序号	1		主 要 内 容
			(1)	应在每一施工工地或在其合理就近范围提供允足的卫生的饮用水
				应向每一施工工地或在其合理就近范围,按工人人数及工期长短,提供及维护以下福利设施
			(2)	(a) 为男女工人分别提供卫生间和盥洗室
				(b) 更衣、存放和晾衣服设施
		9-2		(c) 就餐条件和在恶劣气候条件下暂停工作时的休息场所
			(3)	在适当情况下,根据工人的人数、工作日数及工作时间和地点,应在建筑工 地及其附近提供能获得或准备食品饮料的适当设备
Γ.	9		(4)	当建筑工地远离工人的家,而在工地和工人的家之间又不具备良好的交通条件时,应在工地为工人提供适当的住所,并为男女工人提供分开的卫生间、 觀洗室和卧具
作场		9-3	急救	2 设施
所安			(1)	雇上保证随时提供急救服务(包括训练有素人员)。应做出安排,保证运送遭遇事故或急病的工人去医院
全			(2)	上管 P.生 当局和最有代表性的有关雇上组织和工人组织经过磋商后, 根据园家法律规定, 提供急救设施和人员
			(3)	在有謝死、窒息或电击危险出现的工作中,急救人员应擎搁抢救技术,并熟 悉营敷程序
	10	事故	报告门	国家法律或条例规定在一定时间向上管当局报告工伤事故和疾病的情况
		履行		
		为了	1	公约的实施, 1988 年施工安全与卫生公约规定
	П	11-1	1	设员国应采取 ·切必要措施,包括规定适当的惩罚和纠正措施,以确保有效地 示本公约的各项规定
		11-2		基本公约适当检查所采取的实际措施,并就如何进行检查提出相应的办法或查查不服适当的检查工作

3. 安全管理

1) 安全管理的重要意义

在施工过程中,防止工伤事故、保证人身安全是一个有公德承包商最基本的职业守则, 而且在国际工程中尤其重要,它不但体现了承包商的管理水平,并且还严重影响着承包商 的公众形象。而且安全管理的重要性还有如下方面。

根据一些国家的政府有关部门统计,建筑行业的工伤意外率和工伤死亡率在所有的制 造行业中居于前列,建筑行业的安全管理具有重要的意义。

虽然,从统计学角度来讲,建筑工地上的伤亡事故是难免的,但绝大多数的意外是可 以通过严格的安全管理来避免的。

建筑 L地的 L伤意外事故,不但对受害者及其家属造成灾难性后果,往往也会使承包 商付出沉重的经济代价,并影响其经营管理形象。

安全的施工环境可以从心理上影响 L人, 使 L人安心工作,提高工作效率;使工人感觉到管理者严格管理的决心,更加注重质量方面的控制。

工程的国际性,往往决定了承包商来自于其他地区,而工人多数来自当地。承包商对工人安全健康的疏忽往往会导致当地政府部门和工人的抗议,甚至上升为政治问题。

承包商的安全纪录,对于承包商投标具有重要影响。

国际工程的合同中,多数会有涉及安全施工和劳务人员的健康与安全问题的条款,甚 至在工程量清单中列出与安全管理活动有关的赔偿内容。

综上所述,安全管理必须得到足够的重视与投入,真正在行动上、效果上做到"安全至上",而不是仅仅停留在口头、文字上。

2) 安全管理计划的制订、内容及实施措施

项目安全管理计划,体现了项目管理者对于安全管理的目标、总体思路和具体实施原则,是工地安全管理的指南。安全管理内容涉及方方面面,同时为了确保安全管理的有效运用应有组织保证、物质保证、制度保证、技术保证措施,具体内容见表 6-5。

表 6-5 安全管理计划的制订依据及计划内容与保证措施表

项目	序号	主 要 内 容
	1	当地有人建筑工地的安全、健康管理的法规
	2	公司有关建筑工地安全、健康管理的政策、文件
安全管理计划	3	合同中有关工程安全、健康管理的有关内容
中制订	4	[[程本身的特点:环境、结构、施工方案等
依据	5	其他类似工地的安全、健康管理经验与资料
	6	项目管理者、安全计划编制者及其他有关人士(如业主工程师、有关政府部门的工作人员、安全专家)等的经验与意见
	1	安全管理政策 项目的安全政策 一般参照公司的安全管理体系的政策和工地的实际情况而制定,承诺提供符合标准的安全和健康的工作环境。确保公司员工、分包商工人、与工地有关的第三 者的人身安全和健康、减少意外事故、杜绝违例检控和严重安全事故、将意外率控制在 合理水平
安全	2	安全健康管理的有关法律条文 罗列 L 地所在地必须要遵守的有关安全、健康管理的法律条文,便于遵守
管理计划的	3	安全管理的组织机构与职责分工 同项目的管理组织机构相对应。并分配相应的安全管理责任。特设"安全管理委员会"。 跟进、促进、监控安全管理计划的实施。安全委员会应包括项目上要领导、工程师、总 管及分包商代表、工人代表,以便全面沟通
内容	4	安全培训和演习 对员工和工人进行入职培训、工地座谈、专题培训、管理培训及演习,提高安全意识, 认识安全健康的工作方法
	5	工作许可证制度 凡是进行某些风险较大的工作(如爆破工作、在密闭空间进行的工作)时,分包商应向项 目管理班子提供适当资料、提出申请、做好安全措施,并将批准的申请悬挂张贴在工作 地点

项目	序号	主要内容					
		安全巡査和审核					
	6	定期或不定期地进行安全巡查,及时消除工地存在的安全隐患;公司质安部或外部独立					
		审核机构对项目的安全管理体系进行内审和外审,纠正管理体系中的不合格点					
		风险评估					
安		预先对于不同的工种、工作环境、工作设备机械、特殊施工方案进行分析,寻找可能造					
全	7	成人身伤害的因素,采取相应的安全防护措施和监控方式,确保施工在安全的情况下进					
管理		行,降低意外风险率					
理计		个人防护用具					
划	8	针对不问施工环境佩戴相应的个人防护用具,如安全帽、安全鞋、口罩、护目镜、耳塞、					
的		安全带等,减少施工工作对人的身体器官的损害					
内		意外事故调查程序					
容	9	对于已发生意外事故的调查程序,是了解事故的发生原因,评价意外的严重程度,寻找					
ы		减少或避免类似事故的措施					
		紧急应变程序					
	10	对上突发事件的紧急应变处理程序化,加快反应速度,预防或减少对工程、工人、社会					
		的可能损失					
	11	安全推广					
		通过组织一系列活动,推广安全政策,激励员工和工人进行安全生产					
	12	健康保证程序					
安全管		评估施工对于员工和工人的身心健康的影响,并尽量将负面影响降低至最小					
理计划	13	分包商的选择和控制					
的内容		选择安全表现一向良好的分包商,并在施工过程中密切关注和控制					
	14	生产过程控制程序					
		针 对不同工种、工作环境、施工机械的风险评估,制定相应的安全生产程序,保证生产					
		顺利、安全的进行					
	按照安	全管理计划的要求,项目经理领导建立适当的安全管理组织机构,作为工程安全生产的					
	组织保	证措施。一般包括两种组织,一是以项目经理为首,由承包商和分包商联合组成的安全					
	生产管	理委员会,由安全主任主持工作;另一个是在项目经理直接领导之下,由项目管理组织					
实施	成员构	成的安全管理小组。安全管理委员会,通过组织成员(承包商和分包商的单位负责人、安					
安全	全负责	人等)传达、落实项目的各项安全规章制度,并定期总结、改进。安全管理小组,在项目					
管理	经理的	领导下,通过项目各部门的负责人,发挥部门的安全管理职能,完善、传达、落实各项					
组织	安全规	章制度,保证工程顺利进行。					
保证	无论是	无论是安全管理委员会,还是安全管理小组,都要处于项目经理的领导之下,但日常的管理工					
	作主要	作上要由安全上任专职负责。安全上任是保证工程安全生产的重要角色,必须具有足够的专业					
	知识、	识、经验和职业精神。通常在国际工程的合同中,会有关于安全主任的资质要求,有的地区					
	则体现在法律条文中,类似要求必须予以满足						
实施安		理需要足够的物质保证、需要投入。有的工地安全表现差,往往是项目经理处于表面上					
全管理		的肤浅考虑,舍不得投入而造成的。安全事故的发生具有偶然性,但当投入不够时,偶					
物质		能就成为必然性。承包商不但自己要做出物质保证,同时也要督促分包商做出应有的投					
保证		证安全生产措施足够,符合标准					

徒事

	*失 K
项目	主要内容
实施安	每个项目应该有一套完善的保证安全生产的规章制度、并严格实施、确保安全管理计划得到持
全管理	续实施,有效预防安全事故,避免违反当地有关法律。
制度	项目的安全管理制度,首先要符合工程所在地的法律制度、合同中的有关条文、公司安全制度
保证	与政策、技术规范、安全操作规程和工程的实际情况
实施安	对于高风险的工作,如高空工作、密闭空间工作、垂直运输等,需要做出专门风险评估,对于
全管理	□工作环境需要做出特别安排,必要时,需要一个安全工作方案和合格人工确认。例如, 塔式起
技术	重机重叠调运区的操作,需要做出特别安排,如配置预警系统、制定安全工作程序,并对塔式
保证	起重机操作人员、调运指挥员等进行特别培训和交底

知识链接

- 1 安全管理
- (1)急救设备 規模較大的工地,甚至设立设施比較完善的医护室 工地应具备紧急初步处理伤情的能力。
- (2) 劳保用品 购置足够的合乎安全要求的劳动保护用品和器械,如安全帽、安全绳、安全带、安全网、安全鞋、护目镜、耳塞、口罩等
- (3) 消防器材 按照有关的规定,购置足够的消防灭火器具,如消防泵、灭火罐、消防龙头等;设置安全仓、储存易燃易爆物品;对于炸药仓库等、要设专职警卫
 - (4) 培训设施 购置多媒体培训设备和教材, 安排足够桌凳和场地
- (5)安全措施材料 这是一项比较大的持续投入,如购置合乎安全要求的高空工作平台、出料台;具有防漏电功能的临时电气设施、照明设备、安全围栏、临时安全通道、安全吊具等。
 - 2. 制度保证最基本的安全生产制度
- (1) 定期召开安全生产会议根据不同的施工阶段、季节,有针对性地预先安排,并组织落实,体现"预防为主"的安全管理宗旨;针对现阶段或以前发生的安全问题或隐患,分析原因,制定措施,不断改进
- (2) 定期检讨安全生产管理制度和安全管理计划的执行情况 項目经理应组织人员, 定期检查安全管理资料和现场安全管理现状,改进安全生产管理的同时,注意完善制度; 不断定期检讨安全管理计划的执行情况及跟进相关法律政策的变化,及时调整安全管理 计划。
- (3) 牢固树立"安全第一"的意识,贯彻"安全第一,预防为主""生产须安全,安全为生产"的指导思想,在安排工作时,首重安全。
- (4)安全培訓制度 制定、实施安全培訓制度,通过入职培训、工地座谈、专题培训、管理培训及演习,提高安全意识;通过组织工人参加工地早操会,舒展工人肌体,提高注意力,清楚当天工作的风险,减少工伤事故的发生。

外理措施

艺或设备; 工作时间之外进行施工,

必须经讨有关部门的批准。处于高

噪声环境下工作的操作人员, 濡佩載

耳塞

(5) 落实奖惩制度 从经济和精神上对安全表现好或对安全工作做出突出贡献的个体 或团体进行奖励,对违章作业者进行处罚,奖惩有据可依,及时到位,做到制度化,从而 激励员工和工人注重安全工作。

4. 环保管理

1) 工地环保管理的内容与措施

污染源

·切产生曝击的操作。

般建筑工程车辆摘击式打

桩工程施工机械机电调试

噪

声

在工地推行系统的环保管理,并实施 ISO 14001 环保管理体系,是近年才开始提倡的。 其实在此之前,不少项目在进行施工时,出于成本、公德、当地法律要求等考虑,环保管理一直都在自觉或不自觉地进行中。环保管理主要内容包括,减少污染,降低污染的影响, 节约资源,减少废弃物,垃圾分类处理等,从而达到工作环境健康,最低限度批民,最低 腹度消耗资源,最低限度污染环境,符合当地法律要求等管理目标,提高综合管理水平, 节省资源、增加承包商的社会信誉。从大的方面划分,环保管理一般包括控制污染、节约 资源两个方面。

特别提示

不少国家和地区,环保管理的纪录对投标资格甚至标价有重要影响,如在香港,如果承包商的一个工地在连续6个月内有5次或以上环保违例,将面临暂停工务工程投标资格的严重处分.特别是在国际工程中,ISO 14001 环保管理体系认证已经成为市场准入的必要条件 通常,工地施工过程中的主要污染、污染源、危害及处理措施见表 6-6

厂地小埃 操作工人或临时受影响的工人应佩 易产生尘埃的物料堆 戴能有效隔离粉尘的口罩:覆盖易产 被工人或工曲外的路人吸入 机械打磨或破碎 生尘埃的物料堆或泥面: 通道或工作 肺部。易产生肺部积尘等的 空 清扫工地干燥垃圾 血洒水: 车辆进出 L 地要清洗车轮: 业病, 甚至肺癌 气 未覆盖的泥面 打磨或机械粉碎 厂程进行时,要不断 干燥的车辆通道 淋水或喷洒抑制粉尘的化学剂 染 烟、雾、其他刺激性气体 加强空气流通; 采用刺激性小、挥发 机械黑烟排放 刺激眼、鼻等,并由此引发 性弱的涂料;禁止在 L 地内焚烧垃圾 煜接下程, 切割下程 其他不活症状 及用烟火驱蚊 油漆工程、防水工程 长期在高噪声环境下工作。 限制 [作时间: 采用低噪声的生产 [

对听力可能造成不可恢复

的损伤:降低工人的注意力

和心理忍耐力,导致安全事

故:影响周围居民或工作人

员正常的工作和休息

表 6-6 施工过程中的主要污染、污染源、危害及处理措施

类型	序号	污染源	危害	处理措施
污水	3	地面污水、钻探水 施工废水、混凝土养护水 车辆冲洗、设备冲洗水 清洁水、生活废水 厕所污水、因房污水	污水中的悬浮颗粒过多,易产生沉淀,堵塞污水管道; 酸碱值过高或过低,易腐蚀 污水管道、水处理设备,污 水中的有机污染物易产生异 味,滋生细度及蚊虫,污水 溢出工地,滋洗路人及住户	时排出 下地。设置水处理设施,如沉
光污染	4	焊接	损伤眼睛,甚至短暂失明	操作者佩戴助护眼镜:适当遮挡
废物	5	难降解建筑垃圾:混凝土、 石头、废弃泥土、碎砖头等易降解建筑垃圾:钢筋 头、废板枋、竹、纸张等 化学废物:废白胶浆、润 清油、油漆、酸、碱 板油等生活废物		工地垃圾分类存放、处理:及时清理 工地垃圾:安排合规格的化学品储存 仓:联系回收商回收指定废物:做好 储存及运输记录:尽量重新利用废 物,加强管理、改进工艺,减少垃圾

2) 施工过程中的节约资源 >

在施工过程中, 节约资源的意义非常重大,它反映了一个承包商的成本管理能力和环 保意识。环保管理良好的项目一般会针对项目的特点, 重点跟踪大量使用的资源, 根据实际情况和以往经验确定节约指标, 制定相应的措施, 形成资源节约计划, 并定期评估实施效果。

节约资源的主要途径如下。

- (1) 加强材料管理,减少材料浪费。
- (2) 加强质量管理,一次做妥,减少返工。
- (3) 回收、再利用废物。
- (4) 采用材料损耗少、返工机会小的工艺和方案。

推荐阅读资料

- 1. 《现代智能建筑设计方法》、尚继英、编译。气象出版社
- 2.《现代办公楼设计》, 翁如璧、编著。熊明、审定。中国建筑工业出版社
- 3.《智慧型办公大楼计划》,安富重文、著。崔征国、译。詹氏书局
- 4.《智能建筑》、张瑞武、主编。清华大学出版社

任务训练

首先,分析下列安全责任目标考核表(表 6-7~表 6-11)及钢结构施工安全技术交底单(表 6-12),然后收



集当地工程环保管理和职业健康安全管理资料、再参照相关法律、法规、列出施工现场全面一体化管理文 件清单.

表 6-7 项目经理安全责任目标考核表

单位 L程名称:	××工程 姓名: ×××	年	月 日
内容	安全责任目标考核内容	标准分	实得分
管理安全目标	本月安全管理目标	5	4
20分	上月安全管理目标执行落实情况	15	12
	认真执行国家安全生产法律、法规,与工人签订劳动合同;贯彻 执行建筑施工中安全强制性条文,落实安全防护经费	10	9
	制定本项目的安全管理制度和签订本项目部管理人员安全生产 责任书	5	3
tra red r	组建项目部安全管理机构、配备专(兼)职安全管理人员	5	5
保证项目 50 分	每月组织一次安全检查和安全设施(备)验收 🔻 🔍	10	10
30 71	每月组织一次安全例会,组织学习安全知识,通报本月安全生产情况,布置下月安全生产工作,并作好会议记录	10	8
	及时给工人办理建筑意外伤害保险,发生安全事故及时上报,并 组织抢救,对事故严格按"四不放过"的原则处理	5	3
	审查项目管理人员安全管理目标,督促落实并组织定期考核	5	4
	审批安全技术措施,安排人力和物力计划 (*/_1)	5	4
	现场施工用电、建筑施工垂直运输设备安装完毕,组织验收合格 后,向有关部门申报验收	5	5
·般项目	组织工人 :级安全教育, 开展查隐患堵漏洞等形式的安全活动	5	4
30分	严格执行特种工持证上岗,不断提高普通工持证上岗率	5	4
	组织开展创安全文明施工现场,不断改善劳动者的工作、生活卫生条件	5	4
	审批本月《建筑工程施工安全月报表》	5	5
安全总结	84 = 84%, 优良 被考核人:		
考核评语	优良 安全领导小组组	长:	
签名	参加考核人员:		

表 6-8 施工技术人员安全责任目标考核表

単位 L 程名称: ×>	XX L程 姓名: XXX	年	月日
内容及分值	安全责任目标考核内容	标准分	实得分
管理安全目标	本月安全管理目标	5	4
20 分	上月安全管理目标执行落实情况	15	13

.. .

			张 衣
内容及分值	安全责任目标考核内容	标准分	实得分
	参加项目工程安全技术交底、并有签字记录	12	11
保证项目	参加或组织编制安全技术措施,并审查安全技术措施的 可行性与针对性,并随时检查、监督落实	12	10
50分	主持安全防护设施和设备的验收,严格控制不符合标准 要求的防护设备、设施投入使用	13	12
	收集整理现场管理资料,保证检查验收资料与工程进度 同步	13	12
	贯彻落实安全生产方针、政策, 严格执行安全技术规程, 并做记录	7	6
一般项目 30 分	依据施工组织设计和专项方案,细化安全技术措施,制 定季节性和针对性的施工方案,并编制安全技术交底单。 及时解决执行中出现的问题	. 8	8
30 77	参加安全生产检查,对施工中存在的不安全因素,从技术方面提出整改意见和办法予以消除	8	6
	参加、配合因工伤亡及重大未遂事故的调查, 从技术上 分析事故原因, 提出防范措施和意见	7	5
安全总结	87 = 87%, 优良 被考核人:		
考核评语	优良 安全领导小组	组长:	
签名	参加考核人员:		

表 6-9 施工管理人员安全责任目标考核表

5 [积名称: ×>	ベ××工程 姓名: ×××	年	1]
内容及分值	安全责任目标考核内容	标准分	实得分
管理安全目标	本月安全管理目标	5	4
20 分	上月安全管理目标执行落实情况	15	12
	依据法律法规、规范标准组织安全生产, 贯彻执行施工组织设计和安全技术措施	5	5
han a ser an	参加项目安全创优计划和安全技术措施的制定,并组织实施	10	8
保证项目 50分	参加施工用电、外脚手架、建筑施工垂直运输设备等专项方案的 编制,并组织实施,确保安全防护设施与施工进度同步	15	10
	参加对设备、设施的检查验收,提出整改意见,组织整改落实	10	9
	负责现场的卫生整洁和其他文明施工措施	10	8
	组织施工人员开展季节性的安全教育,并有教育内容和记录	5	- 5
	参与对新进场和转岗工人的三级安全教育	5	4
·般项目	合理安排施工作业,做好交叉流水,对操作人员进行交底	5	3
30分	组织安全技术交底,督促班组长对操作人员进行交底	10	7
	参加施 L现场安全检查,禁ll 违反劳动纪律,违章作业,违章指挥的"三违" 现象发生	5	5

				74.24
内容及分值	安全责任	目标考核内容	标准分	实得分
安全总结	80 = 80%,优良	被考核人:		
考核评语	优良	安全领导小组组长:		
签名	参加考核人员:			

表 6-10 安全员安全责任目标考核表

i位 T 和名称:	××××工程 姓名: ×××	年	月
内容及分值	安全责任目标考核内容	标准分	实得分
管理安全目标	本月安全管理目标	5	4
20 分	上月安全管理目标执行落实情况	15	15
	参加项目部制定的有关安全制度、措施、提出建设性意见	6	5
	参加对新进场和转岗工人的三级安全教育以及安全技术交底	6	5
	参加公司、项目的各种安全检查、检查验收资料与工程进度同步	6	6
	参与班组安全活动,检查班组活动记录	6	5
保证项目	监督现场安全防护用品的质量和发放使用,并做好记录	7	5
50分	及时对施工用电、龙门架(井架)、塔式起重机、外脚手架等设施, 组织检验,并定期组织白检	7	7
	参加每月安全例会,并邀请领导参加,做好记录。上报每月安全 报表	6	5
	组织落实施工现场五牌一图、警示牌、安全标语、黑板报等安全 宣传活动	6	5
	组织学习国家有关安全生产方针、政策和《建筑施工安全检查标准》以及规范规程	5	4
	严格遵守本企业、本项目的安全管理制度和安全生产责任制	5	5
-般项目	开展施工现场安全巡查, 防止"四大"伤害事故	5	5
30 分	参加安全事故的调查处理	5	4
	建立本企业、本项目的工伤事故档案,发生事故及时上报	5	4
	制止违章、执行安全生产奖惩制度,建立奖罚台账	5	4
安全总结	$\frac{88}{100}$ = 88%, 优良 被考核人:		
考核评语	优良 安全领导小	组组长:	
签名	参加考核人员:		

表 6-11 班(组)长安全责任目标考核表

单位工程名称:	XXXX T程 姓名: XXX	年	月 日
内容	安全责任目标考核内容	标准分	实得分
管理安全目标	本月安全管理目标	5	4
20分	上月安全管理目标执行落实情况	15	15
	组织本班(组)开展学习安全操作规程活动	10	8
保证项目 50分	每天利用上班前 15~20min 组织本班(组)开展班前安全活动,并做好记录	15	12
30 77	认真做好工人转岗安全教育,并作好班前安全技术交底	10	8
	组织本班(组)人员开展施工作业层的安全巡检,及时消除隐患	15	12
	执行安全管理制度、各工种安全技术规程	5	3
	认真落实安全技术交底制度,并履行签字手续	5	5
	检查本班(组)人员劳动保护用品的使用情况,纠正违章行为	5	4
·般项目	参加安全检查和安全例会,汇报本班(组)的安全生产情况	5	4
30 分	合理安排本班(组)人员的工作,加强交叉作业的安全防护。对本 班(组)人员在生产中的安全和健康负责	5	4
	制止违反劳动纪律,违章作业,违章指挥的"三违"现象发生, 有权拒绝违章指挥	5	4
安全总结	83 = 83%, 优良 被考核人:		
考核评语	优良 安全领导小	组组长:	
签名	参加考核人员:		

表 6-12 安全技术交底单

安全技术交底内容:

倒结构 L程中, 高层和超高层施工安全问题十分突出, 应该采取有效措施, 保证安全施工。具体安 全措施如下。

- (1) 在柱、梁安装后而未设置浇筑楼用的压型钢板时,为便于柱子螺栓等施工的方便,可在钢梁上 铺设适当数量的走道板。走道板可附设吊耳和扶手。
- (2) 钢结构吊装时,为防止工具和物料飞出,人员坠落,可架设安全平网和安全怪网。平网设置在梁面以上2m处,当楼层高度低于45m时,安全平网可隔层设置。平网要求在建筑平面范围清辅。怪网铺设在建筑物外围,高度一般为两节柱的高度。
 - (3) 为便于接柱施工,在接柱处要设操作平台。
- (4) 施工需要的各种电气、焊接设备,要存放在备用平台上,平台随结构安装逐渐升高。备用平台的螺栓必须全部加以紧固。电气设备要接地,每层楼面分别设置配电箱,供每层楼面施工用电需要。
- (5)为便于施工等高,吊装柱子前要先将等高钢梯固定在钢柱上,为便于进行柱梁节点紧固高强螺栓和焊接,需要在柱梁节点下方安装挂篮脚手。
 - (6) 当风速为 10m/s 时,高空吊装施工应停止;当风速达到 15m/s 时,所有工作均应停止。
 - (7) 施工时还应注意防火,配备必要的灭火设备和消防人员。

L	(1) AD - 1 - HOLD - 1 - HOLD -						
I	交底人签名		安全员签名		接受交底人签名		

6.3 智能建筑与资料管理

₫ 引例

表 6-13 是我国台湾智能建筑"智商"评估准则,以下评估项目评分标准中充分应用者得 3 分,某些 时候应用者得2分,几乎或完全不应用者得1分

表 6-13 智能建筑"智商"评估准则

序号	评 估 项 目	得分
1	以宏观的思考设计大楼,与外界环境相互协调,并提供公共活动空间给社会人众	
2	办公室采用无柱式开放空间规划,以便弹性调整;顶棚净高全少 2.6m,以利 OA 设备的导入	
3	大楼内部规划有挑高的中庭,以作为缓解压力及人际沟通的交谊场所	
4	配合时代发展的步伐, 大楼智能化有整体性阶段式的规划, 并选用可对应时代发展的科技设备, 以期未来可发展扩充	
5	适应不同用户之业务需要,各种设备可 24h 运转使用	
6	窗户边均设有光电感应器,以配合外界自然光,调节室内照明	
7	妇 对照明及空调的需要,使用系统顶棚,可任意调整规划办公室的空间使用	
8	在大楼各处设有 CCTV(区域有线电视系统)及感知器,以债测大楼中各项设备(如电力、空调、卫生、电梯等)及防灾、防范等状况,并由中央监控系统集中监控	
9	各电梯的使用,以电脑联动控制,发挥其安全性与效率性	
10	温度控制可自动调节,以节省能源并塑造舒适的工作环境	
11	设置明确的逃生指示,提供访客及工作者在灾害时清楚的逃生方向	
12	大楼的平面布线采用新式的管线材料和布线方式,可适应未来 ISDN(整体服务数字网络)时代的高品质通信要求	
13	大楼对外(含屋顶架设无线通讯设施)之通信管道,容量可充分适应未来科技的快速进步	
14	使用 LAN(区域网络)作为大楼内部各用户之间的通信 EF, 对外有建立网络连接的设计	
15	使用 DPBX(数字交换机)	
16	针对 OA 机器设备的配管与配线,可做阶段性的扩充	
17	引进 VAN(加值型网络)与 WAN(广域网络)	
18	预留未来增设 OA 机器所需的电气容量、空调与照明之对应管线	
19	针对 OA 机器所产生的高热量及噪声、预做妥善的消声、隔热的适应措施	
20	系统家具使用消除噪声的材料	
21	采用防眩光系统照明, 避免视觉伤害	
22	引进无纸化的 OA 系统设备	

建筑工程资料管理(第二版)

徒 表

序号	準 	16.9
23	配合各用户或个人需要及工作性质,采用做电脑挖制式空调,可做分散式局部自由运转	
24	依人体工学的原理,使用适合的系统家具	
25	办公室做有系统的色彩规划,以避免眼睛的视觉疲劳	
26	为缓和心理疲劳,办公室有绿化设计、背景音乐及休息专用区	
27	为解除紧张、松弛压力,设有健康中心、体育室等设施	
28	大楼内采用租户共用服务系统(SYS),提供各种咨询、设施与服务的共享共用	
29	导入具有高管理控制机能的设备,可达到节约能源与人力、提升环境品质的效益	
30	大楼构造强度与各空间构造安全,均要适应电脑化设备防震防灾之安全标准	

注:总分在71~90分,表示大楼已具备智能化程度。总分在51~70分,表示大楼仍符合智能建筑的基本标准,未来其扩充性。总分在31~50分,表示大楼仅拥有基本机能,但智能化仍有特加强。总分在30分以下,表示外下必须加强智能化程度的普通大棒状况。

息 思考

对照台湾智能建筑"智商"评估准则、收集当地智能建筑的相关资料、进行评估判断其智能化程度、并设计活应本地智能建筑的评估准则

6.3.1 智能建筑与绿色建筑

1. 智能建筑及应用目标

随着科学技术的发展,建筑技术也在不断的从高新技术中吸取新的元素,智能建筑技术就是高新技术在建筑领域中的应用,形成新的建筑技术。高新技术的发展使得智能建筑技术也不断发展和完善,也不断更新和成熟。

我国智能建筑设计标准(GB/T 50314 2015)把智能建筑定义为:"以建筑为平台,兼备建筑设备、办公自动化及通信网络系统,集结构、系统、服务、管理及它们之间的最优化组合,向人们提供一个安全、高效、舒适、便利的建筑环境。"该定义给出了智能建筑的基本组成和要素,也给出了智能建筑的基本功能和特点。

亚洲智能建筑学会(Asian Institute of Intelligent Buildings)將智能建筑的功能模块化, 引 纳为 10 个功能模块。并用"M+序号"表示, 每个功能模块称为"QEM(Quality Environment Module)"。其中, M10 是在 SARS 发生后加入的。



M1: 环境模块---健康、节能。

M2:空间模块——利用率高、分隔组合灵活。

M3: 费用模块——运行、维护费用低。 M4: 舒适模块——人员舒适。

M5: 工作模块--工作效率高。

M6:安全模块——有效避免和减少由于火灾、地震、灾害和结构破坏等突发事件的损失。

M7: 文化模块——营造先进、优秀文化环境。



M8: 高新技术模块——及时利用高新技术成果。

M9:结构模块——布局先进、结构优化。

M10: 健康和卫生模块——有效防止流行性传染病的传播。

不同智能建筑由于使用功能上的差异、可以选择不同的 OEM 模块进行设计和实践。 可以看出, 上述模块化定义不仅具有实际指导意义, 而且还具有一定的灵活性。

● ′型 特别提示

- (1) 在绿色奥运建筑研究课题组所作的"绿色奥运建筑评估体系"中谈到了建筑适应 性,其中设计阶段的"建筑适应性评价措施表"的内容如下。
- ① 建筑的总体功能布局满足今后长期使用的要求(体育场馆功能充分考虑了寡后利 用,其他类型建筑能够适应合理的功能改变要求)。
 - ② 建筑的平面布局考虑多功能使用或适应功能改变的要求
 - ③ 建筑的空间设计考虑多功能使用或适应功能改变的要求。
 - ① 建筑的结构设计考虑多功能使用或适应功能改变的要求
 - ⑤ 建筑的机电设计考虑多功能使用或适应功能改变的要求
 - ⑥ 建筑多功能使用或适应功能改变的经济合理性

本条目旨在鼓励建筑师在设计中考虑更灵活的应对措施。并进行合理的技术设计。使 设备和空间设计具有良好的自由度、并在当面临基本维修或因改变建筑用途而带来的各种 必要改动时,对材料和设备的更换和扩充显得更容易,并尽可能减少对建筑结构和装修材 料造成损坏 鼓励提高建筑的荷载余度和抗震性能,以增加建筑对今后改变用途的适应 能力。

- (2) 验收与运行管理阶段的"建筑适应性"设计条文说明
- 本条目主要从3个方面评估是否有效提高建筑的适应性
- ① 材料和设备的耐久性 针对非临时性建筑,鼓励选用优质建材和优质建筑设备,并 采取科学的方法进行施工安装。以尽量延长材料和设备的更换时间
- ② 适应性 考虑适当的层高与荷载的容裕度,以便适应今后功能改变的要求 空间自 由度反映在单位建筑面积对应的不可移动的外墙和承重墙的长度 外墙和承重墙越少, 空 间改变的自由度就越大。
- ③ 设备、管道更换的方便性 主要考虑维修、更换设备时、尽可能减少对建筑结构和 装修材料造成损坏。

知识链接

由于各个国家和地区对智能建筑的要求不一样。智能建筑技术的发展情况也有差别。 这种不断发展和改讲的特性使智能建筑在不同的时期以及在不同的地方且有不同的阶段应 用、由此产生了各个地区和国家对智能建筑的定义、这些定义具有不同的侧重点、使人们 可以站在不同的立场和用不同的角度对智能建筑的基本功能和特点、基本组成和要素作一



个基本的了解。

美国把智能建筑定义为:"智能大厦是指通过将提高建筑物的结构、系统、服务和理想四 项基本要求以及它们之间的内在关系进行最优化。来提供一个投资合理的、具有高效、舒适、 便利环境的建筑物"帮助建筑业主、物业管理人员和租用人员意识到在费用、舒适、便利和 安全等方面的目标、当然还要考虑长远的系统灵活性及市场能力。

欧洲智能建筑组织(The European Intelligent Building Group)把智能建筑定义为: "使其用 户发挥最高效率。同时又以最低的保养成本和最有效率管理本身资源的建筑" 智能建筑应 提供"反应快、效率高和有支持力的环境、使用户能达到其业务目标"

新加坡把智能建筑定义为至少具备3个条件的建筑,一是具有保安、消防及环境控制等先 进的自动化控制系统, 以及自动调节建筑内温度, 湿度, 灯光等参数的各种设施, 以创造舒适 安全的环境:二是具有良好的通信网络设施、使信息能在建筑物内流通:三是能提供足够的对 外通信设施与能力 这个定义对智能建筑的功能进行了细化和总结

中国智能建筑应用目标见表 6-14.

表 6-14 中国智能建筑应用目标表(居住建筑)

		表 6 14 于直目配定水应用目标水(后正定水)
1010	排号	
使用者的舒适性	r s	对于使用者来说,提高建筑物的内在品质,提高工作或生活环境的健康舒适度,是智能建筑最长的前提和要求。
		小区内综合布线系统等。 所以现代舒适家庭的标志,应该包括:居住环境调节智能化、能源系统使用数字化、网络
		The standard of the standard o

化、家庭照明智能化、家电智能化、家庭安全防范智能化等多种模式

给事

		续表
项目	序号	内 容
再组织的灵活性	2	再组织的 灵活性是智能建筑技术重要的标志性应用结果。组成建筑的每个部分,建筑中使用的每个设备、都需要有再组织的功能。再组织意味着从建筑相对上说,能够再使用;从建筑部件上说。能够各种不同类型。不同用流。不同速宽线相的建筑使用、从使用客类说、不同地直放变化。却不改变自己的工作环境的各项舒适度变化、对联结构分式的变化,对建筑的管理者来说。将建筑的各种不同功能允分发挥,建筑本身以及建筑所使用的设备效果可以灵活的组织,充分满足使用者的要求。再组织的反话性可以反映在如下多个方面:建筑结构是由钢结构组成的,钢架本身是可以在维力向上进行调节。故该钢架可以用于各种不同功能的不同的建筑;墙体和屋顶也是由轻质材料或金属材料组成的,地板也是可拼装的,与钢架结构成为可再组织,再和用、可回政的智能型建筑部件。形成可再组织的限的结构。围护结构的核料都是由可再生、可回收材料组成的,这也是属于再组织的商用。地板由钢架结构的有外和发扬,再和用、可回收的智能型建筑部件。形成可再组织的限的结构,包括结构的充的空间分层放置空间系统和新填充统的管道。强电系统管线,则电系统管线,包括所有兄电通信线级人地板下引入地面,由管道引至办公桌面,控制使流光量处,包括一个空间气流和新成气流从地板下引入地面,由管道引至办公桌面,控制使从保证个人小环境近于段小下间的需要不会对外公地点的改变而改变,使身身人们。们外环境就像自己汽车的小字包,可以自由由新级战活自己的新适度,以提高工作效率。照则系统的设置则有依娜器能测天空中4个方向和明天水平方向的光照强度,而每路对都有自己的地址编码,计算机和规控器可以控制。经过的路位,这样,计算机则根据每层对的路度,这样,计算机则根据每层对的路度,这样,计算机则根据每层对的路度,这样,计算机则根据每层对的路度,这样,计算机则根据每层对的路位,这样是可以存储,是工程的路位,这样是可以存储,可以在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
工程 的适 应性	3	正程的适应性就是用最适于本工程的方法。完成该工程。换言之,即采用全寿命周期的概念 就是在工程的各个阶段。用最少的花费、用最快的方法。这到该工程的最佳功能实现。工程 的适应性好是智能建筑技术的重要特点。由于智能建筑是各个学科在建筑中的资源整合,采 用了。系列的高新技术。使得在建筑的这个平台1,可以完成更多的人解析下它的功能。可 以适应更多的功能要求,或者经过简单的改变,就能适应新的功能,这是没有采用智能建筑 技术的建筑所不能做到。或者不能完全做到的
节约能源	4	在能少的建筑最终的"未愿"。这一些无意思的一个。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

项目	序号	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
节约能源	4	研究制定一套适合我国国情的污水处理标准。 "开发研制有关仪表和设备,提高自动化程度,以减少能耗,降低污水处理成本,是污水处理发展的有效途径。" 上述这些关键技术都是智能建筑技术的应用范畴。"然,建筑中还有一些领域可以使用智能建筑技术,产约更多的能量消耗。智能建筑技术的采用,使上述关键技术的应用变得更为适合于建筑节能,采用这些技术后可以称之为高舒适度低能耗建筑。高舒适度低能耗建筑是通过对影响建筑性能的各部件和设备调节系统进行优化设计来实现的,其中包括围护结构和日光利用系统,照明系统;结构系统,取暖、通风和空调系统(HVAC)、内部装修和布置,电源和通信系统、控制系统等。一般来说,在建筑节能上,讨论得比较多的是围护结构和 HVAC 系统。实际上,要做到真正的低能耗建筑之一,进步系统都需要供成运行,进行优化设计和用最佳模式运行。而且如果其中任何一个一步进分标选的选择概算。一般未是实现理想的效果。在对建筑进行高舒适度低能低优化设计的过程中、建筑材料的选择制场速等。
环境的可特性	5	智能建筑技术对环境保护也可以起到很大的作用。对于可持续性,国际建物(UIA)与联合国教科文组织一份文件中有一段较公认的提起。"就其最临》又而言,可持续性所涉及的是一个社会、个生态系统或任何一个不断发展的系统在水久的将来都能继续有效地发挥其正确的功能作用,而不会受到那些关键性贷源的耗尽或过负荷的强迫而衰退。" 值特注意的是,该文件对"资源"的解释。"就一个社会来说,其资源可以是物质的,如化石燃料、上层;可以是天然的废物吸收系统,如潮湿地带或大气;可以是社会性的,如教育水平和公平竞争、光明磊落的意识。"可持续发展必然含物质和精神两方面,相辅相成,缺一不可
大提处突事 的能	6	随着智能建筑的发展、智能建筑技术中有关将各子系统进行系统集成的需求大大增加,这已成为当前智能建筑领域的一大热点。这种对系统集成的需求,除了管理智能建筑内各子系统的信息外,上要需求反映在对突发事件的处理上、譬如,由于突发事件的特殊性,建筑物的火灾处理系统已不是一个消防系统所能处理的: SARS 传染病的爆发,香港淘大花园的高感染华,据香港大学的研究,与建筑的通风有关;美国的"9·11"事件等。如何根据突发事件时人群的流向和示意图、确定建筑中各种设备的运转状况,延长人员的逃任时间,增加透生通道,是建筑中管理信息系统亟待解决的问题。要使得各设备子系统能在大集成系统的协调下,在优化它们的日常工作任务的前提下,并且能给出突发事件时设备运行的处理决策,以及提供人员逃生的时间和通道,供管理人员参考

知识链接

智能型办公建筑通过智能建筑技术,以强调使用者要求为中心,提供低成本,高效率 的办公平台,旨在提倡人性化的沟通与交流、注重办公空间对单位文化和人员素质的培养 和提高,引导智能化。强化绿色环保办公理念、在"以人为本"的前提下,在最大限度上 满足使用者对办公舒适性和提升工作效率及效益的要求,从而达到国际化办公建筑的标准

现代办公建筑都需要新的建筑技术支撑,特别是智能建筑技术、现代办公建筑的配置 最大特点, 都与使用者的舒适度有关系。

- (1) 强调个人隐私、但一定要有相互交往的空间;办公环境空间的规划,从封闭及注 重个人隐私走向开放和互动 交流度高、富弹性的平面规划设计成为时势所趋。在更大程 度上提供给大家办公共享空间、在倡导交流沟通的基础上提高工作效率、打造全新的办公 方式,这也是智能建筑的人性化的表现 新型智能型办公建筑,使用者用脑时间长,办公 时间相对较为灵活。需要更多的休闲空间以及人与人交流的环境 办公时间内的休闲将突 破传统的"办公室+公共走廊"的空间模式、提倡开放式办公环境
- (2) 从建筑本身的设计, 空间的划分到家具的使用, 办公设备的使用等, 都要符合人 体工程学。
- (3) 保持室内空气的新鲜、将自然空气引入办公楼内成为"后非典时期"办公楼非常 关心的问题。引入自然空气的理念必须融进建筑设计和空调系统设计当中
- (4) 由于每人对工作温度的要求不同、故一定要有满足个人不同需要的舒适的工作温 度. 以提高工作效率。
- (5) 工作区间的灯光控制, 既要使得每个人眼睛舒适, 又要能满足各人不同的需要 公共空间的灯光也要使眼睛保持舒适
- (6) 随着方便又快捷的因特网网络系统的普及、网络资源的共享成为提升工作效率的 重要来源。
- (7) 办公空间要亲和自然环境,增强对景观的要求 一是外部景观, 建在优美的自然 景观附近,水景尤佳,依山傍水、与自然界亲密接触 二是建筑内的绿色景观也越来越受 欢迎,有共享交流功能的建筑内交往空间成为日后办公建筑的一种趋势。在办公区内应有 更多的公共休闲空间及楼宇内的立体绿化。

\$ 特别提示

1. 国家科学基金对智能建筑适应性的介绍

在国家科学基金和德国 DFG 基金的合作研究项目中,智能建筑设计有适应性的介绍: 可适应性内容广泛。可附加的、能够增长的、可改变的、可拆卸的、可分解的、可分隔的、 可自己建造的、可扩大的、生态住宅、节能建筑、规划的灵活性、安装式建造、功能可变 的、地域性的、大范围的、临时结构、低造价建筑、活动的车船、多样目标的、暂时性的 规划主张、可携带和循环使用的结构、再生的、重复使用的、可代换的、废物利用的掩避 体、短时性的建设体制、可抛弃的建筑、由使用者自行规划的、多样性空间的有效利用等, 都属于可适应性建筑。

2. 我国"国家突发公共事件总体应急预案"

我国已于 2006 年初发表了"国家突发公共事件总体应急预蒙",其中谈到提高政府保障公共安全和处置突发公共事件的能力,最大限度地预防和减少突发公共事件及其造成的损害,保障公众的生命财产安全,维护国家安全和社会稳定,促进经济社会全面、协调、可棒丝发展。

事故灾难 主要包括工矿商贸等企业的各类安全事故,交通运输事故,公共设施和设备事故,环境污染和生态破坏事件等。

科技支撑 要开展公共安全领域的科学研究,加大公共安全监测、预测、预警、预防 和应急处置技术研发的投入,改进技术装备,建立健全公共安全应急技术平台,提高我国 公共安全科技水平……

火灾是突发事故中最实出的一种 根据伯克霍夫(Berckhoff)的定义,事故是个人或集体在为实现某种意图而进行的活动过程中,突然发生的、违反人的意志的、迫使活动暂时或永久停止的事件。会义包括以下几个方面。

- (1) 事故是一种发生在人类生产、生活活动中的特殊事件,人类的任何生产,生活活动过程中都可能发生事故。
 - (2) 事故是一种突然发生的、出平人们意料的意外事件
 - (3) 事故是一种迫使正在进行的生产、生活活动暂时或永久停止的事件。

为了减少事故造成的危害。有必要对智能建筑中的各项设备进行集成。以满足需要利用先进的思想和方法实现建筑智能化系统的集成,使集成系统的"智能"水平得到显著提高 但目前关于系统集成的研究仅集中于信息技术 IT 領域,实现信息的跨系统访问,即 較低层次的信息共享, 还不能完全达到目标要求 系统既要强调数据的存储, 又必须重视信息的有效利用。在解决涉及全局的突发事件上, 现在大多数系统仅能做到简单的自动化而非智能化, 缺乏学习和推理等智能特性 基于智能建筑的目标和智能的内涵, 智能建筑 集成系统应考虑以数据库作为知识源,辅助实现系统联动、协调、优化等目标, 为人们解决交复事件提供设备运行的决策支持 在智能建筑从控制发展到管理的今天, 试图实现高层次的智能建筑盛行已成为必然

2. 智能建筑与绿色建筑的关系

建筑无论在国内外,都可视作一种商品,而"绿色"则存在一个简单概括的标准,这个简单的标准包含了6条: 是满足国际标准,如《保护臭氧层国际公约》《蒙特利尔协议书》等公约; 是可回收的、可再生的; 是能够改善区域环境的; 四是能够改善居室内环境的,如空气污染、噪声污染等。 五是保护人类健康的,可以防辐射、防致癌的物质等;



六是提高资源与能源利用。满足了其中任何一占、同时又不讳反其中别的多数、就可以称 为"绿色"的。在建筑领域, 要达到"绿色建筑"的具体条款, 的确还有很长的路要走, 不仅是我们中国, 世界各国和地区要达到这个标准, 都不是短期内可以做到的。在可持续 发展的意义上说,建筑的全寿命周期概念是个非常重要的概念,从设计开始一直到最后, 甚至包括房屋倒塌以后房屋本身废弃材料的处理以及对环境的二次污染,建筑材料的制造、 运输过程中是否有有害气体的散发等,所有这些过程都应该计入全寿命周期内容。

我国新颁布的"绿色建筑评价标准"指出,"绿色建筑是指在建筑的全寿命周期内,最 大腿度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境和减少污染,为人们提供健康、 适用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑"。

"绿色建筑是将可持续发展理念引入建筑领域的结果,将成为未来建筑的主导趋势。目 前,世界各国普遍重视绿色建筑的研究,许多国家和组织都在绿色建筑方面制定了相关政 策和评价体系,有的已着手研究编制可持续建筑标准。由于世界各国经济发展水平、地理 位置和人均资源等条件不同,对绿色建筑的研究与理解也存在差异。"

实际上,智能建筑本身的发展,以及它经过的历程,也是朝着绿色建筑的方向在发展, 只是在国内有时把智能建筑定义在狭义的弱电系统与建筑的结合上。那么, 智能建筑就是 · 个实现绿色建筑总目标的手段或是工具、是功能性的。实际上、智能建筑的应用目标包 括的 6 个方面, 也是与绿色建筑的应用目标完全相吻合的。要完成绿色建筑的总目标, 必 须要辅之以智能建筑相关的功能,特别是有关的计算机技术、自动控制、建筑设备等楼宇 控制(Building Automation)相关的技术。没有相关的技术,绿色建筑的许多功能就完成不了。 总之,这是两个高度相关的概念,智能建筑是绿色建筑的技术支撑,绿色建筑是智能建筑 的目标。按照我国现有制定的智能建筑标准(智能建筑工程质量验收规范),智能建筑包括 下列7个系统。

- (1) 通信网络系统。本系统应包括通信系统、卫星数字电视及有线电视系统、公共广 播及紧急广播系统等各子系统及相关设施。其中通信系统包括电话交换系统、会议电视系 统 及接 入 网 设 各。
 - (2) 信息网络系统。信息网络系统应包括计算机网络、应用软件及网络安全等。
- (3) 建筑设备监控系统。建筑设备监控系统用于对智能建筑内各类机电设备进行监测、 控制及自动化管理。达到安全、可靠、节能和集中管理的目的。建筑设备监控系统的监控 范围为空调与通风系统、变配电系统、公共照明系统、给排水系统、热源和热交换系统、 冷冻和冷却水系统、电梯和自动扶梯系统。
 - (4) 火灾自动报警及消防联动系统。
- (5) 安全防范系统。安全防范系统的范围应包括视频安防监控系统、入侵根警系统, 出入口控制(门禁)系统、巡更管理系统、停车场(库)管理系统等各子系统。
 - (6) 综合布线系统。
- (7) 智能化系统集成。系统集成检测验收的重点应为系统的集成功能、各子系统之间 的协调控制能力、信息共享和综合管理能力、运行管理与系统维护的可实施性、使用安全 性和方便性等要素。



4 特别提示

2005年,北京"首届国际智能与绿色建筑技术研讨会"提出了"智能与绿色建筑"的 概念 把智能建筑与绿色建筑作为统一体,成为一个新概念,将智能建筑原来偏重于弱电控制系统的旧观念,提高到新的高度。

- (1)"智能与绿色建筑"是一个有机的整体概念,这一概念应贯穿于建筑物的规划、设计、建造、使用以及维护的全过程、覆盖建筑物的整个生命周期
- (2) "智能与綠色建筑" 注重与周边资源的和谐、包括对日光利用、空气流通、景观环境等的综合考虑,为居住者提供一个各方面俱佳的生活空间,并对周边环境产生长期的积极影响
- (3)"智能与綠色建筑"是綜合运用建筑智能化技术达到生态健康的生活理念。其內容包括:綠色建材、建筑设施、建筑智能化系統、智能化家居及小区管理系统、建筑和交通监控管理系统、建筑环保、管理和辅助决策系统
- (4)"智能与绿色建筑"关注建筑材料与能源的合理利用与节约、因而在建筑的设计阶段、对建筑物建造与使用过程的每个环节都应进行认真的筹划、以求最大限度地节约能源与材料
- (5)"智能与绿色建筑"将环保技术、节能技术、信息技术、网络技术渗透到居民生活的各个方面,即用最新的理念、最先进的技术和最快的速度去解决生态节能与居住舒适度问题
- (6) "智能与綠色建筑"不仅仅是遮风避雨,享受环境和振作精神的场所,也不光是与周围环境相隔绝的包厢,而是成为环境的一部分,与之共同构成和谐的有机系统,不管是城市还是郊区都是如此

6.3.2 绿色建筑评价标准



【标准规范】

1. 居住建筑评价标准

(1) 节地与室外环境。节地与室外环境评价标准见表 6-15。

表 6-15 节地与室外环境评价标准

		采用"智能建筑标准"中的手段,才能达到		
序号	内 春	鲁注	序号	内 容
4.1.2	居住区建筑布局保证室内外的日照 环境、采光和通风的要求, 满足《城 市居住区规划设计规范(2016 年版)》 (GB 50180—1993)中有关住宅建筑 日照标准的要求		1	智能化系统集成 系统集成检测验收的重点应为系统的集成 功能,各于系统之间的协调控制能力,信息 其享和综合管理能力,这名管理与系统维护 的可实施性,使用安全性和方便性等要素

"绿色建筑评价标准"中相关标准				用"智能建筑标准"中的手段,才能达到 绿色建筑相关标准
序号	内 弈	益北	18号	内 客
4.1.6	住区公共服务设施按规划配建,采用 综合建筑并与周边地区共享			有关绿色建筑的外部环境对室内环境的影响,尽管与建筑设计有根本的关系,但如
4.1.8	住区环境噪声符合《声环境质量标准》(GB 3096 2008)的规定	·般项	2	何采用上动式或被动式应用,包括日照、 噪声、风环境等,都与智能建筑的设备, 特别是新研究或新从国外引进的设备有很 大的关系
4.1.9	居住区室外日平均热岛强度不高于 1.5℃	·般项	3	与智能建筑目的中的使用者舒适性、再组 织的灵活性、工程适应性、节约能源、环 境保护的可持续性相关
4.1.10	居住区风环境有利于冬季行走舒适 及过渡季、夏季的自然通风			0.20
4.1.12	选址和居住区出入口的设置应方便 居民充分利用公共交通网络,到达公 共交通站点的步行距离不超过 500m			
4.1.14	开发利用地下空间,如利用地下空间作 公共活动场所、停车库或储藏室等用途	优选项		

(2) 节能与能源利用。节能与能源利用评价标准见表 6-16。



表 6-16 节能与能源利用评价标准表

【标准规范】

6	· 操色建筑评价标准》中相关标准	平	用"智能建筑标准"中的手段,才能达到 绿色建筑相关。	
序号	内墨	卷注	JR 47	内
4.2.2	当设计采用集中空调(含户式中央空调)系统时,所选用的冷水机组或单元式空调机组的性能系数(能效比)应符合国家标准(公共建筑节能设计标准)(GB 50189—2015)中的有关规定值设置集中采暖和(或)集中空调系统的住宅、采取室温调等和热量计		1	建筑设备监控系统: 建筑设备监控系统用于对智能建筑内各类 机电设备进行监测,控制及自动化管理,达 到安全、可靠、节能和集中管理的目的,建 筑设备监控系统的监控范围为空调与通风 系统,变配电系统、公共照明系统、给排水 系统、热源和热交换系统、冷冻和冷却水系
4.2.3	量设施			统、电梯和自动扶梯系统
4.2.4	利用场地自然条件,合理设计建筑 体形、朝向、楼距和窗墙面积比, 采取有效的遮阳措施,充分利用自 然通风和天然采光	-般项	2	信息网络系统: 信息网络系统应包括计算机网路、应用软件 及网络安全等

绿色建筑评价标准"中相关标准			采	续表 用"智能建筑标准"中的手段,才能达到 读色建筑相关标准
序号	四 異	番注	序号	PA 额
4.2.5	选用效率高的用能设备,如选用高效节能电梯、集中平暖系统热水循 环水泵的耗电输热比、集中空域系统 统风机单位风量耗功率和冷热水 输送能效比符合《公共建筑节能设 计标准》(GB 50189—2015)的规定	・般项	3	综合布线系统
4.2.6	当设计采用集中空调(含户式中央空调)系统时,所选用的冷水机组或单元式空调机组的性能系数(能效比)比国家标准(公共建筑节能设计标准)(GB 50189—2015)中的有关规定值高一个等级公共场所和部位的照明采用高效光源和高效灯具,并采取其他节能控制措施,其照明功率密度符合《建筑照明设计标准》(GB 50034—2013)中的规定。在自然采光的区域设定时或光电控制的照明系统。	• 般项	4	智能化系统集成: 系统集成检测验收的重点应为系统的集成功能、各子系统之间的玻璃排除化力。有是 共享和综合管理能力、运行管理与系统维护的可实施性,使用安全性和方便性等要素 空调系统是绿色建筑中 节能的关键,环境的关键,对定则设备和其他智能化设备的充分结合。) 能达到级色建筑有关的标准;且与智能建设
4.2.8	设置集中采暖和(或)集中空调系统的住宅,采用能量回收系统(装置)			目的中的使用者舒适性、再组织的灵活性 工程适应性、节约能源、环境保护的可持约 性,大幅提高处理突发事件的能力相关
4.2.9	根据当地气候和自然资源条件,充分利用太阳能、地热能等可再生能源。可再生能源的使用占建筑总能耗的比例大于5%			
4.2.10	采暖和(或)空调能耗不高于国家 和地方建筑节能标准规定值的 80%			
4.2.11	可再生能源的使用占建筑总能耗 的比例大于10%	优选项		

(3) 节水与水资源利用。节水与水资源利用评价标准见表 6-17。



表 6-17 节水与水资源利用评价标准

	ar jilm <u>da, saha dala sung ta</u> , James di Sera, dan dan da, dipuntah	采用"智能建筑标准"中的手段,才能达到		
序号	内 杏	香注	序号	内 容
4.3.2	设置完善的供水系统, 水质达到国 家或行业规定的标准, 且水压稳定、 可靠			建筑改备监控系统: 建筑设备监控系统用于对智能建筑内各类 机电设备进行监测,控制及自动化管理,达
4.3.3	设置完善的排水系统,采用建筑自身优质杂排水、杂排水作为再生水源的,实施分质排水	控制项	1	到安全、可靠、节能和集中管理的目的。 建筑设备监控系统的监控范围为空调与通 风系统,变配电系统、公共照明系统、给排
4.3.4	用水分户、分用途设置计量仪表,			水系统、热源和热交换系统、冷冻和冷却水 系统、电梯和自动扶梯系统
	并采取有效措施避免管网漏损			信息网络系统:
4.3.5	采用节水器具和设备, 节水率不低 F8%		2	信息网络系统应包括计算机网络、应用软件 及网络安全等
	在缺水地区,优先利用附近集中再		3	火灾自动报警及消防联动系统
4.3.9	生水厂的再生水;附近没有集中再 生水厂时,通过技术经济比较,合 理选择其他再生水水源和处理技术			智能化系统集成: 系统集成检测验收的重点应为系统的集成
4.3.10	在降雨量大的缺水地区,通过技术 经济比较,合理确定雨水处理及利 用方案	·殷项	4	功能,各子系统之间的协调控制,能力,信息 共享和综合管理能力,运行管理与系统维护 的可实施性,使用安全性和方便性等要素。 凡与智能建筑目的中的使用者舒适性,工程
4.3.11	使用非传统水源时, 采取用水安全 保障措施, 且不对人体健康与周围 环境产生不良影响	1. V.	,	五,可曾能建筑自的中的使用者对近年,1.程 适应性、节约能源,环境保护的可持续性, 大幅提高处理突发事件的能力相关

(4) 室内环境质量。室内环境质量评价标准见表 6-18。



表 6-18 室内环境质量评价标准

	400		元汉主	【标准规范】		
	"绿色建筑评价标准"中相关标准		采用"智能建筑标准"中的手段,才能达到 绿色建筑相关标准			
序号	内	WIT	序号	(7) 17		
4.5.5	室內空气质量符合《民用建筑工程 室內环境污染控制规范(2013版)》 (GB 50325—2010)中的规定	挖制项		建筑设备监控系统:建筑设备监控系统用于对智能建筑内各类		
4.5.7	围护结构的热工设计符合《民用建筑热工设计规范》(GB 50176—2016)中的规定	bn vZ	1	机电设备进行监测、控制及自动化管理,达到安全、可靠、节能和集中管理的目的。 建筑设备监控系统的监控范围为空调与通 风系统、变配电系统、公共照明系统、给排		
4.5.8	设普通采暖和(或)空调系统(设备) 采暖的住宅,运行时用户可根据需 要对室温进行调控			风系统、交配电系统、公尺照明系统、 招排 水系统、热源和热交换系统、冷冻和冷却水 系统、电梯和自动扶梯系统		

徒邦

	********	1	<u> </u>	明"智能建筑标准"中的手段,才能达到
序号	内 書	商注	保急	内 容
4.5.9	采用可调节外遮阳功能,防止夏季 太阳辐射透过窗户玻璃直接进入 室内		2	信息网络系统: 信息网络系统应包括计算机网络、应用软件 及网络安全等
4.5.10	设置室内空气质量监测装置,利于 住户的健康和保持舒适度	·般项	3	智能化系统集成: 系统集成检测验收的重点应为系统的集成 功能、各子系统之间的协调控制能力、信息 块享相综合管理能力、运行管理与系统维护 的可实施性。使用安全性和方便性等要素。 且与智能建筑目的中的使用者舒适性、再组 织的灵活性、工程适应性、节约能源、环境 保护的可持续性、大幅提高处理突发事件的 能力相关

(5) 运营管理。运营管理评价标准见表 6-19。

表 6-19 运营管理评价标准

	"绿色建筑评价标准"中相关标准		T.	E用"气能建筑标准"中的手段,才能达到 绿色建筑相关标准		
序号	内 署	音注	序号	内 美		
4.6.2	住宅水、电、燃′(, 采暖与(或)空调分户、分类计量与收费		×	建筑设备监控系统: 建筑设备监控系统用于对智能建筑内各类机		
4.6.6	制定并实施施工项目保护环境具体 措施,控制由于施工引起的大气污染、土壤污染、噪声影响、水污染、 光污染以及对场地周边区域的影响	控制项	1	电设备进行温测、控制及自动化管理, 达至 安全、可靠、首能和集中管理的目的: 建筑 设备监控系统的监控范围为空调与通风系统、变配电系统、公共照明系统、给排水系		
	智能化系统定位正确、采用的技术			统、热源和热交换系统,冷冻和冷却水系统、 电梯和自动扶梯系统		
4.6.8	先进实用、系统可扩充性强,能较 长时间的满足应用需求;达到安全 防范子系统、管理与设备监控子系 统与信息网络子系统的基本配置	-般项	2	通信网络系统: 本系统应包括通信系统、卫星数字电视及有 线电视系统、公共广播及紧急广播系统等各 于系统及相关设施。其中通信系统包括电话 交换系统、会议电视系统及接次设备		
4.6.14	设计为改造和更换设备、管道提供便利		3	信息网络系统: 信息网络系统应包括计算机网络、应用软件 及网络安全等		

	"绿色建筑评价标准"中相关标准	1 -	采	E用"智能建筑标准"中的手段,才能达到 绿色建筑相关标准
序号	内容	音注	序号	内 容
	对可生物降解垃圾进行单独收集或		4	火灾自动报警及消动联动系统
4.6.15	设置可生物降解垃圾处理房,垃圾 收集或垃圾处理房设有风道或排 风、冲洗和排水设施,处理过程无 二次污染	优选项	5	安全防范系统: 安全防范系统的范围应包括视频安防监控系统、入侵报警系统、出入口控制(门禁)系统、 巡更管理系统、停车场(库)管理等各子系统
			6	综合布线系统
			7	智能化系统集成: 系统集成传测帧收的重点应为系统的集成功能,各至系统之间的协调控重估力,信息共享和综合管理能力,运行管理与系统推护的可实施性,使用安全性和方便性等要素;且与智能建筑目的中的使用者舒适性、再组织的灵活、工程适应性、节约能源、环境保护的可持续性、工程适应性、节约能源、环境保护的可持续性、大幅提高处理突发事件的能力相关

2. 公共建筑评价标准

(1) 节地与室外环境。节地与室外环境评价标准见表 6-20。

表 6-20 节地与室外环境评价标准

1	THE STREET, STORY		人基	用"智能建筑标准"中的手段,才能达到 《色建筑相关标准		
序号	内容	普注	序号	内容		
5.1.2	建筑场地选址 尤洪火、泥 行	控制项		智能化系统集成: 系统集成检测验收的重点应为系统的集成 功能、各子系统之间的协调控制能力、信		
5.1.3	不对周边居民区及交通道路造成光 污染		1	息共享和综合管理能力、运气管理与系统 维护的可实施性、使用安全性和方便性等 要素 有关绿色公共建筑的外部环境对室内环境		
5.1.4	充分开发利用地下空间作为公共活动 场所、停车库或设备房等		_			
5.1.9	场地内无严重污染中环境的污染源			的影响,尽管建筑设计有根本的关系,但		
5.1.10	场地环境噪声符合《声环境质量标准》 (GB 3096—2008)中的规定	-般项	2	如何采用主动式或被动式影响。包括日照、 噪声、风环境等,都与智能建筑的设备。 特别是新研究或新从国外引进的设备有很 大的关系		
5.1.11	室外风环境利于建筑通风和冬季人员行走舒适		3	且与智能建筑目的中的使用者舒适性、工程适应性、节约能源、环境保护的可持续性、大幅提高处理突发事件的能力相关		

(2) 节地与能源利用。节地与能源利用评价标准见表 6-21。

表 6-21 节地与能源利用评价标准

	《绿色建筑评价标准》中相关标准		.采.	用"智能建筑标准"中的手段,才能达到 绿色建筑相关标准	
序号	阁 零	li il	停 号	M 8	
5.2.1	围护结构热工性能指标符合国家和 地方公共建筑节能标准的有关规定				
5.2.2	空调采暖系统的冷热源机组能效比 符合国家和地方公共建筑节能标准 的有关规定			建筑设备监控系统; 建筑设备监控系统用于对智能建筑内各类	
5.2.3	建筑采暖与空调热源选择,符合《公 共建筑节能设计标准》(GB 50189 —2015)中的第 5.4.2 条的规定	控制项	1	机电设备进行监测、控制及自动化管理,达 到安全、可靠、节能和集中管理的目的;建 筑设备监控系统的监控范围为空调与通风	
5.2.4	照明采用高效光源和高效照明工具 或采取其他节能控制措施	ž,	系统、变配电系统、公共照明系统、给排水 系统、热源和热交换系统、冷冻和冷却水系		
5.2.5	对于新建、改建和扩建的公共建筑, 应根据用户等情况,对冷热源、输 配系统和照明等各部分能耗进行独 立分项计量		Y	统、电梯和自动扶梯系统	
5.2.6	建筑总平面设计有利于冬季日照并 避开上导风向, 夏季则利于自然通 风。建筑主朝向选择本地区最佳朝 向或接近最佳朝向		2	智能化系统集成: 系统集成检测验收的重点应为系统的集成 功能、各户系统之间的协调控制能力、信息	
5.2.7	建筑外窗可开启面积不小于外窗总面积的 30%,透明幕墙具有可开启部分或设有通风换气装置			共享和综合管理能力、运行管理与系统维的可实施性、使用安全性和方便性等要素 与智能建筑目的中的使用者舒适性、再组织	
5.2.9	采用适宜的蓄冷蓄热技术和新型节 能的空气调节方式			的灵活性、工程适应性、节约能量、环境保 护的可持续性、大幅提高处理突发事件的能	
5.2.10	采取切实有效的热回收措施,设计为 可以直接利用室外新风的空调系统	-殷项		力相关	
5.2.11	通风空调系统在建筑部分负荷和部 分空间利用时不降低能源利用效率				
5.2.12	风机的单位风量耗功率和冷热水系统的输送能效比符合《公共建筑节能设计标准》(GB 50189—2015)中的第5.3.26、5.3.27条的规定				
5.2.13	建筑需蒸汽或生活热水选用余热或 废热利用等方式提供				
5.2.14	采用太阳能、地热、风能等可再生 能源利用技术				

"绿色建筑评价标准"中相关标"			采用"智能	"智能建筑标准"中的手段,才能达 绿色建筑相关标准		
序号	内 春	青注	序号			
5.2.15	楼宇自控系统功能完善, 各子系统 均能实现自动检测与控制					
5.2.17	对于直接以天然气作为 · 次能源的 系统, 采用分布式热电冷联供技术 和回收燃气余热的燃气热泵技术, 提高能源的综合利用率					
5.2.18	可再生能源的使用占建筑总能耗的 比例太于 5%	优选项				
5.2.19	建筑冷热源、空调输配系统、照明、 生活热水等部分能耗实现分项和分 区域计量					

(3) 节水与水资源利用。节水与水资源利用评价标准见表 6-22。

表 6-22 节水与水资源利用评价标准

	"绿色建筑评价标准"中相关标准	7 71	采户	用"智能建筑标准"中的手段,才能达到 绿色建筑相关标准	
序号	内事	書注	序号	内 睿	
5.3.1	根据建筑类型、气候条件、用水习惯等 制定水系统规划方案,统筹考虑传统与 非传统水源的利用,降低用水定额	-3		建筑设备监控系统: 建筑设备监控系统: 建筑设备监控系统用于对智能建筑内各	
5.3.2	设置完善的供水系统,水质达到国家或 行业规定的标准,且水压稳定、可靠	控制项	1	类机电设备进行监测、控制及自动化管 理,达到安全、可靠、节能和集中管理的	
5.3.4	管材、管道附件及设备等供水设施的选 取和运行不应对供水造成二次污染,并 应设置用水计量仪表和采取有效措施 防止和检测管道渗漏	控制项		目的 建筑设备监控系统的监控范围为空调与 通风系统、变配电系统、公共照明系统、 给排水系统、热源和热交换系统、冷冻和	
5.3.5	合理选用节水器具, 节水率大于25%。 建筑中非传统水源利用率在60%以上			冷却水系统、电梯和自动扶梯系统	
5.3.6	在降雨量大的缺水地区,选择经济、适用的雨水处理及利用方案			智能化系统集成: 系统集成检测验收的重点应为系统的集	
5.3.7	在缺水地区, 优先利用附近集中再生水厂的再生水; 附近没有集中再生水厂时, 通过技术经济比较, 合理选择其他再生水水源和处理技术	一般项	2	成功能、各子系统之间的协调控制能力。 信息共享和综合管理能力、运行管理与系 统维护的可实施性。使用安全性和方便性 等要素;且与智能建筑目的中的使用者舍	
5.3.8	采用微灌、渗灌、低压管灌等绿化灌溉方式,与传统方法相比节水率不低于10%			适性,再组织的灵活性、工程适应性、节约能源、环境保护的可持续性的能力相关	
5.3.9	优先采用雨水和再生水进行灌溉	一般项			
5.3.10	游泳池选用技术先进的循环水处理设备,采用节水和卫生的换水方式				



徒邦

"绿色建筑评价标准"中相关标准			采用"智能	建筑标准"中 绿色建筑相	才能达到
序号	内容	音注	序号		
5.3.11	景观用水采用非传统水源,且用水安全	-殷项			
5.3.12	沿海缺水地区直接利用海水冲厕,且保证用水安全	优选项			
5.3.13	办公楼、商场类建筑				



(4) 室内环境质量。室内环境质量评价标准见表 6-23。

表 6-23 室内环境质量评价标准

	"怎么多传说从仁业"。 由妇子仁性		采	用"智能建筑标准"中的手段,才能达到
序号	円 賽	音注	150	内 容
5.5.1	术用中央军畸形建筑, 房间,内的温度、 湿度、风速等参数满足设计要求			建筑设备监控系统:
5.5.2	围护结构内部或表面无冷凝现象			建筑设备监控系统用于对智能建筑内各类
5.5.3	采用中央空调的建筑,新风量符合标准要求,且新风采气口的设置能保证所吸入的空气为室外新鲜空气		1	机电设备进行监测、控制及自动化管理, 达到安全、可靠、节能和集中管理的目的; 建筑设备监控系统的监控范围为空调与通
5.5.4	室內空(中污染物浓度满足《民用建筑室 內环境污染控制规范(2013 版)》(GB 50325 一2010)中的规定要求。空调系统的过滤 器、风机盘管和风道等定期清洗或更换	搾制项	5	风系统、变配电系统、公共照明系统、给(下)(接上)排水系统、热源和热交换系统、 冷冻和冷却水系统、电梯和自动扶梯系统
5.5.5	建筑外窗的隔声性能达到《建筑外窗空 气声隔声性能分级及其检测方法》(GB 8485—2008)中Ⅱ级以上要求。		2	信息网络系统: 信息网络系统应包括计算机网络、应用软件及网络安全等
5.5.6	建筑室内采光满足《建筑采光设计标准》 (GB/T 50033—2013)中的要求		3	火灾自动报警及消防联动系统
5.5.7	建筑室内照明质量满足《建筑照明设计标准》(GB 50034-2013)中的一级要求		4	综合布线系统
5.5.8	单独处理的新风直接入室,避免 次污染			智能化系统集成:
5.5.9	合理进行建筑平面布局和空间功能安排,减少相邻空间的噪声干扰以及外界噪声对室内的影响			系统集成检测验收的重点为系统的集成功能,各手系统之间的协调控制能力,信息 共享和综合管理能力、运行管理与系统维
5.5.10	室内背景噪声满足《民用建筑隔声设计 规范》(GB 50118—2010)中室内允许噪 声标准 ·级要求	般项	5	护的可实施性,使用安全性和方便性等要素与建筑设备监控系统、信息网络系统、智能化系统集成相关,且与智能建筑目的
5.5.11	宾馆类建筑围护结构构件空气隔声性能 (Rw)满足《民用建筑隔声设计规范》(GB 50 118—2010)中的 :级要求			中的使用者舒适性、再组织的灵活性、工程适应性、节约能源、环境保护的可持续性、大幅提高处理突发事件的能力相关

"绿色建筑评价标准"中相关标准			妥用"智能建筑标准"中的手段。才能达到 绿色建筑相关标准			
序号	内容	青注	序号			
5.5.12	建筑设计和构造设计设有采取诱导气 流、促进自然通风的措施					
5.5.13	建筑 75%以上的空间可根据需要实现自 然采光					
5.5.14	建筑入口和主要活动空间有无障碍设计					
5.5.15	采用中央空调的建筑,采用经济有效的 空气净化技术和系统					
5.5.16	采用可调节遮阳设施,调控夏季太阳辐射	优		3.0		
5.5.17	设置室内空气质量监测系统, 保证健康 舒适的室内环境	选项				
5.5.18	建筑 75%以上的空间可实现自然通风					

(5) 全生命周期综合性能。全生命周期综合性能评价标准见表 6-24。

表 6-24 全生命周期综合性能评价标准

	"绿色建筑评价标准"中相关标准	ZX	.507	·用"智能建筑标准"中的手段。才能达 设色建筑相关标准	
序号	图 聲	學達	准号	四 春	争往
5.6.2	采取具体措施有效控制施工引起的 大气、土壤、噪声、水、光污染以及 对场地周边区域的影响	控制项	1.	建筑设备监控系统: 建筑设备监控系统用于对智能建筑内 各类机电设备进行监测、控制及自动	
5.6.5	建筑设备管道更换方便,空间可灵活 划分,调整方便		1	化管理,达到安全、可靠、节能和集中管理的目的。	
5.6.6	施工、运营过程具有节约资源计划 书,采取具体措施有效实现施工及运 行过程中的节能、节水、节材	般項	·	建筑设备监控系统的监控范围为空调 与通风系统、变配电系统、公共照明 系统、给排水系统、热源和热交换系 统、冷冻和冷却水系统、电梯和自动	
5.6.7	物业管理部门或公司通过 ISO 14001 环境标准认证			统、存储和存却小系统、电体和自动 扶梯系统 通信网络系统:	
5.6.9	采用智能化手段进行系统运行状况 的数据计量		2	本系统应包括通信系统、卫星数字电 视及有线电视系统、公共广播及紧急	
5.6.10	结合模拟手段进行建筑规划设计优化			广播系统等各子系统及相关设施,其 中通信系统包括电话交换系统、会议 电视系统及接入网设备	`
5.6.11	从建筑全生命周期角度,通过技术经 济分析确定各项技术、设备、材料的 选用	优选项	3	信息网络系统: 信息网络系统应包括计算机网络、应 用软件及网络安全等	
	选用		4	火灾自动报警及消防联动系统	

给非

5	"绿色建筑评价标准"中相关标准	妥用"智能建筑标准"中的手段,才能达到 绿色建筑相关标准				
序号	M &	者注	序号	内 容	备注	
5.6.12	具有并实施 节能管理与激励机制,管理业绩与节约资源、提高经济效益挂钩		5	安全劢范系统: 安全防范系统的范围应包括视频安防 监控系统、入侵报警系统、出入口控 制(]]禁)系统、巡更管理系统、停车		
			6	场(库)管理等各子系统 综合布线系统		
5.6.13	对水、电、天然气、热等实行独立计量收费,取代按面积收费的方式	优选项	7	智能化系统集成: 系统集成检测验收的重点应为系统的 集成功能、各了系统之间的协调控制。 能力、信息共享和综合管理能力、运 行管理与系统维护的可实施性、使用建 安全件和分便性等要素;且与智能型 筑目的中的使用者舒适性、再组织的 灵活性、工程适应性、节约能源、环 境保护的可持续性、大幅提高处理突 发事件的能力相关		

6.3.3 工程资料管理软件的智能化

1. 基于 Internet 的信息平台特点和体系结构

- (1) 基于 Internet 的信息平台特点。
- ① 以 Extranet 作为信息交换工作的平台,其基本形式是项目主题网,它具有较高的安全性。
- ② 采用 100% B/S(浏览器/服务器)结构,用户在客户端只需安装 1 个浏览器即可。
- ③ 与其他相关信息系统不同,基于 Internet 的项目信息平台的主要功能是项目信息的 共享和传递,而不是对项目信息进行加工、处理。
- ④ 基于 Internet 的项目信息平台不是一个简单的文档系统,通过信息的集中管理和门户设置为项目参建各方提供一个开放、协调、个性化的信息沟通环境。
- (2) 基于 Internet 的项目信息平台的体系结构。一个完整的基于 Internet 的项目信息平台的体系结构包括 8 层,如图 6.22 所示。
- ① 基于 Internet 技术标准的信息集成平台。是项目信息平台实施的关键,它必须对来 自于不同信息源的各种异构信息进行有效集成。
- ② 项目信息分类层。在项目集成平台基础上,对信息进行有效的分类编目,以便于项目参与各方的信息利用。



图 6.22 项目信息平台的体系结构

2. 基于 Internet 的项目信息平台的功能

基于 Internet 的项目信息平台的功能分为基本功能和拓展功能 2 个层次。其中,基本功 能是大部分商业化的基于 Internet 的项目信息平台和应用服务所具备的功能,它可以看成基 于 Internet 的项目信息平台的核心功能。而拓展功能则是部分应用服务商在其应用服务平台 上所提供的服务,这些服务代表了基于 Internet 的项目信息平台的未来发展趋势。基于 Internet 的项目信息平台的功能框架如图 6.23 所示。




图 6.23 基于 Internet 的项目信息平台的功能结构

- (1) 基本功能。基于 Internet 的项目信息平台的基本功能如下。
- ① 通知与桌面管理。包括变更通知、公告发布、项目团队通讯录及书签管理等功能。 其中,变更通知是指当某一项目参建单位有关的项目信息发生改变时,系统用 E-mail 进行 提醒和通知,它是基于Internet 的项目信息平台应具备的一项基本功能。
- ② 日历和任务管理。日历和任务管理是一些简单的项目进度控制工作功能,包括共享项目进度计划的日历管理和任务管理。
- ③ 文档管理。文档管理是基于 Internet 的项目信息平台一项非常重要的功能,它是在项目的站点上提供标准的文档目录结构,项目参建各方可以根据需求进行定制。项目参建各方可以完成文档(包括工程照片、合同、技术说明、图纸、报告、会议纪要、往来函件等)的查询、版本控制、文档上传和下载、在线审阅等工作,其中在线审阅的功能是基于 Internet 的项目信息平台的 ·项重要功能,可支持多种文档格式,如 CAD、Word、Excel、PowerPoint等,项目参建各方可以在同一个文件上进行标记、圈阅和讨论,这样可以大大提高项目组织的工作效率。
- ④ 项目通信与协同工作。在基于 Internet 的项目信息平台为用户定制的主页上,项目 参建各方可以通过基于 Internet 的项目信息平台中的内置邮件通信功能进行项目沟通,所有 的通信记录在站点上都有详细的记录,从而便于争议的处理。另外,还可以就某一个主题 进行在线讨论,讨论的每一个细节都会被记录下来,并分发给有关各方。项目信息门户系 统的通信与讨论都可以获得大量随手可及的信息作为支持。
- ⑤ 工作流管理。工作流管理是对项目工作流程的支持,包括在线完成信息请求、工程 变更、提交谱求及原始记录审批等,并对处理情况进行跟踪统计。
- ⑥ 网站管理与报告。包括用户管理、使用报告生成等功能,其中很重要的一项功能就 是要对项目参建各方的信息沟通(包括文档传递、邮件信息、会议等)及成员在网站上的活 动进行详细记录。数据的安全管理也是一项十分重要的功能,它包括数据的离线备份、加 密等。
- (2) 拓展功能。基于 Internet 的项目信息平台的拓展功能包括多媒体的信息交互、在线项目管理、集成电子商务等功能,如视频会议的功能、进度计划和投资计划的网上发布、电子采购、电子招标等功能,这些将是基于 Internet 的项目信息平台的主要发展趋势。

推荐阅读资料



- 1.《入侵报警系统工程设计规范》(GB 50349-2007)
- 2. 《视频安防益控数字录像设备》(GB 20815 2016)
- 3. 《视频安防监控系统技术要求》(GA/T 367 2001)
- 4. 《视频安防监控系统工程设计规范》(GB 50395 2015) 5, 《智能建筑设计标准》(GB 50314--2015)

任务训练

分析智能建筑工程相应检测记录,对照《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339 2013)相关条文内容,填写程频安防监控子系统的检测记录表(表 6-25~表 6-28).

表 6-25 智能建筑工程分项工程质量检测记录表

编号:

单位	江(子单位) 口程名称	产分部 L程	
分项Ⅱ程名称		验收部位	
	施工单位	项目经理	
施工:	执行标准名称及编号	•	
分包	1单位	分包项目经理	
检	则项目及抽检数量	检测记录	备注
1	单机测试	符合设计及说明书要求	
检测意见	1:		
监理工程	圣师签字:	シン	[构负责人签字:
日期:	年 月 日	, /トン/ 日期:	(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 [1]

表 6-26 子系统检测记录

					編号	:
系统名称	f	系统名称	序号		检测部位	
施工单位			- /-		项目经理	
执行标准 名称及编号	100					
分包单位			分包项目经理			
	55 64 1A 201 da 650	A million the Advisor else	系统检测评定	检测	月结果	Ar 33e
	系统检测内容 检测	检测规范的规定	idak	合格	不合格	备注
	探测器设置	探測器盲区	无盲区	√		
主控项目						
-般项目						
强制性条文						
检测机构的构	金测结论 :					
检测负责人:					年	月
	1. 植尾松驯时虫	TI 65 64.835				

表 6-27 系统(分部工程)检测汇总表

T 1.4. 6. 52	the first and of the
经签名标,	安全防范系统

施工单位:

编号:

序 B 中京五日期		6.1 0%	检测	.结果
厅写	内谷及	可認	合格	不合格
1	规范 8.3.5	合格	V	
2	规范 8.3.6	合格	٧	
3	规范 8.3.7	合格	√	
4	规范 8.3.8	合格	√	
5	规范 8.3.9	合格	√	
L构项目负责	人签名:		检查结论	
		ŧ	企测 日期:	羊 月 日
	序号 1 2 3 4 5	1 規范 8.3.5 2 規范 8.3.6 3 規范 8.3.7 4 規范 8.3.8	1 規范 8.3.5 合格 2 規范 8.3.6 合格 3 規范 8.3.7 合格 4 規范 8.3.8 合格 5 規范 8.3.9 合格	PF

表 6-28 资料审查

系统女称, 物能建筑分部下程

编号,

		审查结果						
序号	审查内容	Ä	整性	准	确性	备注		
		完整(或有)	不完整(或无)	合格	不合格			
1	工程合同技术文件	V		V				
2	设计更改审核	√		√				
3	L程实施及质量控制检验报告及记录	V		√				
4	系统检测报告及记录	√		V				
5	系统的技术、操作和维护手册	V		√				
6	竣工图及竣工文件	V		√				
7	重大施工事故报告及处理	√		√				
8	监理文件	1		√				


审查结果统计:

审查结论:

审查人员签名:

日期: 年 月 日

- 注: (1) 在审查结果栏,按实际情况在相应的空格内打"√"。
 - (2) 存在的问题, 在备注栏内注明。
 - (3) 根据行业要求,由验收机构负责填写。验收组可增加竣工验收要求的文件,填在空格内。



能力拓展

- 1. 以章前工程背景为例, 画出信息化管理工程资料的卷宗结构图
- 2. 与小组成员合作完成一套小型工程资料的填写与整理

表 6-29 香港××筑公司对"质量、安全、环保、保安"记录的时效性规定

项目	序号	文 件 内 容	保存期限	负责人	
	1	质量交底卡、二次样板、项目质量管理计划			
	2	施工、物料之检验、可追溯性记录及未验材料 紧急使用记录			
质	3	检验、试验及量测设备之校准记录	业主发出保养证书为止	项目保存或项 目解散后转公 可保存	
量	4	"未校准之量测设备"的有效性测试记录	业上及出床亦证 17万正		
记 录	5	不符合品报告、有关之改正措施、业主做出让 步及接收等记录		rd beat.	
	6	项目质量保证计划及其他记录			
	7	工程完工(竣工)证书 保养证书	永久保存	公司保存	

给非

项目	序号	文 件 内 容	保存期限	负责人	
	8	员工培训记录	保存至员工离职	公司保存	
质量	9	内部审核计划、报告及有关之改正计划等记录	6年	公司保存	
	10	管理体系文件	保存最新版本		
记录	11	工作指示	6年	项目或转公司 保存	
	12	其他	由单位负责人规定		
	1	环保管理体系文件	保存最新版本		
	2	环保内审记录	6年	公司保存	
	3	环保培训记录	保存至员工高职	公司保存	
环	4	外界环保信息(包括环保投诉)	6年	项目或转公司 保存	
保	5	有关环境因素及其影响的资料			
記	6	许可证 / 牌照			
水	7	有关紧急准备与应变措施的资料及记录(包括 事故报告)	项目完成最后结算后3年	项目保存或转	
	8	环保检验及试验工作记录		公司保存	
	9	环保仪器的维修及调校记录			
	10	不符合情况报告、改正及预防措施			
	ı	安全及健康管理体系文件	保存最新版本		
	2	· 全管理委员会文件及会议纪要 6年		项目及公司 5 别保存	
	3	条例及其他要求	废旧版本永久保存	加加州	
	4	工伤意外、违例检控记录	6年	项目或转公司 保存	
	5	安全培训记录——公司直属员工、项目工人	保存至员工离职	项目或转公司 人力资源部	
安全	6	检验证书	项目完成最后结算后3年	项目或转公司 保存	
记	7	操作证书			
录	8	检验表格			
	9	安全会议记录			
	10	安全计划			
	11	不符合安全报告、有关改正措施、分包商不安 全记录			
	12	内部安全审核计划、报告及有关之改正计划等 记录	6年	公司保存	
	13	其他	由单位负责人规定	有关负责人	

项目	序号	文 件 内 容	保存期限	负责人
	1	项目保安管理程序	废旧版本无须保存	项目及公司
ter	2	项目保安管理人员牌照及记录	保存至员工离职	项目转质安部
保安、	3	保安设施及服务合同	项目完成最后,结算后 3 年	项目及公司
记束	4	条例及其他要求	永久保存	公司
×	5	违例检控记录及来往文件	6年	项目及公司
	6	项目保安管理文件	项目完成最后结算后3年	项目转公司

4. 对应章前学习要求,填写学习效果自我检测记录表

学习效果自我检测记录表

层次						
领域	di-		A CALL	-		
理论认知	了解	返用		综合		
岗位技能	模仿	胶洲		创造		
职业情感	激情	心境		热情		

5. 学习过程中,不仅要注重沟通表达能力训练,团队合作学习,更要加强个人工程实 践经验的积累 伴随着理论知识学习,自觉及时记录课后实践将促进职业能力的提升

课后实践记录表

实践分项	时间	段	实践要点	见证人及联络方式
C地考察			工程名称、工程所在地	
沟通能力训练			沟通对象、沟通内容、沟通效果	
内业资料管理			收集、分类、整理、立卷、归档	
小组合作学习			分工负责情况及合作成效	
实践中遇到的问题			视具体情况填写,着眼于发现问题、 分析问题及解决问题	
其他				

北京大学出版社高职高专土建系列教材书目

序号	书 名	书号	编著者	定价	出版时间	配套情况
1	₩ 建筑构造(第二版)	"五联网+" 创新规划表+ 978-7-301-26480-5	肖芳	42.00	2016.1	ppt/APP/二维码
2	●建筑装饰构造(第二版)	978-7-301-26572-7	赵志文等	39.50	2016.1	ppt/二维码
3	●建筑装即构造(第二版) ●建筑工程板论	978-7-301-26572-7	起志义等 申淑荣等	40.00	2015.1	
						ppt/二维码
5	●市政管道工程施工	978-7-301-26629-8 978-7-301-26632-8	雷彩虹	46.00	2016.5 2016.5	ppt/二维码
	●市政道路工程施工		张雪丽			ppt/二维码
6	●建筑三维平法结构图集(第二版)	978-7-301-29049-1	傅华夏	68.00	2018.1	APP
7	少建筑三维平法结构识图教程(第二版)	978-7-301-29121-4	傅华夏	68.00	2018.1	APP/ppt
8	●建筑工程制图与识图(第2版)	978-7-301-24408-1	白丽红	34.00	2016.8	APP/二维码
9	≥建筑设备基础知识与识图(第2版)	978-7-301-24586-6	靳慧征等	47.00	2016.8	二维码
10	●建筑结构基础与识图	978-7-301-27215-2	周晖	58.00	2016.9	APP/二维码
11	●建筑构造与识图	978-7-301-27838-3	孙伟	40.00	2017.1	APP/二维码
12	建筑工程施工技术(第三版)	978-7-301-27675-4	钟汉华等	66.00	2016.11	APP/二维码
13	工程建设监理案例分析教程(第二版)	978-7-301-27864-2	刘志麟等	50.00	2017.1	ppt/二维码
14	建筑工程质量与安全管理(第二版)	978-7-301-27219-0	郑伟广	55.00	2016.8	ppt/二维码
15	●建筑工程计量与计价——透过案例学 造价(第2版)	978-7-301-23852-3	张 强	59.00	2014.4	ppt/二维码
16	●城乡規划原理与设计(原城市規划原理与设计)	978-7-301-27771-3	谭娟娟等	43.00	2017.1	ppt/素材二维
17	❷建筑工程计量与计价	978-7-301-27866-6	吴育萍等	49.00	2017.1	ppt/二维码
18	⊌建筑工程计量与计价(第3版)	978-7-301-25344-1	一肖明和等	65.00	2017.1	APP/二维码
19	●市政工程计量与计价(第三版)	978-7-301-27983-0	郭良娟等	59.00	2017.2	ppt/二维码
20	●高层建筑施工	978-7-301-28232-8	吴俊臣	65.00	2017.4	ppt/答案
21	●建筑施工机械(第二版)	978-7-301-28247-2	吴志强等	35.00	2017.5	ppt/答案
22	●市政工程概论	978-7-301-28260-1	郭 福等	46.00	2017.5	ppt/二维码
23	●建筑工程测量(第二版)	978-7-301-28296-0	石 东等	51.00	2017.5	ppt/二维码
24	工程项目招投标与合同管理(第三版)	978-7-301-28439-1	周艳冬	44.00	2017.7	ppt/二维码
25	●建筑制图(第三版)	978-7-301-28411-7	高丽荣	38.00	2017.7	ppt/APP/二约函
26	●建筑制图习题集(第三版)	978-7-301-27897-0	高阳荣	35.00	2017.7	APP
27	⊌建筑力学(第三版)	978-7-301-28600-5	刘明晖	55.00	2017.8	ppt/二维码
28	●中外建筑史(第三版)	978-7-301-28689-0	袁新华等	42.00	2017.9	ppt/二维码
29	●建筑施工技术(第三版)	978-7-301-28575-6	陈維辉	54.00	2018.1	ppt/二维码
30	€)建筑工程经济(第三版)	978-7-301-28723-1	张宁宁等	36.00	2017.9	ppt/答案/二维
31	●建筑材料与检测 [2]	978-7-301-28809-2	陈玉萍	44.00	2017.10	ppt/二维码
32	少 建筑识图与构造	978-7-301-28876-4	林秋怡等	46.00	2017.11	ppt/二维码
32	●建筑工程材料	978-7-301-28982-2	向积波等	42.00	2018.1	ppt/二维码
33	ℰ健筑力学与结构(少学时版)(第二版)	978-7-301-29022-4	吴承霞等	46.00	2017.12	ppt/答案
34	●建筑工程測量(第三版)	978-7-301-29113-9	张敬伟等	49.00	2018.1	ppl/答案/二维
35	●建筑工程测量实验与实训指导(第三版)	978-7-301-29112-2	张敬伟等	29.00	2018.1	答案/二维码
36	●安装工程计量与计价(第四版)	978-7-301-16737-3	冯钢	59.00	2018.1	ppt/答案/二维
37	●建筑工程施工组织设计(第二版)	978-7-301-29103-0	耶维峰等	37.00	2018.1	ppt/答案/二维
38	●建筑工程測量	978-7-301-28757-6	赵昕	50.00	2018.1	ppt/二维码
39	●建筑材料与检测(第2版)	978-7-301-25347-2	梅杨等	35.00	2015.2	ppt/答案/二维
40	●建设工程监理概论(第三版)	978-7-301-28832-0	徐锡权等	44.00	2018.2	ppt/答案/二维
41	●建筑共配电与照明工程	978-7-301-29227-3	羊梅	38.00	2018.2	ppt/答案/二维
42	€建筑工程资料管理(第二版)	978-7-301-29210-5	孙 刚等	47.00	2018.3	ppt/二维码
A 60	*+	二五"职业教育图家规划		11.00	2010:0	ppo spary
1	★建筑工程应用文写作(第2版)	978-7-301-24480-7	赵立等	50.00	2014.8	ppt
2	★土木工程实用力学(第 2 版)	978-7-301-24681-8	马景善	47.00	2015.7	ppt
3	★建设工程監理(第2版)	978-7-301-24490-6	斯庆	35.00	2015.1	ppt/答案
4	★建筑节能工程与施工	978-7-301-24274-2	吴明军等	35.00	2015.5	ppt
5	★建筑工程经济(第2版)	978-7-301-24274-2	胡六星等	41.00	2014.9	ppt/答案
6	★建设工程招投标与合同管理(第 3 版)	978-7-301-24483-8	宋春岩	40.00	2014.9	ppt/答案/试题 教案
7	★工程造价概论	978-7-301-24696-2	周艳冬	31.00	2015.1	ppt/答案
8	★建筑工程计量与计价(第 3 版)	978-7-301-25344-1	肖明和等	65.00	2017.1	APP/二维码
9	★建筑工程计量与计价实训(第3版)	978-7-301-25345-8	肖明和等	29.00	2017.1	AND THE POPULATION
10	★建筑装饰施工技术(第 2 版)	978-7-301-24482-1	王军	37.00	2014.7	ppt
11	★工程地质与土力学(第2版)	978-7-301-24479-1	杨仲元	41.00	2014.7	ppt
1.1	カエコエルのペプエ/プナ(対 4 形)	基础证程	1977776	41.00	2014.7	I PPr
	建设法规及相关知识	978-7-301-22748-0	唐茂华等	34.00	2013.9	ppt

序号	定价	distant to	The state between
3 建筑工程法规实务(第 2 版) 978-7-301-26188-0 杨陈惠等 4 建筑法规 978-7-301-1977-6 董伟等 5 建设工程法规 978-7-301-20912-7 王先恕 6 AutoCAD 建筑单限数程(第 2 版) 978-7-301-21095-6 郭 慧 7 AutoCAD 建筑单图数程(第 2 版) 978-7-301-24540-8 唐英版等 8 建筑(AD 州目教程(2010 版) 978-7-301-24540-8 唐英版等		出版时间	配套情况
4 建筑法规 978-7-301-19371-6 董伟等 5 建设工程法规 978-7-301-20912-7 王先恕 6 AutoCAD 建筑制图教程第 2 版) 978-7-301-21085-6 第 题 7 AutoCAD 建筑体图教程第 2 版) 978-7-301-2450-8 唐英敬等 8 建筑 CAD 項目教程(2010 版) 978-7-301-20979-0 第 整	40.50	2014.8	ppt/答案/素材
4 建筑法规 978-7-301-19371-6 董伟等 5 建设工程法规 978-7-301-20912-7 王先恕 6 AutoCAD 建筑制图教程第 2 版) 978-7-301-21085-6 第 题 7 AutoCAD 建筑体图教程第 2 版) 978-7-301-2450-8 唐英敬等 8 建筑 CAD 項目教程(2010 版) 978-7-301-20979-0 第 整	49.50	2017.6	ppt
5 建设工程法规 978-7-301-20912-7 王先恕 6 AutoCAD 建筑制图教程(第 2 版) 978-7-301-21095-6 郭 慧 7 AutoCAD 建筑绘图教程(第 2 版) 978-7-301-24540-8 唐英敏等 8 建筑(CAD 項目教程(2010 版) 978-7-301-20979-0 郭 蓼	39.00	2011.9	
6 AutoCAD 建筑制图整程(第 2 版) 978-7-301-21095-6 第 整 7 AutoCAD 建筑绘图数程(第 2 版) 978-7-301-24540-8 康英被等 8 建筑 CAD 项目教授(2010 版) 978-7-301-20979-0 第 整			ppt
7 AutoCAD 建筑绘图數程(第2版) 978-7-301-24540-8 唐英敏等 8 建筑 CAD 項目數程(2010版) 978-7-301-20979-0 第 慧	32.00	2012.7	ppt
7 AutoCAD 建筑绘图教程(第2版) 978-7-301-24540-8 唐英敏等 8 建筑 CAD 项目教程(2010版) 978-7-301-20979-0 第 慧	38.00	2013.3	ppt/素材
8 建筑 CAD 项目教程(2010 版) 978-7-301-20979-0 郭 慧	44.00	2014.7	ppt
	38.00	2012.9	素材
	24.00	2016.2	ppt
10 建筑工程专业英语 978-7-301-20003-2 韩薇等	24.00	2012.2	ppt
11 建筑识图与构造(第 2 版) 978-7-301-23774-8 郑贵超	40.00	2014.2	ppt/答案
12 房屋建筑构造 978-7-301-19883-4 李少红	26.00	2012.1	ppt
13 建筑识图 978-7-301-21893-8 邓志勇等	35.00	2013.1	
			ppt
14 建筑识图与房屋构造 978-7-301-22860-9 贠禄等	54.00	2013.9	ppt/答案
15 建筑构造与设计 978-7-301-23506-5 陈玉萍	38.00	2014.1	ppt/答案
16 房屋建筑构造 978-7-301-23588-1 李元玲等	45.00	2014.1	ppt
17 房屋建筑构造习题集 978-7-301-26005-0 李元玲	26.00	2015.8	ppt/答案
18 建筑构造与施工图识读 978-7-301-24470-8 南学平	52.00	2014.8	ppt
19 建筑工程识图实训教程 978-7-301-26057-9 孙 伟	32.00	2015.12	ppt
20 🕒建筑工程制图与识图(第 2 版) 978-7-301-24408-1 白丽红/	34.00	2016.8	APP/二维码
21 建筑制图习题集(第 2 版) 978-7-301-24571-2 白丽红	25.00	2014.8	
22 ◎建筑工程制图(第 2 版)(附习题册) 978-7-301-21120-5 肖明和	48.00	2012.8	ppt
23 建筑制图与识图(第2版) 978-7-301-24386-2 曹雪梅	38.00	2015.8	ppt
24 建筑制图与识图习题册 978-7-301-18652-7 曹雪梅等	30.00	2011.4	PP
64 定项可同可以因为超期 370-7-301-10032-7 营事情等			
25 建筑制图与识图(第二版) 978-7-301-25834-7 李元玲	32.00	2016.9	ppt
26 建筑制图与识图习题集 978-7-301-20425-2 李元玲	24.00	2012.3	ppt
27 新编建筑工程制图 978-7-301-21140-3 方筱松	30.00	2012.8	ppt
28 新编建筑工程制图习题集 978-7-301-16834-9 方筱松	22.00	2012.8	1
建筑施工具	WWIGO	0010.0	
1 建筑工程测量 978-7-301-19992-3 潘益民	38.00	2012.2	
			ppt
2 建筑工程测量 978-7-301-13578-5 主金玲等	26.00	2008.5	
3 建筑工程测量实训(第2版) 978-7-301-24833-1 杨风华	34.00	2015.3	答案
4 建筑工程测量 978-7-301-22485-4 景 鋒等	34.00	2013.6	ppt
5 建筑施工技术 978-7-301-12336-2 朱永祥等	38.00	2008.8	ppt
6 建筑施工技术 978-7-301-16726-7 叶 雯等	44.00	2010.8	ppt/素材
7 建筑施工技术 978-7-301-19499-7 董 纬等	42.00	2011.9	ppt
8 建筑施工技术 978-7-301-19997-8 苏小梅	38.00	2012.1	ppt
9 建筑施工机械 978-7-301-19365-5 吴志强	30.00	2011.10	ppt
10 基础工程施工 978-7-301-20917-2 董 伟等	35.00	2012.7	ppt
11 建筑施工技术实训(第2版) 978-7-301-24368-8 周晓龙	30.00	2014.7	FF.
12 土木工程力学 978-7-301-16864-6 吴明军	38.00	2010.4	ppt
13 PKPM 软件的应用(第 2 版) 978-7-301-22625-4 王 娜等	34.00	2013.6	
14 ◎建筑结构(第 2 版)(上册) 978-7-301-21106-9 徐锡权	41.00	2013.4	ppt/答案
15 ②建筑结构(第 2 版)(下册) 978-7-301-22584-4 徐锡权	42.00	2013.6	ppt/答案
16 建筑结构学习指导与技能训练(上册) 978-7-301-25929-0 徐锡权	28.00	2015.8	ppt
17 建筑结构学习指导与技能训练(下册) 978-7-301-25933-7 徐锡权	28.00	2015.8	ppt
18 建筑结构 978-7-301-19171-2 唐春平等	41.00	2011.8	ppt
19 建筑结构基础 978-7-301-21125-0 王中发	36.00	2012.8	ppt
20 建筑结构原理及应用 978-7-301-18732-6 史美东	45.00	2012.8	ppt
21 建筑结构与识图 978-7-301-26935-0 相乗志	37.00	2016.2	
	49.00	2013.4	ppt/答案
99 70 27 201 991 10 日 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
22 建筑力学与结构(第 2 版) 978-7-301-22148-8 吴承霞等	32.00	2012.8	ppt
23 建筑力学与结构 978-7-301-20988-2 陈水广	44.00	2014.1	ppt
23 建筑力学与结构 978-7-301-20988-2 陈水广	35.00	2013.3	ppt
23 建筑力学与结构 978-7-301-20988-2 陈水广	38.00	2011.10	ppt
23 建筑力学与结构 978-7-301-29088-2 陈木广 24 建筑力学与结构 978-7-301-23348-1 杨丽君等 25 建筑结构与施工图 978-7-301-22188-4 朱希文等			ppt
23 建筑力学与结构 978-7-301-20988-2 陈水广 24 建筑力学与结构 978-7-301-2348-1 杨丽君等 25 建筑结构与施工图 978-7-301-22188-4 朱希文等 26 生态建筑材料 978-7-301-19588-2 陈즭峰等		2014.9	
23 建筑力学与结构 978-7-301-29988-2 陈水广 24 建筑力学与结构 978-7-301-22348-1 杨丽君等 25 建筑结构与施工图 978-7-301-22188-4 宋希文等 26 生态建筑材料 978-7-301-19588-2 陈剑峰等 27 建筑材料(第 2版) 978-7-301-24633-7 林祖宏	35.00	2014.8	ppt
23 建筑力学与结构 978-7-301-20988-2 陈永广 24 建筑力学与结构 978-7-301-23348-1 杨丽君等 25 建筑结构与施工图 978-7-301-2238-4 朱希文等 26 生赤建筑材料 978-7-301-19588-2 陈剑绮绮 27 建筑材料(第2版) 978-7-301-4633-7 林祖宝 28 建筑材料(新2版) 978-7-301-16729-8 工美芬等	35.00 18.00	2010.10	
23 並放力学与结构 978-7-301-20988-2 陈木广 24 建放力学与结构 978-7-301-20988-2 陈木广 25 建筑结构与施工图 978-7-301-22188-4 朱希文等 26 生金速筑材料 978-7-301-19588-2 陈剑峰等 27 建筑材料(第 2 版) 978-7-301-19588-3 陈剑峰等 28 建筑材料检测试验指导 978-7-301-16729-8 王莱芬等 29 建筑材料检测试验指导 978-7-301-16729-8 王莱芬等 29 建筑材料与检测低二版) 978-7-301-16729-8 王莱	35.00 18.00 40.00	2010.10 2016.1	ppt
23 建筑力学与结构 978-7-301-20988-2 陈永广 24 建筑力学与结构 978-7-301-23348-1 杨丽君等 25 建筑结构与施工图 978-7-301-2238-4 朱希文等 26 生赤建筑材料 978-7-301-19588-2 陈剑绮绮 27 建筑材料(第2版) 978-7-301-4633-7 林祖宝 28 建筑材料(新2版) 978-7-301-16729-8 工美芬等	35.00 18.00	2010.10	
23 建筑力学与结构 978-7-301-20988-2 陈永广 24 建筑力学与结构 978-7-301-22188-4 杨丽君等 25 建筑结构与施工图 978-7-301-22188-4 朱希文等 26 生态建筑材料 978-7-301-22188-2 陈剑峰等 27 建筑材料(第 2 版) 978-7-301-1678-8 正美芬等 28 建筑材料检测试验指学 978-7-301-16729-8 正美芬等 29 建筑材料与检测试验指导 978-7-301-26550-5 正 辉 30 建筑材料与检测试验指导(第 元版) 978-7-301-28471-1 王 辉	35.00 18.00 40.00 23.00	2010.10 2016.1 2017.7	ppt ppt
23 並放力学与结构 978-7-301-20988-2 陈永广 24 建放力学与结构 978-7-301-20988-2 陈永广 25 建放结构与施工图 978-7-301-22188-4 朱卷文等 26 生态建筑材料 978-7-301-22188-4 朱卷文等 27 建筑材料(第 2 版) 978-7-301-2468-3	35.00 18.00 40.00 23.00 39.00	2010.10 2016.1 2017.7 2013.3	ppt
23 建筑力学与结构	35.00 18.00 40.00 23.00 39.00 24.00	2010.10 2016.1 2017.7 2013.3 2013.4	ppt ppt ppt
23 並放力学与结构 978-7-301-20988-2 除水广 24 並放力学与结构 978-7-301-20988-2 除水广 25 建效价料与标准 978-7-301-22188-4 朱卷文等 26 生态建设材料 978-7-301-22188-4 朱卷文等 27 建筑材料(据 2 版) 978-7-301-2483-7 林祖宏 28 建筑材料(据 2 版) 978-7-301-2483-7 林祖宏 28 建筑材料与结照(语 2 版) 978-7-301-24853-7 北祖宗 30 建筑材料与结照(语 成) 978-7-301-28550-5 正辉 31 建筑材料运择与成则 978-7-301-2847-1 正 辉 31 建筑材料运择与成则 978-7-301-2291-78 中藏荣等 32 建筑材料运择与规则 978-7-301-2291-78 中藏荣等 33 建筑材料运择与规则 978-7-301-2291-78 中藏荣等 33 建筑材料	35.00 18.00 40.00 23.00 39.00 24.00 40.00	2010.10 2016.1 2017.7 2013.3 2013.4 2014.7	ppt ppt ppt ppt/答案
23 並致力学与结构	35.00 18.00 40.00 23.00 39.00 24.00 40.00 20.00	2010.10 2016.1 2017.7 2013.3 2013.4 2014.7 2014.9	ppt ppt ppt ppt/答案 ppt/
23 並放力学与结构	35.00 18.00 40.00 23.00 39.00 24.00 40.00 20.00 43.00	2010.10 2016.1 2017.7 2013.3 2013.4 2014.7 2014.9 2012.8	ppt ppt ppt ppt/答案
23 並放力学与结构	35.00 18.00 40.00 23.00 39.00 24.00 40.00 20.00 43.00	2010.10 2016.1 2017.7 2013.3 2013.4 2014.7 2014.9	ppt ppt ppt ppt/答案 ppt/答案
23 並放力学与结构 978-7-301-20988-2 陈永广 24 並放力学与结构 978-7-301-20988-2 陈永广 25 建效价料与标准图 978-7-301-22188-1 除硼君等 26 生态建设材料 978-7-301-22188-4 朱卷文等 27 建筑材料(据2版) 978-7-301-19588-2 陈剑崎等 27 建筑材料(据2版) 978-7-301-24633-7 林祖宏 28 建筑材料检阅试验指导 978-7-301-24633-7 北祖宏 28 建筑材料与结视试验指导 978-7-301-26550-5 正解 30 建筑材料与结视试验指导(第二版) 978-7-301-28571-1 正解 31 建筑材料选择与成则 978-7-301-22478-7 中藏荣等 32 建筑材料选择与规则 978-7-301-22478-2 陈东佐等 33 建筑材料	35.00 18.00 40.00 23.00 39.00 24.00 40.00 20.00	2010.10 2016.1 2017.7 2013.3 2013.4 2014.7 2014.9 2012.8	ppt ppt ppt ppt/答案 ppt/答案

序号	书名	书号	编著者	定价	出版时间	配套情况
38	地基与基础	978-7-301-16130-2	孙平平等	26.00	2010.10	ppt
39	地基与基础实训	978-7-301-23174-6	肖明和等	25.00	2013.10	ppt
40	土力学与地基基础	978-7-301-23675-8	叶火炎等	35.00	2014.1	ppt
41	土力学与基础工程	978-7-301-23590-4	宁培淋等	32.00	2014.1	ppt
42	土力学与地基基础	978-7-301-25525-4	陈东佐	45.00	2015.2	ppt/答案
43	建筑工程质量事故分析(第2版)	978-7-301-22467-0	郑文新	32.00	2013.9	ppt
44	建筑工程施工组织设计	978-7-301-18512-4	李源清	26.00	2011.2	ppt
45	建筑工程施工组织实训	978-7-301-18961-0	李源清	40.00	2011.6	ppt
46	建筑施工组织与进度控制	978-7-301-21223-3	张廷瑞	36.00	2012.9	ppt
47	建筑施工组织项目式教程	978-7-301-19901-5	杨红玉	44.00	2012.1	ppt/答案
48	钢筋混凝土工程施工与组织	978-7-301-19587-1	高 雁	32.00	2012.5	ppt
49	钢筋混凝土工程施工与组织实训指导(学生 工作页)	978-7-301-21208-0	高雕	20.00	2012.9	ppt
50	建筑施工工艺	978-7-301-24687-0	李源清等	49.50	2015.1	ppt/答案
		工程管理类				
1	建筑工程经济	978-7-301-24346-6	刘晓丽等	38.00	2014.7	ppt/答案
2	施工企业会计(第2版)	978-7-301-24434-0	辛艳红等	36.00	2014.7	ppt/答案
3	建筑工程项目管理(第2版)	978-7-301-26944-2	范红岩等	42.00	2016. 3	ppt
4	建设工程项目管理(第二版)	978-7-301-24683-2	王 辉/	36.00	2014.9	ppt/答案
5	建设工程项目管理(第2版)	978-7-301-28235-9	冯松山等	45.00	2017.6	ppt
6	建筑施工组织与管理(第2版)	978-7-301-22149-5 978-7-301-22612-4	程丽旻等	43.00	2013.4	ppt/答案
7	建设工程合同管理		刘庭江	46.00	2013.6	ppt/答案
9	建筑工程招投标与合同管理 工程招投标与合同管理实务	978-7-301-16802-8 978-7-301-19035-7	程超胜	30.00 48.00	2012.9 2011.8	ppt
10	工程招投标与言问管理实务 工程招投标与合同管理实务	978-7-301-19035-7	物中可等 郑文新等	48.00	2011.8	ppt
11	建设工程招投标与合同管理实务	978-7-301-19290-0	杨云会等	42.00	2011.8	ppt/答案/习题
12	工程招投标与合同管理	978-7-301-17455-5	文新平	37.00	2012.4	
13	工程项目招投标与合同管理(第2版)	978-7-301-24554-5	李洪军等	42.00	2014.8	ppt/答案
14	建筑工程商务标编制实训	978-7-301-20804-5	钟振宇	35.00	2012.7	ppt
15	建筑工程安全管理(第2版)	978-7-301-25480-6	宋、健等	42.00	2015.8	ppt/答案
17	施工项目质量与安全管理。	978-7-301-21275-2	钟汉华	45.00	2012.10	ppt/答案
18	工程造价控制(第2版)	978-7-301-24594-1	斯·庆	32.00	2014.8	ppt/答案
19	工程造价管理(第二版)	978-7-301-27050-9	徐锡权等	44.00	2016.5	ppt
20	工程造价控制与管理	978-7-301-19366-2	胡新莲等	30.00	2011.11	ppt
21	建筑工程造价管理。	978-7-301-20360-6	柴 琦等	27.00	2012.3	ppt
22	建筑工程造价管理	978-7-301-15517-2	李茂英等	24.00	2009.9	
23	工程造价案例分析。	978-7-301-22985-9	甄 凤	30.00	2013.8	ppt
24	建设工程造价控制与管理	978-7-301-24273-5	胡芳珍等	38.00	2014.6	ppt/答案
25	◎建筑工程造价》	978-7-301-21892-1	孙咏梅	40.00	2013.2	ppt
26	建筑工程计量与计价	978-7-301-26570-3	杨建林	46.00	2016.1	ppt
27	建筑工程计量与计价综合实训	978-7-301-23568-3	養小兰	28.00	2014.1	
28	建筑工程估价	978-7-301-22802-9	张 英	43.00	2013.8	ppt
29	安装工程计量与计价(第3版)	978-7-301-24539-2	冯 钢等	54.00	2014.8	ppt
30	安装工程计量与计价综合实训	978-7-301-23294-1	成春燕	49.00	2013.10	素材
31	建筑安装工程计量与计价	978-7-301-26004-3	景巧玲等	56.00	2016.1	ppt
32	建筑安装工程计量与计价实训(第2版)	978-7-301-25683-1	景巧玲等	36.00	2015.7	
33	建筑水电安装工程计量与计价(第二版)	978-7-301-26329-7 978-7-301-25753-1	陈连姝	51.00 36.00	2016.1	ppt
34	建筑与装饰装修工程工程量清单(第2版)		翟丽旻等		2015.5	ppt
36	建筑工程清单编制	978-7-301-19387-7 978-7-301-28708-8	叶晓容 在土二年	24.00 38.00	2011.8	ppt
37	建设项目评估(第二版) 钢筋工程清单编制	978-7-301-28708-8	高志云等 贾莲英	36.00	2017.9	ppt
38	祝殿上任府平編刊 混凝土工程清单编制	978-7-301-20114-3	原 娟	28.00	2012.5	ppt
39	建筑装饰工程预算(第2版)	978-7-301-25801-9	煎 朔 范菊雨	44.00	2012.3	ppt ppt
40	建筑装饰工程计量与计价	978-7-301-20055-1	李茂英	42.00	2012.2	ppt
41	建设工程安全监理	978-7-301-20802-1	沈万岳	28.00	2012.7	ppt
42	建筑工程安全技术与管理实务	978-7-301-21187-8	沈万岳	48.00	2012.9	ppt
43	工程造价管理(第2版)	978-7-301-28269-4	曾 浩等	38.00	2017.5	ppt/答案
建筑设计案						
1	◎建筑室内空间历程	978-7-301-19338-9	张伟孝	53.00	2011.8	
2	建筑装饰 CAD 项目教程	978-7-301-20950-9	郭 慧	35.00	2013.1	ppt/素材
3	建筑设计基础	978-7-301-25961-0	周圆圆	42.00	2015.7	
4	室内设计基础	978-7-301-15613-1	李书青	32.00	2009.8	ppt
5	建筑装饰材料(第2版)	978-7-301-22356-7	焦 涛等	34.00	2013.5	ppt
6	设计构成	978-7-301-15504-2	戴碧锋	30.00	2009.8	ppt

序号	书名	书号	编著者	定价	出版时间	配套情况
7	基础色彩	978-7-301-16072-5	张军	42.00	2010.4	PHI 25 171 QU
8	设计色彩	978-7-301-21211-0	龙黎黎	46.00	2012.9	ppt
9	设计素描	978-7-301-22391-8	司马金桃	29.00	2013.4	ppt
10	建筑素描表现与创意	978-7-301-15541-7	于修国	25.00	2009.8	PP.
11	3ds Max 效果图制作	978-7-301-22870-8	刘 晗等	45.00	2013.7	ppt
12	3ds max 室内设计表现方法	978-7-301-17762-4	徐海军	32.00	2010.9	ppr
13	Photoshop 效果图后期制作	978-7-301-16073-2	脱忠伟等	52.00	2011.1	素材
14	3ds Max & V-Ray 建筑设计表现案例教程	978-7-301-25093-8	郑恩峰	40.00	2014.12	ppt
15	建筑表现技法	978-7-301-19216-0	张峰	32.00	2011.8	ppt
16	建筑速写	978-7-301-20441-2	张峰	30.00	2012.4	PP
17	建筑装饰设计	978-7-301-20022-3	杨丽君	36.00	2012.2	ppt/素材
18	装饰施工读图与识图	978-7-301-19991-6	杨丽君	33.00	2012.5	ppt
	ACTUALIST OF IN A SAIM	规划固林典	1910911	00/00	HOTHU	PP.
1	居住区景观设计	978-7-301-20587-7	张群成	47.00	2012.5	ppt
2	居住区规划设计	978-7-301-21031-4	张燕	48.00	2012.8	ppt
3	园林植物识别与应用	978-7-301-17485-2	潘利等	34.00	2012.9	ppt
4	园林工程施工组织管理	978-7-301-22364-2	潘利等	35.00	2013.4	ppt
5	园林景观计算机辅助设计	978-7-301-24500-2	于化强等	48.00	2014.8	ppt
6	建筑 • 园林 • 装饰设计初步	978-7-301-24575-0	王金贵。	38.00	2014.10	ppt
		房地产类	136	1		
1	房地产开发与经营(第2版)	978-7-301-23084-8	张建中等	33.00	2013.9	ppt/答案
2	房地产估价(第2版)	978-7-301-22945-3	张勇等	35.00	2013.9	ppt/答案
3	房地产估价理论与实务	978-7-301-19327-3	格毒品	35.00	2011.8	ppt/答案
4	物业管理理论与实务	978-7-301-19354-9	装艳慧	52.00	2011.9	ppt
5	房地产测绘	978-7-301-22747-3	- 唐春平	29.00	2013.7	ppt
6	房地产营销与策划	978-7-301-18731-9	应佐萍	42.00	2012.8	ppt
7	房地产投资分析与实务	978-7-301-24832-4	高志云	35.00	2014.9	ppt
8	物业管理实务	978-7-301-27163-6	胡大见	44.00	2016.6	
9	房地产投资分析	978-7-301-27529-0	刘永胜	47.00	2016.9	ppt
	4.7	市政马特桥				
1	市政工程施工图案例图集	978-7-301-24824-9	陈亿珠。	43.00	2015.3	pdf
2	市政工程计价	978-7-301-22117-4	彭以身等	39.00	2013.3	ppt
3	市政桥梁工程	978-7-301-16688-8	刘文等	42.00	2010.8	ppt/素材
4	市政工程材料	978-7-301-22452-6	郑晓国	37.00	2013.5	ppt
5	道桥工程材料	978-7-301-21170-0	刘水林等	43.00	2012.9	ppt
6	路基路面工程	978-7-301-19299-3	偶昌宝等	34.00	2011.8	ppt/素材
7	道路工程技术	978-7-301-19363-1	刘南等	33.00	2011.12	ppt
8	城市道路设计与施工	978-7-301-21947-8	吳颖峰	39.00	2013.1	ppt
9	建筑给排水工程技术	978-7-301-25224-6	刘 芳等	46.00	2014.12	ppt
10	建筑给水排水工程	978-7-301-20047-6	叶巧云	38.00	2012.2	ppt
11	市政工程测量(含技能训练手册)	978-7-301-20474-0	刘宗波等	41.00	2012.5	ppt
12	公路工程任务承揽与合同管理	978-7-301-21133-5	邱 兰等	30.00	2012.9	ppt/答案
13	数字测图技术应用教程	978-7-301-20334-7	刘宗波	36.00	2012.8	ppt
14	数字测图技术	978-7-301-22656-8	赵红	36.00	2013.6	ppt
15	数字测图技术实训指导	978-7-301-22679-7	赵红	27.00	2013.6	ppt
16	水泵与水泵站技术	978-7-301-22510-3	刘振华	40.00	2013.5	ppt
17	道路工程測量(含技能训练手册)	978-7-301-21967-6 978-7-301-26210-8	田村涛等	45.00	2013.2	ppt
18	道路工程识图与 AutoCAD	978-7-301-26210-8 麦通运输夹	王容玲等	35.00	2016.1	ppt
1	桥梁施工与维护	978-7-301-23834-9	樂斌	50.00	2014.2	nnt
2	供 供 路 轨 道 施 工 与 维 护	978-7-301-23524-9	架 斌	36.00	2014.2	ppt ppt
3	铁路轨道构造	978-7-301-23324-9	梁 斌	32.00	2013.10	ppt
4	城市公共交通运营管理	978-7-301-23133-1	张洪満	40.00	2013.10	ppt
5	城市轨道交通车站行车工作	978-7-301-24210-0	操杰	31.00	2014.7	ppt
6	公路运输计划与调度实调教程	978-7-301-24503-3	高福军	31.00	2014.7	ppt/答案
U	石町地側针划勺網及头侧软柱	建筑设备类	阿爾牛	31.00	2014.7	PPU音乘
1	建筑设备识图与施工工艺(第2版)(新规范)	978-7-301-25254-3	周业梅	44.00	2015.12	ppt
2	建筑施工机械	978-7-301-23254-3	早走得	30.00	2013.12	ppt
3	智能建筑环境设备自动化	978-7-301-21090-1	余志强	40.00	2012.8	ppt
4	流体力学及泵与风机	978-7-301-25279-6	王宁等	35.00	2015.1	ppt/答案
	F 端(研究所+) 伊奇俊蘭則 //★據(開係機)		Ch 66 Att 77 mm 100 m			官佐則「口外側
